




TERRITOIRE BOURNE – VALENTINOIS

**Réseaux du Canal de la Bourne, Lilas–Vanelle-Combeaux, Fontaines–
Portes les Valence, Sud Est Valentinois, Granges Les Beaumont**

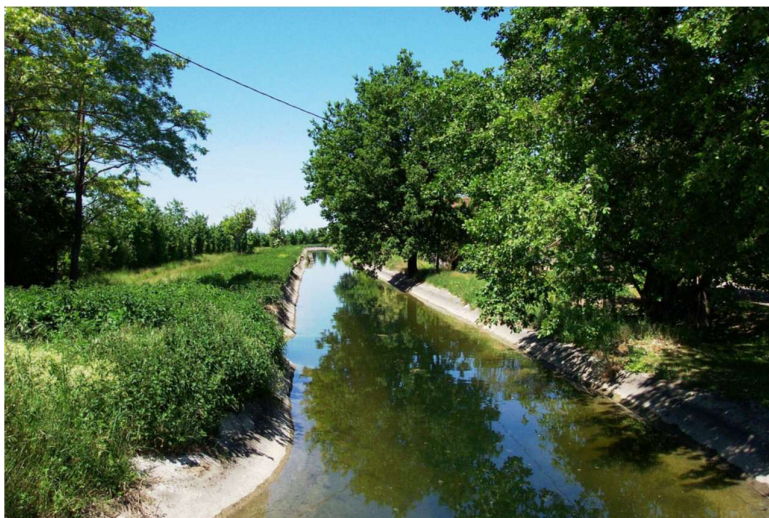

Année 2025

Rapport d'activité

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

SOMMAIRE

1- FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2025.....	6
2- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE BOURNE-VALENTINOIS.....	7
2.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE	7
1.2 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS	7
1.2.1 Réseaux Canal de la Bourne	7
1.2.2 Le Barrage d'auberives	8
2.2.3 Le canal de la Bourne	8
2.2.4 Les usines hydroélectriques	9
2.2.5 Les stations d'Exhaure.....	10
2.2.6 Les stations de pompage liées au canal de la Bourne	11
2.2.7 Réseaux Lilas-Vanelle-Combeaux.....	14
2.2.7 Réseaux Portes les Valence-Fontaine	14
2.2.8 Réseaux de distribution.....	15
2.2.9 Réseau du Sud Est Valentinois	16
2.2.10 Réseau Granges les Beaumont.....	18
2.2.11 Synthèse sur l'ensemble du territoire.....	18
3- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025	19
3.1 ORIGINE DE L'EAU	19
3.2 CONSOMMATIONS	20
3.3 RENDEMENTS du TERRITOIRE BOURNE-Valentinois	23
3.4 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES	24
3.4.1 Réseaux Bourne sous pression.....	24
3.4.2 Réseau de Hostun-Jaillans.....	25
3.4.2 Réseau de Granges Les Beaumont.....	25
3.4.3 Réseau sud est Valentinois.....	25
3.5 PRODUCTION HYDROELECTRIQUE.....	26
3.5.1 Centrale Hydro-Electrique d'Auberives.....	26

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

3.5.2 Centrale Hydro-Electrique de l'Ecanrière	26
4- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES.....	27
4.1. SECURITE PUBLIQUE.....	27
4.1.1 Barrage	27
4.1.2 Canal de la Bourne	28
4.1.3 Réserve de Juanon	28
4.2. CHASSES SEDIMENTAIRES AU BARRAGE D'AUBERIVES EN ROYANS.....	29
4.2.1 Chasse du 18 avril 2025.....	29
4.3. CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE	30
4.4. CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION	31
4.5. CONTROLE CONFORMITE DES DISPOSITIFS DE LEVAGE.....	33
5- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025.....	35
5.1. TRAVAUX D'INVESTISSEMENT	35
5.2. PRINCIPAUX TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN	38
5.3. TRAVAUX FACTURES.....	38
5.4. OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025	38
6. GESTION CLIENTELE.....	40
6.1. PRIX DE VENTE DE L'EAU	40
6.1.1 Tarification Agence de l'eau.....	40
6.1.2 Tarification pour les non professionnels.....	40
6.1.3 Tarification pour les professionnels	40
6.2. RELATIONS IRRIGANTS	42
6.2.1 Continuité de service	42
6.2.2 Informations des irrigants.....	44
7. LES PROJETS DU TERRITOIRE.....	45
7.1. LE BARRAGE D'AUBERIVES EN ROYANS	45
7.1.1 AVP Rénovation et adaptation réglementaire	45
7.2. CANAL DE LA LYONNE	46
7.2.1 Franchissabilité du seuil de la prise d'eau.....	46

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

7.3.	LE CANAL DE LA BOURNE	47
7.3.1	Mise en conformité réglementaire	47
7.3.2	Confortement des tunnels	47
7.3.3	Rénovation canal et canaux secondaires	48
7.4.	RESEAUX SOUS PRESSION	49
7.4.2	Réseaux Portes - Fontaine.....	49
7.4.3	Réseau sud Est Valentinois.....	49
7.5.	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE NECESSAIRES.....	50
7.5.1	Suppression des transformateurs avec PCB.....	50
7.5.2	Mise en conformité des armoires électriques	50
7.5.3	Protection et Sécurisation des stations de pompage.....	50
8.	DONNEES FINANCIERES	51
8.1.	COMPABILITE ANALYTIQUE.....	51
8.1.1	Fonctionnement.....	51
8.1.2	Investissement	52
8.2.	IMPAYES	52
8.3.	ENDETTEMENT DU TERRITOIRE.....	53
9.	URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS	54
10.	ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	55
10.1	Travaux sur le Barrage et les usines de production hydroélectrique.....	55
10.2	Travaux sur les canaux	56
10.3	Travaux sur les réseaux.....	57
10.4	Travaux sur les stations de pompage.....	58

1- FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2025

Du 10 juin 2025 au 10 juillet 2025, une très forte augmentation de la turbidité des eaux de la rivière Isère a été constatée entraînant :

- Des difficultés de fonctionnement pour tous les irrigants, ayant des filtres au point de consommation, des réseaux de Lilas et de la Vanelle (Chateauneuf sur Isère),
- Un envasement des bassins de décantation de la station de pompage de Lilas,
- Un envasement partiel du canal de la Bourne via les stations de pompage de Triboulières et du Martinet.
- Une usure accélérée des pompes de l'ensemble du territoire (à l'exception de Chaffit et des Combeaux : prises d'eau dans le Rhône)

Lors de la réunion de coordination du 10 septembre 2025, avec les services de lac DREAL, de la DDT, de l'ADI 38, EPTB38, EDF a expliqué ce phénomène par :

- Les glissements de terrains de Modane et de la Bérarde
- La nécessité de désengraver le barrage de St Egrève
- Et à un degré l'opération de curage du bassin de Flumet

Pour EDF, « ce sont des événements naturels pouvant être amenés à se reproduire » !!

Le SID a demandé explicitement la prise en compte de l'ensemble des usagers de la rivière lors des décisions d'opérations exceptionnels sur les ouvrages et la transmission d'information y compris en situation d'urgence.

Au jour de rédaction de ce document le 15 avril 2025, aucune procédure n'a été mise en place par EDF.

2- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE BOURNE-VALENTINOIS


2.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE

Communes concernées :

Alixan, Beaumont-lès-Valence, Meymans, Beauregard-Baret, Besayes, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Charpey, Saint-Didier-de-Charpey, Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet, Eymieux, Hostun, Jaillans, La Baume d'Hostun, Malissard, Marches, Montélier, Peyrus, Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Vincent-la-Commanderie, Valence, Barcelonne, La Baume-Cornillane, Montéleger, Montmeyran, Montvendre, Ourches, Upie Granges Les Beaumont.

1.2 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

1.2.1 RESEAUX CANAL DE LA BOURNE

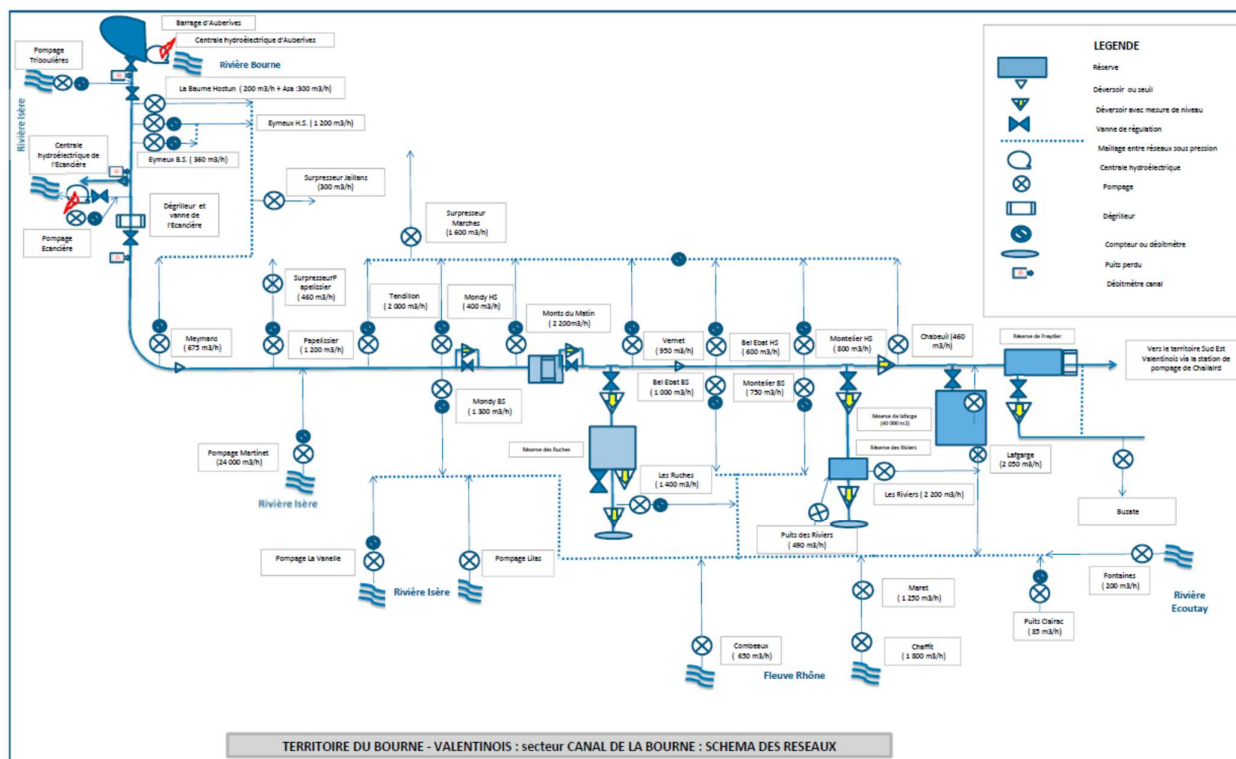

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

1.2.2 LE BARRAGE D'AUBERIVES

- Construit à partir de 1878 sur la rivière Bourne
 - Contrat de concession de l'Etat Français avec le Syndicat Intercommunal du Canal de la Bourne de 1933, d'une durée de 99 ans.
 - Ouvrage poids déversant, en maçonnerie avec un noyau béton, conforté par un couronnement béton et des tirants ancrés dans le substratum mollassique en 1984,
 - Hauteur de 12 m rehaussé en 1984 de 20 cm,
 - retenue d'eau de 600 000 m³ environ,
 - 6 vannes de fond (3 en rive droite - 3 en rive gauche).
 - débit réservé de 500 l/s rehaussé à 2 m³/s en 2014
-
- Apport complémentaire par une prise d'eau sur la Lyonne et un canal d'amené jusqu'à la retenue d'Auberives en Royans
 - débit réservé de 0 l/s rehaussé à 375 l/s en 2014

Remarque : Le Barrage d'Auberives en Royans est classé sécurité publique de niveau C.



Barrage d'Auberives en Royans

2.2.3 LE CANAL DE LA BOURNE

- Construit à partir de 1878.

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- Contrat de concession de l'Etat Français avec Le Syndicat Intercommunal du Canal de la Bourne de 1933 d'une durée de 99 ans.
- débit de dérivation maxi contractuel de 7 m³/s.

Canal principal :

- longueur de 46 Km
Depuis la prise d'eau (retenue du barrage d'Auberives en Royans) jusqu'à Chabeuil
- 13 tunnels
(Falaises – Mas – Servant – d'Auberives – Barmier – Manne – Allemand – Odier – St Nazaire 1 – St Nazaire 2 – Combes – des Clots – Pecherot)
- 7 aqueducs
(Chapelle – Rioussel – St Nazaire en Royans – Tarze – Seigneurs – Jonchère – Combes)
- 3 galeries
(Dupré de la Tour – Gibet – Les fonds)
- 4 vannes de régulations
(Prise d'eau – Ecancière – Mondy – L'orme)

4 canaux secondaires :

- S1 : aujourd'hui désaffecté
- S2 : longueur : 6,9 Km (dont 3.35 Km en service)
- S3 : longueur : 7,1 km (dont 4.20 Km en service)
- S4 : longueur : 6 km

Un réseau de canaux tertiaires et quaternaires aujourd'hui désaffectés et remplacés par des réseaux sous pression.

Capacité maximum actuelle de transit de la partie amont du canal : 6,0 m³/s

Ouvrages de sécurité :

Déversoir des Falaises : permettant de limiter à 6.5 m³/s le débit entrant dans le canal=> exutoire la rivière Bourne via des terrains privés.

Décharge de Triboulières via la conduite de refoulement de la station de pompage de Triboulières => exutoire rivière Isère

Déversoir de l'Ecancière (au niveau de la prise d'eau de l'usine de l'Ecancière) => Exutoire rivière Isère

2.2.4 LES USINES HYDROELECTRIQUES

Usine de L'Ecancière :

- construite en 1919
- contrat de concession de l'Etat Français avec le Syndicat Intercommunal du Canal de la Bourne) de 1933 d'une durée de 99 ans
- implanté au lieu-dit "l'Ecancière" sur la commune d'Eymeux
- alimentation : le canal de la Bourne en dehors des périodes d'irrigation

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- équipements :
 - 2 turbines de type Francis de 900 Kw chacune de 1920
 - 1 transformateur 3800v/20Kv : 2500 Kva
 - 1 Transformateur auxiliaire 3800v/380v : 25 Kva
- Capacité maximale de production : 1 800 kW
- Contrat ENEDIS : i-CARD

Usine d'Auberives :

- construite en 1984
- propriété du S.I.D.
- implantée en dérivation du barrage d'Auberives
- alimentation : la rivière Bourne après avoir privilégié le débit réservé et la prise d'eau du canal de la Bourne
- équipements :
 - 2 turbines de type Kaplan de 870 Kw chacune de 1984
 - 2 génératrices Asynchrone KSB 1187 Kw de 2011 et 2012
 - 1 transformateur 20Kv/400 : 100 Kva
 - 1 transformateur 500v/20Kv : 2000 kva
- Capacité maximale de production : 1 450 kW
- Contrat ENEDIS : i CARD

2.2.5 LES STATIONS D'EXHAURE

Stations de pompage d'alimentation complémentaires du canal de la Bourne

Station de pompage de Triboulières :

- 3 pompes de 525 l/s à 34.5 m HMT sur variateurs de fréquence
- débit maximum de la station de pompage limité à 1.35 m3/s par réglage sur les variateurs de fréquence
- 1 transformateur 20Kv / 410 v : 1 250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 10 à 600 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de production de l'Ecanrière

- 2 pompes 800 m3/h à 40 m HMT (capacité de pompage 450 l/s)
- 1 transformateur 15-20Kv/410v : 1 250 Kva
- Alimentation en déduction de la production d'hydroélectricité

Station de production du Martinet

- 2 pompes de 2600 m3/h à 38 m HMT
- 2 pompes de 1800 m3/h à 38 m HMT
- 8 pompes de 2000 m3/h à 38 m HMT
- 1 transformateur 20 kv/400 v : 1600 Kva
- 1 transformateur 20 kv/690 v : 1600 Kva
- 3 transformateurs 20 kv/400 v : 1250 Kva
- Capacité de pompage : 6.9 m3/s

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 3 000 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

2.2.6 LES STATIONS DE POMPAGE LIEES AU CANAL DE LA BOURNE

Station de pompage La Baume d'Hostun

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- Filtre Rotatif vertical à panneau

Haut service :

- 2 pompes multicellulaires verticalisées 40 m³/h à 220 m HMT sur variateur de vitesse
- 2 pompes multicellulaires verticalisées 225 m³/h à 220 m HMT (dont 2 sur variateur de vitesse)

Bas Service :

- 3 pompes multicellulaires verticalisées 150 m³/h à 150 m HMT
- 1 transformateur 20Kv/410v : 1250 Kva commun aux stations de pompage HS et BS
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 1200 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage d'Eymeux

- origine de l'eau : Canal de la Bourne

Haut service :

- 6 pompes de 225 m³/h à 200 m HMT (dont 1 en vitesse variable)

Bas Service :

- 2 pompes de 180 m³/h à 120 m HMT
- un complément est fourni par la station de pompage d'Eymeux Haut service via un réducteur de pression
- 1 transformateur 20Kv/410v : 1250 Kva commun aux stations de pompage HS et BS
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 1200 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Meymans

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 3 pompes de 225 m³/h à 200 m HMT (dont 1 en vitesse variable)
- 1 transformateur 20Kv/410v : 800 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 550 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Surpresseur de Jaillans

- 3 pompes de 100 m³/h à 120 m HMT (dont 1 en vitesse variable)
- 1 transformateur 20Kv/400v : 400 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 170 Kw (Segment C3 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Papelissier

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 4 pompes de 240 m³/h à 170 m HMT
- 1 pompe de 150 m³/h à 170 m HMT
- 1 transformateur 20Kv/410v 1250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 5 à 550 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Surpresseur de Papelissier

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- 2 pompes de 130 m³/h à 95 m HMT
- 1 pompe de 210 m³/h à 95 m HMT
- 1 transformateur 20Kv/400v 250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 190 Kw (Segment C3. : HTA5 – CU)

Station de pompage de Tendillon

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 3 pompes de 500 m³/h à 250 m HMT
- 2 pompes de 480 m³/h à 220 m HMT
- 1 transformateur 20kv/410v : 2500 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 2 000 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Surpresseur de Marches

- 9 pompes de 200 m³/h à 140 m HMT (dont 1 en vitesse variable)
- 1 transformateur 20kv/410 v : 1250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 1 050 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Mondy

- origine de l'eau : Canal de la Bourne

Haut service :

- 2 pompes de 90 m³/h à 150 m HMT
- 1 pompe de 220 m³/h à 150 m HMT

Bas service :

- 2 pompes de 220 m³/h à 120 m HMT
- 3 pompes de 300 m³/h à 120 m HMT
- 1 transformateur 20Kv/400v 1250 Kva commun aux stations de pompage HS et BS
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 890 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU) commun aux stations de pompage HS et BS

Station de pompage des Monts du Matin

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 2 pompes de 150 m³/h à 220 m HMT (dont 1 en vitesse variable)
- 5 pompes de 480 m³/h à 220 m HMT
- 2 transformateurs 20 Kv/410v : 1250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 1 750 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Vernet

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 2 pompes de 75 m³/h à 120 m HMT
- 4 pompes de 200 m³/h à 120 m HMT
- 1 transformateur 20Kv/400v : 1000 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 465 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Bel Ebat

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- ##### haut service :

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- 3 pompes de 200 m³/h à 200 m HMT

bas service :

- 4 pompes de 250 m³/h à 120 m HMT
- 1 transformateur 15-20Kv/400v : 1000 Kva commun aux stations de pompage HS et BS
- puissance ENEDIS souscrite : de 5 à 740 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Montelier

- origine de l'eau : Canal de la Bourne

Haut service :

- 1 pompe de 80 m³/h à 190 m HMT
- 4 pompes de 200 m³/h à 190 m HMT

Bas service :

- 3 pompes de 250 m³/h à 110 m HMT
- 1 transformateur 15-20Kv/410v : 1250 Kva commun aux stations de pompage HS et BS
- puissance ENEDIS souscrite : de 5 à 1200 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de Chabeuil (lafarge)

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 2 pompes de 90 m³/h à 120 m HMT
- 2 pompes de 150 m³/h à 120 m HMT
- 1 transformateur 20Kv/400v : 400 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 5 à 280 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)
- 1 transformateur 15-20Kv/410V : 315 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 20 à 4000 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage des Ruches

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 7 pompes de 220 m³/h à 110 m HMT
- 1 transformateur 15Kv/410V : 1000 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 700 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de production des Rivières

Exhaure : Puits Rivières :

- origine de l'eau : Nappe de la Plaine de Valence
- 3 pompes de 163 m³/h à 17 m HMT

Reprise des Rivières :

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 4 pompes de 150 m³/h à 110 m HMT
- 5 pompes de 350 m³/h à 120 m HMT
- 1 transformateur 15-20Kv/400V : 1250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 965 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage Lafarge/ Soufledet

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- réserve « tampon » de 50 000 m³
- 2 pompes de 150 m³/h à 140 m HMT
- 5 pompes de 350 m³/h à 140 m HMT

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- 1 transformateur 15-20Kv/410v : 1250 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 3 à 950 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage de la Buzatte

- origine de l'eau : Canal de la Bourne
- 4 pompes de 150 m³/h à 100 m HMT (moteur 75 Kw)
- 1 transformateur 20Kv/400v : 315 kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 260 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de pompage : puits de Reboulet

- origine de l'eau : Nappe
- 1 pompe immergée de 60 m³/h à 120 m HMT
- puissance ENEDIS souscrite : de 6 à 72 Kw (Segment C4 : tarif B.T. > 36 Kw – LU)

2.2.7 RESEAUX LILAS-VANELLE-COMBEAUX

Station de production de la Vanelle

- origine de l'eau : Isère
- 10 pompes 250 m³/h à 160 m HMT
- 1 transformateur 15-20Kv/690v : 2000 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 3 à 1400 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Station de production de Lilas

- origine de l'eau : Isère
- 3 pompes d'exhaures de 3 000 m³/h à 10 m HMT
- 8 pompes 1 000 m³/h à 135 m HMT (moteurs en 5 750 v)
- 1 pompe de remplissage du réseau 100 m³/h à 150 m HMT
- 3 transformateurs 15-20Kv/5750v : 2 500 Kva + 1 en secours

Station de production les Combeaux

- origine de l'eau : Rhône
- 2 pompes d'exhaure de 315 m³/h à 15 m HMT
- 3 pompes de 210 m³/h à 85 m HMT
- 1 pompe de 80 m³/h à 70 m HMT
- 1 transformateur 15Kv/400V : 400 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 1 à 240 Kw (Segment C3 : HTA5 – CU)

Ces réseaux disposent de maillages avec les réseaux liés au canal de la Bourne (stations de pompage des Ruches - Mondy).

2.2.7 RESEAUX PORTES LES VALENCE-FONTAINE

Station de production de Fontaine

- origine de l'eau : Résurgence de la nappe de la Plaine de Valence
- 4 pompes de 65 m³/h à 170 m HMT
- puissance ENEDIS souscrite : de 6 à 204 Kw (Segment C4 : tarif B.T. > 36 Kw - LU)

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Station de production : Puits Clairac

- origine de l'eau : Nappe Mollasse Miocène
- 1 pompe immergée de 85 m³/h à 130 m HMT
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 72 Kw (Segment C4 : tarif B.T. > 36 Kw – LU)

Station de production de Chaffit

- origine de l'eau : Rhône
- 4 pompes de 450 m³/h à 85 m HMT
- 1 transformateur : 1000 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 375 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)


Station de reprise de Maret

- 6 pompes de 210 m³/h à 75 m HMT
- 1 transformateur 15-20Kv/410V : 630 Kva
- puissance ENEDIS souscrite : de 2 à 340 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

Ce réseau dispose d'un maillage de secours partiel avec le réseau de la plaine de Valence (station de pompage des Rivières).

2.2.8 RESEAUX DE DISTRIBUTION


Le linéaire total des réseaux de distribution des réseaux « canal de la Bourne » est de 850.9 Km.

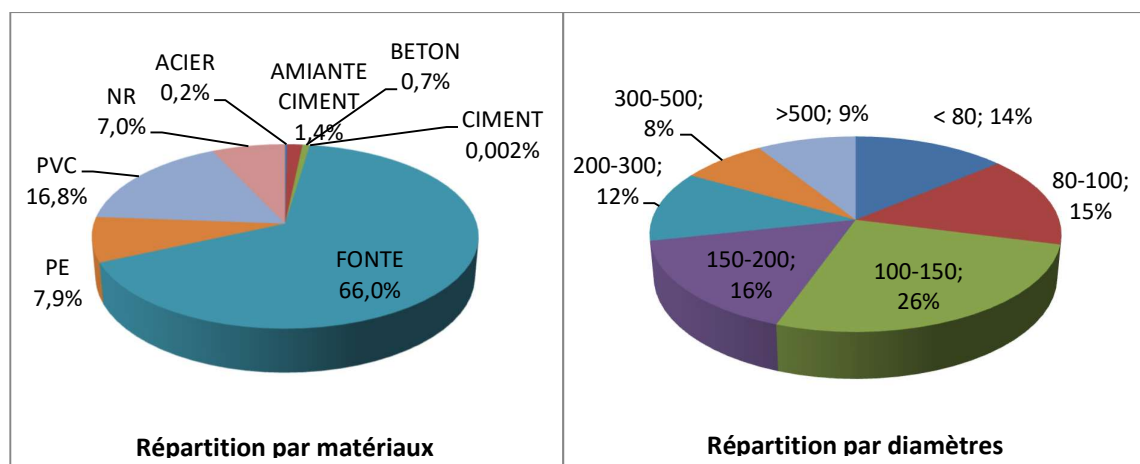

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

2.2.9 RESEAU DU SUD EST VALENTINOIS

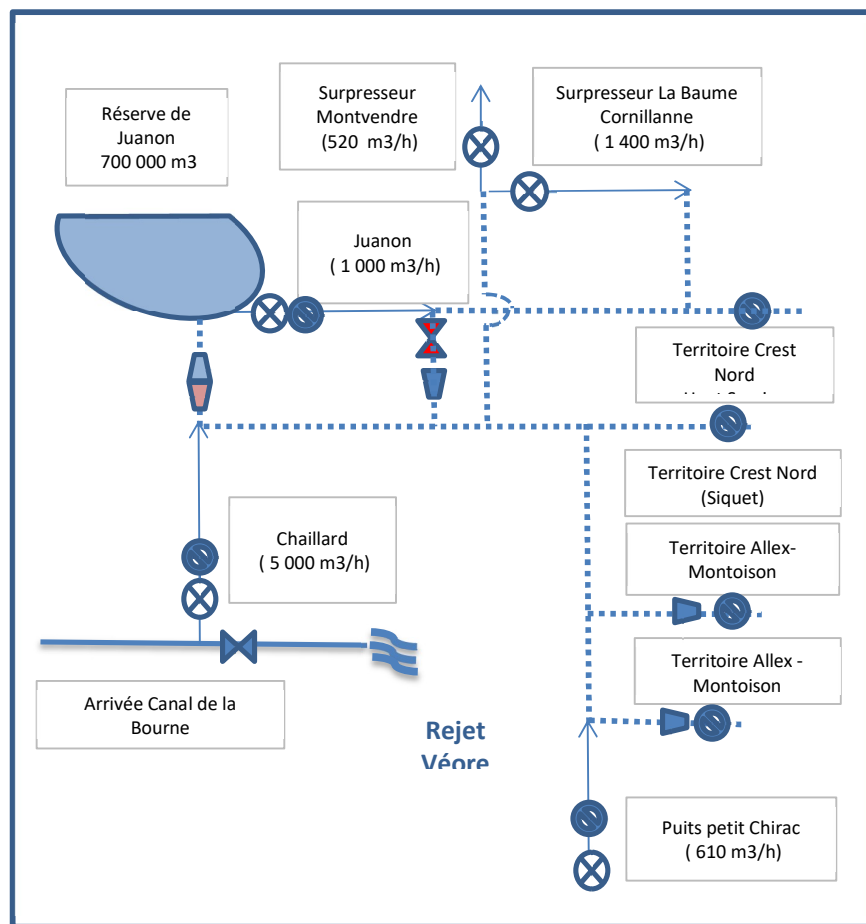

Réserve de Juanon

Capacité 700 000 m

Hauteur maxi de digue : 12 m

La digue de cet ouvrage est classée catégorie C au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Cette réserve est remplie par la station de pompage de Chaillard en dehors des périodes d'irrigation

Station de pompage de Chaillard

10 Groupes de pompage de 500 m³/h à 220 m HMT

2 Groupes de pompage de 250 m³/h à 220m HMT

Capacité maximale de pompage de 5 250 m³/h

Puissance souscrite auprès d'ENEDIS : de 20 à 4400 Kw (Segment C2 : HTA télélevé)

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55



Surpresseur de la Baume Cornillanne

2 Groupes de pompage de 200 m³/h à 140 m HMT (moteur 132 Kw)
 2 Groupes de pompage de 350 m³/h à 98 m HMT (Moteur 132 Kw)
 Capacité maximale de pompage de 1 400 m³/h à 98 m HMT
 Transformateur de 800 Kva
 Puissance suscrite auprès d'ENEDIS : de 21 à 750 Kw (Segment C2 : HTA télélevé)

Surpresseur de Montvendre

3 Groupes de pompage de 120 m³/h à 105 m HMT (moteur 75 Kw)
 2 Groupes de pompage de 80 m³/h à 105 m HMT (moteur 55 Kw)
 Capacité maximale de pompage de 520 m³/h à 105 HMT
 Transformateur de 630 Kva
 Puissance souscrite auprès d'ENEDIS : de 2 à 220 Kw (Segment C3 : HTA non télélevé)

Station de Pompage de Juanon

3 Groupes de pompage d'exhaure de 400 m³/h à 20 m HMT
 6 Groupes de pompage de 200 m³/h à 200 m HMT (moteur 160 Kw)
 Capacité maximale de pompage de 1000 m³/h à 200 m HMT
 Transformateur de 1 250 Kva
 Puissance souscrite auprès d'ENEDIS : de 20 à 870 Kw (Segment C2 : HTA télélevé)

Station de pompage du petit Chirac


Origine de l'eau : Nappe de la Plaine de Valence
 4 Groupes de pompage de 122 m³/h à 120 m HMT
 Capacité maximale de pompage de 350 m³/h
 Puissance souscrite auprès d'ENEDIS : de 2 à 300 Kw (Segment C2 : HTA télélevé)

Réseau de distribution

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

148.4 Km de conduite (Dn 32 mm au DN 900 mm) essentiellement en fonte ductile.

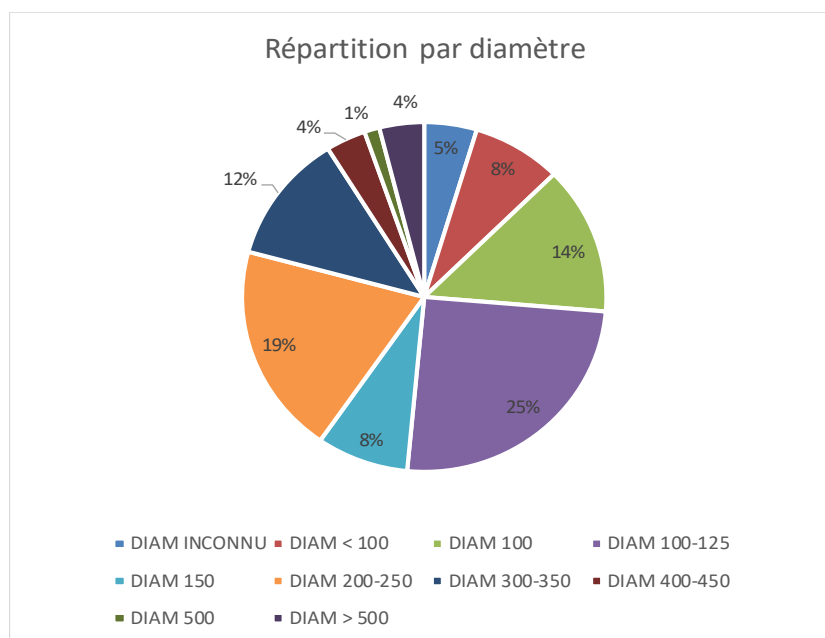

2.2.10 RESEAU GRANGES LES BEAUMONT

Station de pompage de Condillac Est

4 Groupes de pompage immergés de 141 m³/h à 138 m HMT

1 Groupes de pompage immergé de 77 m³/h à 138 m HMT

Capacité maximale de pompage de 564 m³/h

Puissance souscrite auprès d'ENEDIS : de 1 à 320 Kw (Segment C2 : HTA télérelevé)

2.2.11 SYNTHÈSE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

1 Barrage

66 Km de canaux

2 centrales hydroélectriques

36 stations de pompage

41 transformateurs

203 pompes

999.3 Km de réseau

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

3- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025

3.1 ORIGINE DE L'EAU

L'eau distribuée sur le territoire de la Bourne-Valentinois provient essentiellement des ressources suivantes :

- La rivière Bourne
- La rivière Isère.

Un complément est apporté par le Rhône (Combeaux, Chaffit) et des pompages dans la nappe dite « des alluvions de la plaine de Valence » (puits des Rivières et Petit Chirac), dans la nappe dite « molasse Miocène (puits Clairac et Reboulet) et par la prise d'eau de Fontaine (résurgence de la nappe).


Milieu de prélèvement	Ouvrage ou station de pompage	Volumes prélevés		Autorisations de prélèvement		
		Annuel (m3)	Etiage (m3) ⁽²⁾	Débit (m3/s)	annuel (m3)	Etiage (m3) ⁽²⁾
Bourne (Irrigation Gravitaire)	Prise d'eau canal	10 497 027		7,00		
Bourne	Rodin	19 365	19 365		39 100	20 600
Total Bourne (Irrigation Gravitaire)						
Bourne (irrigation pression)	Prise d'eau canal	22 792 393		7,00		
Total Bourne (irrigation pression)						
Ressurgence Ecoutay	Fontaine	185 288	170 250		449 700	404 700
Total Ressurgence Ecoutay		185 288	170 250		449 700	404 700
Isère	Lilas	4 688 813	2 969 207			
Isère	Vanelle	910 625	632 131		1 863 600	
Isère	Martinet	10 015 553	7 948 247		15 199 700	
Isère	Ecancière	10 538	1 282		2 152 700	
Isère	Triboulières	6 755 594	5 450 519	1,50	5 682 600	
Total Isère		22 381 123			24 898 600	
Nappe Isère	Granges les Beaumont	451 917	405 980		550 000	
Total Nappe Isère		451 917			550 000	
Nappe Molasse Miocène	Clairac	73 755	58 588		117 100	117 100
Nappe Molasse Miocène	Reboulet	50 900	50 900		5 414	5 414
Total Nappe Molasse Miocène		124 655	109 488		122 514	
Nappe Plaine de Valence	Rivières	72 434	68 190		88 100	79 200
Nappe Plaine de Valence	Petit Chirac	210 602	170 429		394 100	354 700
Total Nappe Plaine de Valence		283 036	238 619		482 200	433 900
Rhône ⁽¹⁾	Chaffit	739 981	547 278	0,50	1 435 000	796 341
Rhône ⁽¹⁾	Combeaux	209 955	134 243	0,23	620 000	377 195
Total Rhône		949 936				
Total général		47 187 713			28 597 114	

(1) Arrêté de régularisation des prises d'eau dans le Rhône DDT-SEF-2025-01068 du 16/07/2025 géré par la DREAL

(2) Etiage : mois de juillet-Aout-Septembre selon la DREAL pour le Rhône et l'Isère

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

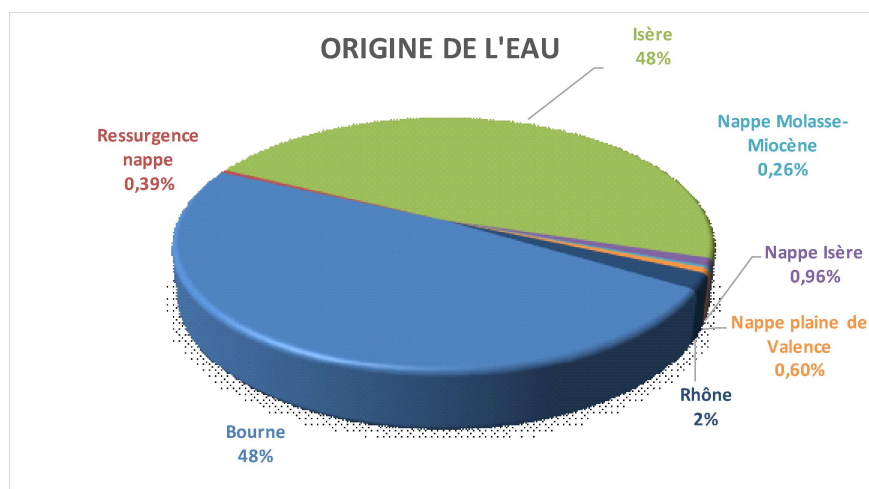

3.2 CONSOMMATIONS

Synthèse par type de consommateurs				
Type	Nombre de bornes	Nombre de clients	conso (m3)	Facturation (m3)
PRO	2 349	937	22 616 843	23 469 523
COLLECTIVITES	169	52	304 217	383 534
NON PRO	7 428	7 251	1 508 298	1 508 298
GRAVITAIRE	1 158	1 141	10 497 027	0
EXPORT => Val de Drôme	4		906 477	0
FONCT CANAL	4		0	0
Total	11 104	9 381	35 832 862	25 361 355

GRAVITAIRE : Irrigation gravitaire directement à partir du canal de la Bourne

EXPORT : Volume transféré vers les réseaux du Val de Drôme


FONC CANAL : non mesuré inclus dans les consommations gravitaires

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

TOTAL PAR RESEAUX						
Réseaux	Débits souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes/brt	nombre de clients (1)
Morliettes	2 570	0	403 533	447 009	1091	1053
Lilas 1	2 698	0	3 247 715	875 777	190	135
Vanelle	2 399	0	795 500	830 619	175	132
Combeaux	1 410	0	251 651	280 946	350	316
Riviers	2 759	0	416 354	457 333	1098	999
Portes les Valence	2 407	0	722 242	777 577	523	476
Lilas 2	971	0	120 008	135 694	542	513
Fontaines	657	0	178 391	193 296	56	42
Buzatte	552	93	187 852	196 759	31	23
Vernet	1 610	208	500 069	525 370	99	62
Hostun Jaillans	4 827	753	1 639 187	1 714 672	304	166
A.M.C.	7 291	937	2 959 301	3 019 202	753	620
Mondy	1 041	146	399 083	411 529	76	65
Les Ruches	6 715	766	2 238 138	2 330 297	700	533
Plaine de Valence	5 170	558	1 960 327	2 003 071	703	631
Papelissier	1 498	176	661 542	673 759	125	96
St Marcel Sud	1 190	54	234 012	243 075	465	445
Monts du Matin	6 700	983	2 457 566	2 548 874	411	265
Granges Les Beaumont	902	132	371 069	379 520	54	31
Sud Est Valentinois	13 421	1 415	4 508 355	4 657 018	1031	709
Total	66788,62	6220	24 251 895	22 701 397	8777	7432

(1) : 120 clients en "cumul" non répartis sur les réseaux

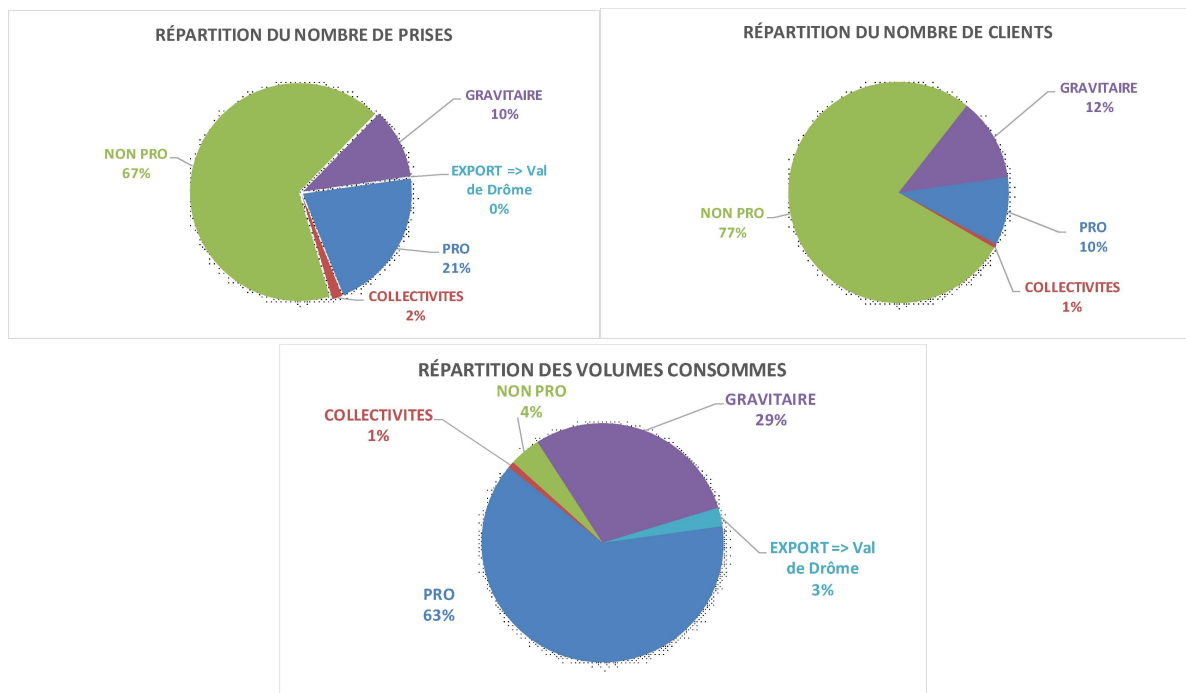

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

PROFESSIONNELS								
Réseaux	Débits souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients (1)	Debit souscrit par ha	Conso annuelle par ha
Morliettes	1 088		213 637	253 363	67	37		
Lilas 1	8 126		3 184 770	3 290 981	360	116		
Vanelle	2 151		773 367	808 486	82	39		
Combeaux	909		194 208	222 338	50	19		
Riviers	514		198 584	211 300	29	19		
Portes les Valence	1 605		606 646	648 557	70	35		
Lilas 2	210		41 255	46 197	12	9		
Fontaines	525		155 225	170 130	25	11		
Buzatte	535	93	186 278	195 185	24	16	5,75	2 003
Vernet	1 459	208	493 021	518 322	62	26	7,02	2 373
Hostun Jaillans	4 580	746	1 611 681	1 684 416	202	65	6,14	2 161
A.M.C.	5 826	921	2 783 485	2 842 216	170	68	6,32	3 021
Mondy	916	146	387 970	400 416	35	24	6,27	2 656
Les Ruches	5 225	755	2 029 362	2 117 577	222	77	6,92	2 689
Plaine de Valence	3 560	539	1 837 836	1 875 830	122	55	6,61	3 411
Papelissier	1 305	175	646 468	658 408	39	13	7,46	3 694
St Marcel Sud	445	47	161 851	168 114	19	10	9,49	3 451
Monts du Matin	6 190	977	2 413 089	2 503 663	241	103	6,34	2 471
Granges Les Beaumont	877	130	357 050	365 501	50	28	6,75	2 749
Sud Est Valentinois	11 473	1 400	4 341 060	4 488 523	468	167	8,19	3 100
Total	57 519	6 136	22 616 843	23 469 523	2 349	937	6,83	2 793

(1) : Clients en "cumul" (clients ayant des bornes sur plusieurs réseaux) sont comptabilisés plusieurs sur chaque réseau

COLLECTIVITES								
Réseaux	Débits souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrit par ha	Conso annuelle par ha
Morliettes	170		50 453	54 203	6	2		
Lilas 1	299		40 812	45 158	15	3		
Vanelle	0		0	0	0	0		
Combeaux	10		335	1 500	2	2		
Riviers	471		34 448	62 711	22	7		
Portes les Valence	149		51 766	65 190	14	2		
Lilas 2	87		3 901	14 645	17	1		
Fontaines	40		13 973	13 973	2	2		
Buzatte				néant				
Vernet				néant				
Hostun Jaillans	41	7	9 089	11 839	2	2	5,86	1 298
A.M.C.	193	15	38 369	39 539	29	3	12,70	2 524
Mondy				néant				
Les Ruches	157	12	3 031	6 975	20	7	13,19	255
Plaine de Valence	228	20	10 857	15 607	8	5	11,69	557
Papelissier	10	1	23	300	2	1	10,00	23
St Marcel Sud	65	7	2 146	4 946	5	1	9,70	320
Monts du Matin	57	6	14 428	15 162	8	5	9,21	2 331
Granges Les Beaumont	25	2	14 003	14 003	2	1	12,50	7 002
Sud Est Valentinois	134	15	16 583	17 783	15	8	9,12	1 128
Total	2137	84	304 217	383 534	169	52		1 044

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

NON PROFESSIONNELS								
Réseaux	Débits souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de brt	nombre de clients	Debit souscrit par brt	Conso annuelle par brt
Morliettes	1312		139 443	139 443	1018	1014	1,29	137
Lilas 1 ⁽¹⁾	1501		199 596	199 596	984	944	1,53	203
Vanelle	248		22 133	22 133	93	93	2,67	238
Combeaux	491		57 108	57 108	298	295	1,65	192
Riviers ⁽¹⁾	1773		183 322	183 322	1047	973	1,69	175
Portes les Valence	653		63 830	63 830	439	439	1,49	145
Lilas 2	674		74 852	74 852	513	503	1,31	146
Fontaines	92		9 193	9 193	29	29	3,17	317
Buzatte	17		1 574	1 574	7	7	2,43	225
Vernet	151		7 048	7 048	37	36	4,09	190
Hostun Jaillans	206		18 417	18 417	100	99	2,06	184
A.M.C.	1272		137 447	137 447	554	549	2,30	248
Mondy	125		11 113	11 113	41	41	3,05	271
Les Ruches	1333		205 745	205 745	458	449	2,91	449
Plaine de Valence	1382		111 634	111 634	573	571	2,41	195
Papelissier	183		15 051	15 051	84	82	2,18	179
St Marcel Sud	680		70 015	70 015	441	434	1,54	159
Monts du Matin	453		30 049	30 049	162	157	2,80	185
Granges Les Beaumont	2		16	16	2	2	1,00	8
Sud Est Valentinois	1814		150 712	150 712	548	534	3,31	275
Total	14 362		1 508 298	1 508 298	7 428	7251	2,25	213

(1) : y/c les robinets de jardins collectifs

3.3 RENDEMENTS DU TERRITOIRE BOURNE-VALENTINOIS

Le rendement correspond au rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers et le volume d'eau prélevé et introduit dans le réseau de distribution.

Rendements	
Global	75,94%
Réseaux sous pression	82,96%
Canal	nc

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Détail par réseaux

Réseaux	Conso	Prod	Rendements
Portes les Valence / Fontaines	900 633	1 040 313	86,57%
Riviers/SMS/Plaine de Valence	2 610 693	3 348 055	77,98%
Combeaux	251 651	272 319	92,41%
Lilas 1 / Lilas 2 / Morliettes	4 566 756	5 290 272	86,32%
Papelissier	661 542	808 459	81,83%
Monts du Matin	2 457 566	3 020 263	81,37%
Vernet	500 069	636 652	78,55%
Les Ruches/Mondy BS	2 238 138	2 998 111	74,65%
Mondy HS	399 083	496 545	80,37%
AMC	2 959 301	3 333 827	88,77%
Hostun-Jaillans	1 639 187	1 808 111	90,66%
Buzatte	187 852	242 366	77,51%
Granges les Beaumont	371 069	451 917	82,11%
Sud Est Valentinois	4 508 355	5 484 815	82,20%
Total	24 251 895	29 232 025	82,96%

3.4 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

3.4.1 RESEAUX BOURNE SOUS PRESSION

La consommation totale pour l'année 2025 est de 19 008 990 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,072
€/m3 consommé	0,073
€/Kwh	0,068

Remarques : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements au titre de l'énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

3.4.2 RESEAU DE HOSTUN-JAILLANS

La consommation totale pour l'année 2025 est de 1 902 013 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,160
€/m3 consommé	0,083
€/Kwh	0,071

Remarques : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements au titre de l'énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

3.4.2 RESEAU DE GRANGES LES BEAUMONT

La consommation totale pour l'année 2025 est de 391 734 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,056
€/m3 consommé	0,072
€/Kwh	0,068

Remarques : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements au titre de l'énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

3.4.3 RESEAU SUD EST VALENTINOIS

La consommation totale pour l'année 2025 est de 6 546 166 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,248
€/m3 consommé	0,078
€/Kwh	0,063


Remarques : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements au titre de l'énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55


3.5 PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

3.5.1 CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE D'AUBERIVES

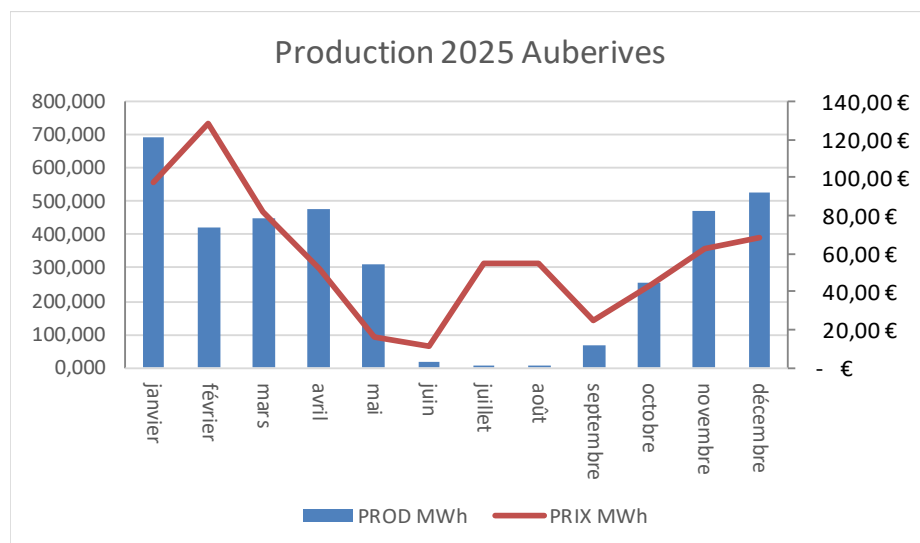

Production annuelle de **3 687 266 kWh** soit une réduction de 3 687 T de CO₂ émis

3.5.2 CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ECANCIERE

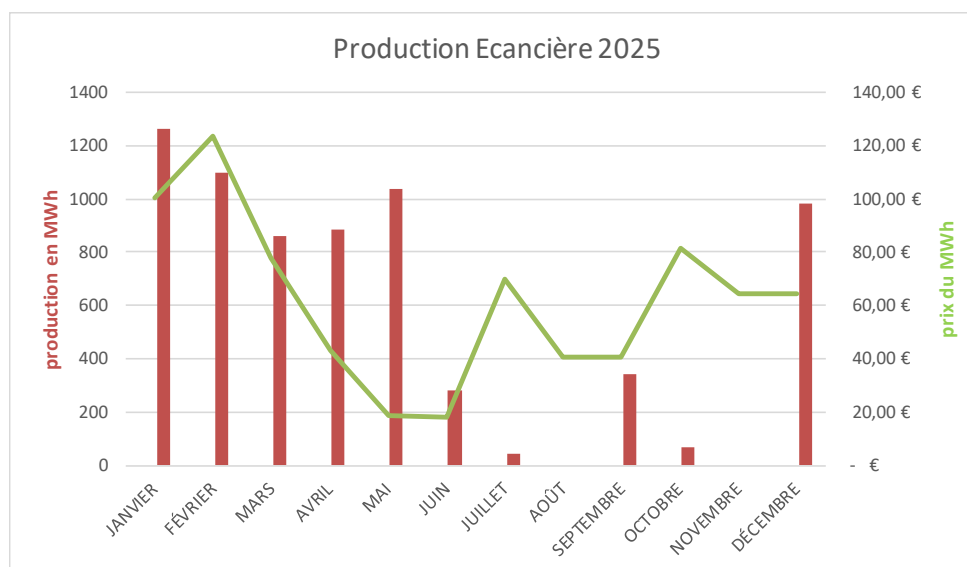

Production annuelle de **6 875 482 kWh** soit une réduction de 6 875 T de CO₂ émis

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

4- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

4.1. SECURITE PUBLIQUE

4.1.1 BARRAGE

- Mesures des drains : SITES
- Porté à connaissance procédure de remise en tension tirants
- Registre barrage : SID
- Campagne de mesures de suivi fuite parement RD Barrage et Ecoulement aval RD : SID
- Suivi photographique évolution trou galerie RG : SID
- Suivi fissuromètres galerie RD, galerie RG : SID

Evénements importants pour la sécurité hydraulique (EISH)

Niveau jaune

- les événements à caractère hydraulique ayant conduit à une mise en difficulté des personnes ou à des dégâts de faible importance à l'extérieur de l'installation
- les événements traduisant une non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise en danger des personnes
- les défauts de comportement de l'ouvrage ou de ses organes de sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d'exploitation en dehors du référentiel réglementaire d'exploitation de l'ouvrage, sans mise en danger des personnes.

Niveau orange

- une mise en danger des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves
- des dégâts importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

Niveau Rouge

- une mise en danger des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves
- des dégâts importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

	DATE	OBJET	ETAT
EISH1	25/04/2016	COUPURE COURANT Foudre	Close
EISH2	14/04/2021	FUITE VANNE 1 RD	Close
EISH3	11/06/2021	FUITE VANNE 3RG	Close
EISH4	03/01/2022	CRUE 7 ET 8 FEVRIER => DDE REGUL DREAL	Close
EISH5	05/01/2022	CRUE DU 28/12/2021	Close
EISH6	23/03/2022	FUITE VANNE 1RG	Close
EISH7	09/06/2022	EFFONDREMENT VOUTE GALERIE RG	en cours
EISH8	20/10/2023	INTERVENTIONS GALERIES POUR ANALYSE TOPO-RADAR-AMIANTE-PLOMB	Close

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

4.1.2 CANAL DE LA BOURNE

- Rapport d'Auscultation tunnel Barmier : SITES
- Proposition de confortement du tunnel BARMIER (Etude) : ISL
- Suivi des voutes non bâties : tunnel de Manne : SID
- Suivi des mesures des fissuromètres : SITES
- Rapport de VTA Tunnel des Allemands : ISL
- Rapport de VTA Tunnel des Falaises : ISL
- Registre canal : SID

Événements importants pour la sécurité hydraulique (EISH)

Niveau jaune

- les événements ayant conduit à une dégradation significative de la digue nécessitant une réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger des personnes.

Niveau orange

- les événements à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves
- les événements ayant entraîné des dégradations importantes de l'ouvrage, quelles que soient leurs origines, mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une réparation en urgence.

Niveau Rouge

- les événements à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves ;
- les événements ayant entraîné des dégradations importantes de l'ouvrage, quelles que soient leurs origines, mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une réparation en urgence.

	Date	Objet	Niveau	Commentaires	Etat
EISH1	15/03/2012	AQUEDUC DE LA CHAPELLE	jaune	Réparations faites - Plus de fuites	EISH CLOS
EISH2	30/03/2012	FUITE BEAUREGARD-BARET	jaune	Réparations faites - Plus de fuites	EISH CLOS
EISH3	03/07/2018	FUITE ST NAZAIRE EN ROYANS	jaune	Réparations faites - Plus de fuites	EISH CLOS
EISH4	08/02/2023	FUITE ST JUST DE CLAIX MME GAGNEUX	jaune	Réparations faites - Plus de fuites	EISH CLOS
EISH5	11/10/2023	GLISSEMENT AMONT EXUTOIRE TRIBOULIERES	jaune	Intervention sur terrain sus-jacent pour supprimer les écoulements vers le canal Intervention à prévoir pour restaurer la berge	A SUIVRE
EISH6	23/05/2024	NOUVEAU GLISSEMENT AMONT EXUTOIRE TRIBOULIERES	jaune	Fournir contrôle à débit max + planning exécution étude geotek + travaux	A SUIVRE
EISH7	19/03/2025	ECOULEMENTS PIED DE TALUS PK2,140 et PK 2,050	jaune	Réparations faites - Plus de fuites	EISH CLOS

4.1.3 RESERVE DE JUANON

- Suivi des niveaux des piézomètres : SID
- Suivi des débits des drains (tapis drainant digue et tapis drainant sous réserve) : SID
- Registre Barrage

Événements importants pour la sécurité hydraulique (EISH)

	DATE	OBJET	ETAT
EISH1	07/02/2011	DECHIRURE IMPORTANTE BACHE	Close
EISH2	13/10/2023	DECHIRURE BACHE	Close

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

4.2. CHASSES SEDIMENTAIRES AU BARRAGE D'AUBERIVES EN ROYANS

Une tentative de chasse sédimentaire a été réalisée le 18 avril 2025.

4.2.1 CHASSE DU 18 AVRIL 2025

Phase de PREALERTE

- à partir du 16/04/2025 à 13h40

Phase d'ALERTE

- à partir du 18/04/2025 à 8h00
- La vidange de la retenue a commencé à 7h30 avec un débit de la rivière Bourne de 64 m³/s.
- La vidange de la retenue a été stoppée à 14h30 le débit de la rivière Bourne ayant été jugé insuffisant. La cote d'eau dans la retenue était de -5.68 m (les vannes de fond n'étaient donc pas dénoyées).
- Le suivi de la qualité des eaux à l'aval a montré l'absence d'impact sur la vie aquatique.

Phase de FIN DE CHASSE

- à partir du 18/04/2025 à 14h30
- Remplissage de la retenue – retenue pleine à 18h00

Une proposition de modification de l'arrêté de chasses sédimentaires a été proposé par le SID au service de l'Etat afin de rendre les chasses réellement opérationnelles ; a ce jour cette proposition est resté sans réponse des services de l'Etat.

4.3. CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE

Contrôles périodiques des installations électriques de la Bourne					
Sites	Commune	Conventions	Visite précédente	Visite suivante	Observations
Auberives	Auberives en Royans	CAPARA	8 novembre 2023	2026	A faire tous les ans
Jaillans	Jaillans	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Baume d'Hostun	Baume d'Hostun	CAPARA	20 juillet 2023	2026	
Ecancière	Eymeux	CAPARA	27 novembre 2025	2026	
Lafarge-Meymans	Meymans	CAPARA	19 novembre 2024	2027	
Le mas du Falconnet	Auberives en Royans	CAPARA	9 novembre 2023	2026	
Martinet	Chatuzange le Goubet	CAPARA	7 novembre 2023	2026	
Triboulière	Saint Nazaire en Royans	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Truchet	Eymeux	CAPARA	19 novembre 2024	2027	
Lafarge	Chabeuil	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Bel Ebat	Montélier	CAPARA	20 novembre 2024	2027	
Manuel	Montélier	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Marches	Marches	CAPARA	20 novembre 2024	2027	
Mondy	Bourg de péage	CAPARA	7 novembre 2023	2026	
Monts du matin	Bourg de péage	CAPARA	28 novembre 2025	2028	
Papelissier Bas	Canard et Rioussat	CAPARA	20 novembre 2024	2027	
Papelissier Haut	Papelissier	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Lilas	Châteauneuf sur isère	CAPARA	20 novembre 2024	2027	
Réservoir Lilas (Deveys)	Châteauneuf sur isère	CAPARA	5 juin 2024	2027	
Les ruches	Alixan	CAPARA	7 novembre 2023	2026	
Tendillon	Chatuzange le Goubet	CAPARA	2 décembre 2024	2027	
Vanelle	Châteauneuf sur isère	CAPARA	20 novembre 2024	2027	
Vernet	Alixan	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Ormes	Alixan	CAPARA	22 février 2023	2026	
Buzatte	Malissard	CAPARA	27 novembre 2025	2028	
Souffledet	Lafarge	CAPARA	27 novembre 2024	2027	
Reboulet	Beaumont les Valence	CAPARA	21 novembre 2024	2027	
Secondaire 4	Chabeuil	CAPARA	15 novembre 2023	2026	
Chaffit	Lamotte	CAPARA	21 novembre 2024	2027	
Combeaux	Bourg les Valence	CAPARA	26 novembre 2025	2028	
les fontaines	Montéléger	CAPARA	15 novembre 2023	2026	
Maret	Valence	CAPARA	15 novembre 2023	2026	
Puits clairac	Catalon / Beaumont les Valenc	CAPARA	26 novembre 2025	2028	
Secondaire 3	Montélier	CAPARA	27 février 2025	2027	
Riviers	Valence	CAPARA	28 novembre 2025	2028	

Contrôles périodiques des installations électriques du territoire du Sud Est Valentinois				
Sites	Observations	Conventions	Visite précédente	Visite suivante
Bois de la cour	Montvendre	CAPARA	21 novembre 2024	2027
Chaillard	Chabeuil	CAPARA	21 novembre 2024	2027
Juanon	Montmeyran	CAPARA	15 novembre 2023	2026
Lozière	Baume cornillane	CAPARA	15 novembre 2023	2026
Petit chirac	Beaumont lès Valence	CAPARA	26 novembre 2025	2028

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

4.4. CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION

Date	Appareil	Volume – Pression de service	Type d’inspection	Non- conformité	Organisme inspecteur
Station de pompage Chaffit					
2020	MARCEL GEZ n°1289	5 000 l – 6.6 bars	Requalification décennale	Néant	ASAP
03/2024			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
01/2026			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC
11/2022	MARCEL GEZ n°1290	6 000 l – 6.6 bars	Requalification décennale	Néant	ASAP
03/2024			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
01/2026			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Combeaux					
2022	CHARLATTE n°5000SS184	5 000 l – 10 bars	Requalification décennale	Néant	ASAP
01/2026			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Ecancière					
		3.8 bars	Pas de contrôle	Néant	
Station de pompage Triboulières					
2018	MASSAL n°910001927	8 000 l - 10 bars	1ère mise en service	Néant	MASSAL
2022	MASSAL n°910001927	8 000 l - 10 bars	Inspection périodique sans ouverture	Néant	DEKRA
Station de pompage Fontaines					
2020	CHARLATTE n°12000- 013	12 000 l – 17 bars	Requalification décennale	Néant	ASAP
03/2024			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
01/2026			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Lilas					
2023	MARION n°6494 – Rénovation SIGEDI	30 000 l – 14 b	Rénovation et Requalification décennale	Néant	NOTE DE CALCUL SIGED - ASAPI
2023	MARION n°6494 – Rénovation SIGEDI	30 000 l – 14 b	Rénovation et Requalification décennale	Néant	NOTE DE CALCUL SIGEDI - ASAP
Station de pompage Maret					
2020	CHABANON n°315	30 000 l – 9 b	Requalification décennale	Néant	ASAP
03/2024			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
01/2026			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Station de pompage Martinet					
		3.7 bars	Pas de contrôle	Néant	
Station de pompage Mondy					
2021	CHARLATTE n°9000.014	9 000 l – 18 b	Requalification décennale	Néant	ASAP
02/2025			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Papelissier Bas					
2017	H&H n°EP17/17	12 000 l – 21 bars	1ère mise en service	Néant	VERITAS
2022			Inspection périodique	Néant	DEKRA
03/2024			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Papelissier Haut					
2021	CHARLATTE n°6000.071	6 000 l – 18 b	Requalification décennale	Néant	ASAP
03/2025			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Vernet					
2022	STI CICOSUD n°14692-2	10 000 l – 16 b	1ère mise en service	Néant	APAVE
01/2026			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Ruches					
2021	STI CICOSUD n°14692-1	16 200 l – 16 b	1ère mise en service	Néant	APAVE
01/2026			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Rivières					
2021	CHARLATTE n°1000.061	10 000 l – 13 b	Requalification décennale	Néant	ASAP
02/2025			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Petit Chirac					
2022	CHARLATTE n°8000.074	8 000 l – 15 b	Requalification décennale	Néant	ASAP
01/2026			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage Granges les Beaumont					
2015	CHARLATTE n°80000 SH12	8 000 l – 20 b	Requalification décennale	Néant	ASAP
2022			Inspection avec ouverture	Néant	DEKRA
12/2024			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

4.5. CONTROLE CONFORMITE DES DISPOSITIFS DE LEVAGE

	Observations			ANNEE de contrôle ====>	2021	2022	2023	2024	2025
	Anomalies constatées : Non conforme			RAPPORTS suite visite contrôle ===>	Nov-21	Dec -22	nov-23	nov-24	nov-25
LIEUX	POINT DE CONTRÔLE		Capacité Kg	BILAN observations / Travaux ==>					
Centrale Auberives	Monorail nu sans marque identifiée avec Chariot porte palan Tractel n°122729	1	2 000				OK	OK	OK
Centrale Auberives	Elingue câble long 1,5 m Sans marque identifiée	3	3 000				1	1	1
Centrale Auberives	Elingue Textile long 2,0 m Sans marque identifiée - Sangle plate	1	3 000				OK	OK	
Centrale Auberives	Elingue Textile long 3,0 m Sans marque identifiée - Sangle plate	1	3 000				OK	OK	OK
Centrale Auberives	Elingue Textile long 3,0 m Sans marque identifiée - Sangle plate	1	3 000				OK	OK	Ok
Centrale Auberives	Elingue Textile long 3,0 m Sans marque identifiée - Sangle plate	1	3 000				OK	OK	Ok
Centrale Auberives	Manille Sans marque identifiée Sans référence identifiée	4	2 000				1	1	1
Centrale Auberives	Manille Sans marque identifiée Sans référence identifiée	4	800				1	1	1
Centrale Auberives	Anneau femelle	4	3 600	M30				Ok	1
Centrale Auberives	Anneau Mâle	1	1 800	M24				Ok	1
Centrale l'écanicière	Pont roulant mù à bras	1	3 000	Test à 1 580 kg	1	OK	1	1	1
Centrale l'écanicière	Palan mù à bras isolé YALE n° 805121520	1	3 000	Test à 1 580 kg		OK	1	OK	OK
Centrale l'écanicière	Elingue Textile sans référence identifiée - Sangle plate - long 3 m	1	3 000				OK	OK	
Centrale l'écanicière	Elingue Textile sans référence identifiée - Sangle plate - long 1,5 m	1	3 000				OK	OK	non présentée
Centrale l'écanicière	Elingue Textile sans référence identifiée - Sangle plate - long 1 m	1	3 000				OK	OK	OK
Centrale l'écanicière	Elingue Textile sans référence identifiée - Sangle plate - long 2 m	1	3 000				OK	OK	OK
Centrale l'écanicière	Manille droite sans référence identifiée	2	3 250				1	1	1
Centrale l'écanicière	Manille droite sans référence identifiée	4	800				1	1	1
Centrale l'écanicière	Manille droite sans référence identifiée	5	1 000				1	1	1
Centrale l'écanicière	Manille droite sans référence identifiée	1	700				1	1	1
Centrale l'écanicière	Manille lyre sans référence identifiée	1	630				1	1	1
Centrale l'écanicière	Manille lyre sans référence identifiée	1	800						1
Centrale l'écanicière	Anneau mâle sans référence identifiée	2	4 600	M36			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau mâle sans référence identifiée	2	1 500	M22			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau mâle sans référence identifiée	2	1 200	M24			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau mâle sans référence identifiée	2	930	M24			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau mâle sans référence identifiée	3	700	M24			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau femelle sans référence identifiée	2	1 800	M24					1
Centrale l'écanicière	Anneau femelle sans référence identifiée	2	1 500	M22			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau femelle sans référence identifiée	2	1 200	M20			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau femelle sans référence identifiée	1	930	M18			1	1	1
Centrale l'écanicière	Anneau femelle sans référence identifiée	1	700	M18			1	1	1

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

	Observations				ANNEE de contrôle ==>	2021	2022	2023	2024	2025
	Anomalies constatées : Non conforme				RAPPORTS suite visite contrôle ==>	Nov-21	Dec -22	nov-23	nov-24	nov-25
LIEUX	POINT DE CONTRÔLE		Capacité Kg	BILAN observations / Travaux ==>						
Lilas (Chateauneuf)	Palan	1	5 000	portique roulant (Test à 3 500 kg)	OK	OK	1	1	1	
Lilas (Chateauneuf)	Elingue 4 brins à chaine	1	11 200		OK	OK		OK		
Lilas (Chateauneuf)	Manille	1	1 600			OK	1	1	1	
Lilas (Chateauneuf)	Manille	4	9 500		OK	OK	1	1	1	
Mondy	Pont roulant mû à bras	1	1 500			OK	OK	OK	OK	
Mondy	Palan mû à bras isolé	1	1 500			OK	OK	OK	Ok	
Lafarge	pont roulant palan	1	2 000	pont roulant mû à bras	OK	OK	OK	OK	OK	
Juanon	Palan mû à bras isolé	1	1 500			OK	OK			OK
Juanon	Chariot porte-palan	1	500			OK		OK	OK	
Juanon	Pont roulant	1	1 500	palan mû à bras isolé	OK	OK		OK	OK	
Juanon	Monorail nu Sans Sans référence identifiée	1	500	monorail nu	OK	OK		OK	1	
la Baume Cornillane	Pont roulant Palan	1	1 000	pont roulant mû à bras	OK	OK	OK	OK	OK	
la Baume Cornillane	Palan à chaine VERLINDE n°981189/8	1	1 000			OK	OK	OK	OK	
Fontaine	Poutre roulante + Palan n°04459-10990	1	500	palan mû à bras sur monorail	OK	OK	OK	OK	OK	
Maret	Poutre roulante avec Palan	1	1 000	palan mû à bras sur monarail	OK	OK	OK	OK	OK	
Buzatte	Pont roulant mû à bras	1	1 000	portique roulant palan à chaine	OK	OK	OK	1	OK	
Riviers	Poutre roulante + Chariot porte palan	1	1 000	monorail nu 1000 kg	OK	OK	OK	OK	OK	
La Baume d'Hostun	Pont roulant CMI Avec un palan Verlinde	1	3 000	palan mû à bras isolé				1	OK	
Combeaux	Palan mû à bras sur monorail	1	500	Monorail avec rouleur	1	OK	OK	1	1	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

5- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025

5.1. TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

Objectifs visés (classés par ordre de priorité)

- 1/ Organes hors service à la suite de la saison précédente
- 2/ Organes dont l'état ou le niveau d'usure laisse craindre une rupture à court terme 1,2 ou 3 ans
- 3/ Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation sécurité des travailleurs
- 4/ Amélioration des performances énergétiques
- 5/ Dégradations de caractéristiques techniques
- 6/ Amélioration de la facilité d'exploitation d'un ouvrage
- 7/ Mise en conformité vis-à-vis des exigences techniques de tiers (ENEDIS, agence de l'eau etc...)
- 8/ Amélioration de la fiabilité de fonctionnement de l'ouvrage
- 9/ Lutte contre les risques d'intrusions, de dégradations, sécurité des riverains
- 10/ Amélioration des fonctionnalités de report d'information et de suivi
- 11/Réduction des nuisances à des tiers (bruits etc...)

Opérations achevées au 30/11/2025

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Barrage	RD vanne n°3 : renouvellement vérin	PR 25 09 0002	fait 2025
Barrage	Rénovation Barrage Avant Projet	PR 23 06 0014	fait 2025
Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Canal Amont	Tunnel des Allemands : Investigations géotechniques		fait 2025
Canal Aval	PROG 2024/2025 : Pk 26,469 - Pk 27,486 : Pont Clément - Pont canal Echangeur A49 (1 017 ml)	PR 24 06 0001	fait 2025
Canal Aval	S3 : Rénovation vanne - automatisme - armoire électrique	PR 24 11 0007	fait 2025
Canal de la Bourne	Etude prospective canal de la Bourne		fait 2025
Canal Lyonne	Rénovations ponctuelles ouvrages	PR 24 06 0001	fait 2025
Canaux secondaires	Rénovation étanchéité secondaires Tr 3 (S3 aval)	PR 24 06 0001	fait 2025
Gravitaire	PROG 2024/2025: Mise en conformité branchements gravitaire sur le canal et comptage	PR 24 06 0001	fait 2025
Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Réserve Juanon	Réserve : reprise étanchéité digue coté PZ2	PR 24 02 0004	fait 2025
Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Usine Auberives	Turbine n°2 RG : Remplacement sectionneur à fusibles par disjoncteur	PR25110007	fait 2025
Usine Ecancière	Renouvellement tableau électrique de répartition de tête et renouvellement des servitudes	PR 24 03 0009	fait 2025

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Réseau Les Ruches	ALIXAN : Renouvellement et déplacement des conduites d'irrigation, suite à l'aménagement de l'extension de la ZAC Rovaltain – Tranche « VERCORS TECH » Dn 400 mm	PR 25 01 0014	fait 2025
Réseau Les Ruches	BOURG DE PEAGE : Déplacement conduite Dn 125 Parcelle ZB800 (aménagement Agglo Valence-Romans)	PR 25 09 0006	fait 2025
Réseau Morliettes	BOURG LES VALENCE : Quartier Bellevue Redistribution antenne PVC enclavée avec sortie de compteurs	PR 25 05 0001	fait 2025
Réseau Papelissier	Lieu dit : TRIGNARD : Renouvellement conduite PVC Dn 90 mm	PR 25 10 0003	fait 2025
Réseau Papelissier	Renouvellement et renforcement conduite de refoulement station Dn 350 mm => Dn 400 mm	PR 24 09 0001	fait 2025
Réseau Plaine de Valence	Renouvellement et déplacement conduite Dn 200 mm en lien avec la création de l'échangeur de Montelier (RN7)	PR 23 09 0002	fait 2025
Réseau Plaine de Valence	VALENCE : Route de Chabeuil : renouvellement conduite PVC en lien avec les tvx piste cyclable Agglo	PR 24 03 0022	fait 2025
Réseau Rivières	VALENCE : Renouvellement stabilisateur "Les Charrans"	PR 24 03 0021	fait 2025
Réseau Rivières	VALENCE : Rue Jean Vilar : renouvellement conduite PVC Dn 125 mm par fonte Dn 100 mm préalablement à la réfection de chaussée	PR 25 05 0005	fait 2025
Réseau SEV	MONTVENDRE : Restructuration de la desserte en eau sur la partie Ouest de Montvendre aux abords du 900 mm	PR 24 03 0002	fait 2025
Réseau SEV	UPIE : Renouvellement conduite Dn 300 mm Sinistre ROMAC TP - SPSE sur 50 ml		fait 2025
Réseau SMS	Renouvellement PVC 125 mm en fonte 100 mm Rue des acacias avec mise en conformité des branchements (120 ml + 5 brt)	PR 25 03 0001	fait 2025
Réseau SMS	ST MARCEL LES VALENCE : Renouvellement canalisation PVC Dn 75 mm rue du Gaulois avec reprise des branchements et déplacement des regards compteurs en limite de propriété (1ère partie)	PR 24 11 0018	fait 2025
Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
SP Bel Ebat	G1 : Renouvellement ou rebobinage moteur (110 Kw)	PR 24 08 0012	fait 2025
SP Buzatte	Renouvellement automate	PR 24 11 0019	fait 2025
SP Chabeuil-Lafarge	Renouvellement automate	PR 24 11 0020	fait 2025
SP Chaillard	Groupe G2 : Renouvellement moteur	PR 25 08 0006	fait 2025
SP Chaillard	Groupe G6 : Renouvellement moteur (425 Kw => 450 Kw en IP 23)	PR 25 06 0004	fait 2025
SP Chaillard	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0011	fait 2025
SP Combeaux	Pompe jockey : Renouvellement moteur	PR 25 05 0003	fait 2025
SP Eymeux	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0007	fait 2025
SP Fontaine	Groupe G3 : Renouvellement moteur 55Kw	PR 24 10 0002	fait 2025
SP Fontaine	Groupe G4 : Renouvellement moteur 55Kw	PR 24 10 0002	fait 2025
SP La Baume Cornillanne	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0012	fait 2025
SP Lafarge-Soufflet	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0003	fait 2025
SP Lilas	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0006	fait 2025
SP Lilas	Renouvellement compresseur air n°1	PR 24 09 0005	fait 2025
SP Maret	Groupe G3 : Renouvellement du moteur	PR 24 10 0004	fait 2025
SP Maret	Renouvellement du débitmètre	PR 24 09 0015	fait 2025
SP Martinet	G8 : Rénovation pompe	PR 23 11 0008	fait 2025
SP Meymans	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0008	fait 2025
SP Mont du Matin	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0005	fait 2025
SP Montelier	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0010	fait 2025
SP Papelissier	Groupe G2 : Rénovation partielle pompe	PR 23 11 0014	fait 2025
SP Papelissier	Rénovation et mise en conformité prise d'accès à la prise d'eau	PR 24 09 0010	fait 2025
SP Petit Chirac	Ballon anti-belier : Rénovation	PR 24 03 0006	fait 2025
SP Rondin	Rénovation complète du pompage	PR 24 12 0008	fait 2025
SP Tendillon	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0004	Fait 2025

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Surp Jaillans Hostun	Modernisation des IHM embarqués afin d'être compatible HTML5 et micorsoft EDGE (obsolescence)	PR 24 05 0009	fait 2025
Surp Papelissier	Groupe G2 : Renouvellement moteur (55 Kw)	PR 25 07 0003	fait 2025
Surp Papelissier	Groupe G2 : Rénovation pompe	PR 24 09 0006	fait 2025
Tous réseaux Bourne Gravitaire	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024/2025	PR 24 11 0016	fait 2025
Tous réseaux Bourne Pression	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024/2025	PR 24 11 0016	fait 2025
Tous réseaux SEV	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024/2025	PR 24 12 0001	fait 2025

Opérations en cours au 30/11/2025

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Canal Amont	Maîtrise d'œuvre pour le programme 2025/2026	PR 25 10 0023	2025/2026
Canal Amont	Parois clouées pour tunnel du Mas	PR 25 10 0023	2025/2026
Canal Amont	PK 09,65 : Confortement talus RG La Baume	PR 25 10 0023	2025/2026
Canal Amont	Pk 18,392 - Pk19,538 : Aval aqueduc la Chapelle - Vanne de l'Ecanrière (1150 ml)	PR 25 10 0023	2025/2026
Canal Aval	PROG 2025/2026 spécial : Pk 40,945 - Pk 40,970 : Montelier (1025 ml)	PR26010011	2025/2026
Canaux secondaires	Rénovation étanchéité secondaires Tr 3 (S3)		2025/2026
Canaux secondaires	S4 : Rénovation débitmètre		2025/2026

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Parcelle Juanon	Installation Photovoltaïque - Etude d'avant-projet		2025/2026

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Réseau Rivières	VALENCE : Rte de Montelier : Renouvellement conduite PVC 160 mm par fonte Dn 150 mm création du piste cyclable par Valence agglo : tranche n°1	PR 25 05 0006	2025/2026
Réseau Vernet	ALIXAN : Renouvellement et déplacement d'une conduite Dn 150 mm dans le cadre de l'extension de la carrière CEMEX	PR 25 05 0002	2025/2026

Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
SP Chaillard	Groupe G1 : Rénovation - Renouvellement pompe	PR 23 11 0010	2025/2026
SP Chaillard	Groupe G3 : Renouvellement moteur	PR25100016	2025/2026
SP Chaillard	Groupe G5 : Rebobinage du moteur	PR25100017	2025/2026
SP Fontaine	G1 : Rénovation pompe	PR25100015	2025/2026
SP Granges Les Beaumont	G1 : Renouvellement pompe	PR25100032	2025/2026
SP Granges Les Beaumont	G2 : Renouvellement pompe	PR25100033	2025/2026
SP Martinet	G6 : Renouvellement clapet	PR25100034	2025/2026
SP Martinet	G6 : Renouvellement ou rebobinage moteur	PR25100010	2025/2026
SP Martinet	G9 : Renouvellement ou rebobinage moteur	PR 24 02 0007	2025/2026
SP Martinet	G9 : Rénovation pompe + renouvellement clapet	PR25100035	2025/2026
SP Papelissier	Couverture et rénovation GC station	PR 23 07 0001	2025/2026
SP Rivières	G3 : Rénovation pompe	PR25100014	2025/2026
SP Rivières	Rénovation du ballon anti-bélier	PR25100021	2025/2026
SP Rivières	Rénovation du dégrilleur	PR25100020	2025/2026
SP Vanelle	Dégrilleur : Rénovation	PR25100011	2025/2026
Surp Jaillans Hostun	Renouvellement Poste HTA avec Rénovation Génie civil poste HTA Dalle béton + bac de rétention + grillage transformateur	PR 24 03 0008	2025/2026
Surp Marches	G7 : Renouvellement moteur (132 Kw)	PR25110005	2025/2026
Surp Marches	G8 : Renouvellement moteur (132 Kw)	PR25110006	2025/2026
Surp Marches	Renouvellement débitmètre		2025/2026
Tous réseaux Bourne Gravitaire	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025/2026	PR25100024	2025/2026
Tous réseaux Bourne Pression	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025/2026	PR25100024	2025/2026
Tous réseaux SEV	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025/2026	PR25100024	2025/2026
Ouvrages	OBJET	n° PROJET ATAL	Planification
Usine Ecanrière	PK 19,50 : Rénovation Génie civil réservoir d'équilibre 2ème tranche	PR25100023	2025/2026

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Ces travaux sont imputés au budget investissement du SID

5.2. PRINCIPAUX TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Les principales interventions réalisées en 2025 au titre des travaux d'entretien et de maintenance sont fournies en annexe. Les charges correspondantes sont imputées au budget « fonctionnement » du SID.

5.3. TRAVAUX FACTURES

Désignation	Nb
Fourniture et pose compteur (1 - 3 - 5 m3/h)	9
Réparation borne endommagée par tiers	1
Réparation conduite endommagée par tiers	2
Modification d'un borne existante (modif débit)	3
Création branchement sur réseau gravitaire	2
Création branchement sur réseau pression	6
Création borne ou sortie sur borne existante	10
Déplacement borne	1
Déplacement branchement	1
Déplacement sortie borne	0
Extension de réseau	0
Remise en conformité d'un branchement ou poste de comptage	1
Repose compteur ou ré-ouverture brt (pression ou gravitaire)	0
Déplacement non justifié d'un agent	5
Remise en conformité de borne	0
Renouvellement compteur	0
Repose compteur suite (à impayés ou non retour contrat)	3
Participation au déplacement de conduites	4
Pénalités pour fraude	1
Divers	1

Des prestations ont été réalisées et facturées à l'ASA d'AUBERIVES :

- Prestations annuelles de mise en route et d'arrêt de la station de pompage

5.4. OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025

- ALIXAN : Dévoiement des conduites d'irrigation présentent dans le périmètre d'aménagement du site « VERCORS TECH » sur la ZAC ROVALTAIN à la demande et financé par VALENCE-ROMANS AGGLOMERATION,

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- 
- BOURG DE PEAGE : Dévoiement de la conduite d'irrigation présente sur la parcelle ZB800 en vue de son aménagement à la demande et financé par VALENCE-ROMANS AGGLOMERATION,
 - ALIXAN : Dévoiement de la conduite alimentant la borne n°53 sur la parcelle ZR157,
 - BEAUMONT LES VALENCE : Dévoiement des conduites d'irrigation présentent dans le périmètre d'aménagement des champs d'inondation contrôlés de l'Ecoutay : financement par VALENCE-ROMANS AGGLOMERATION,
 - VALENCE : dévoiement de la conduite (ddn200 mm) dans le cadre de l'aménagement de l'Echangeur de dit de MONTELIER sur la RN7 à la demande et financé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,
 - AUBERIVES EN ROYANS : Renouvellement complet du pompage « RONDIN » et intégration dans le périmètre du SID avec participation de l'ex-proprétaire et des 2 exploitants agricoles desservis.

6. GESTION CLIENTELE

6.1. PRIX DE VENTE DE L'EAU

6.1.1 TARIFICATION AGENCE DE L'EAU

Pour la saison 2025, la facturation de la redevance agence de l'eau uniformisée au SID fixée par délibération du 28 janvier 2025 est de 0,009 € H.T. /m³ consommé et 14.45 € H.T. par l/s pour les abonnements gravitaires.

6.1.2 TARIFICATION POUR LES NON PROFESSIONNELS

Le prix de vente pour les particuliers est uniformisé sur l'ensemble du territoire du SID.

Les tarifs du service sont fixés par la délibération du 28 janvier 2025.

- Une prime fixe en fonction du débit souscrit

1 m ³ /h	75,45 € HT	79,60 € TTC
3 m ³ /h	97,97 € HT	103,36 € TTC
5 m ³ /h	129,33 € HT	136,44 € TTC
10 m ³ /h	215,54 € HT	227,39 € TTC
15 m ³ /h	368,00 € HT	388,24 € TTC
20 m ³ /h	525,72 € HT	554,63 € TTC
30 m ³ /h	683,43 € HT	721,02 € TTC

- Un tarif de 0,17 €/m³ HT par m³ consommés

- Un tarif de 0,01 €/m³ HT par m³ consommés pour surcoût énergie

5.1.3 TARIFICATION POUR LES PROFESSIONNELS

Le tarif professionnel n'est accordé qu'aux abonnés pouvant justifier d'un numéro SIRET en lien avec le titulaire du contrat d'abonnement.

Pour la saison 2025, le prix de vente sur le territoire Bourne-Valentinois a été fixé à (délibération du 28 janvier 2025) :

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

RESEAU BOURNE

Part fixe

Abonnement nouveau surface ... ha 108.96 € H.T.

Abonnement nouveau débit .. m³/h 9,50 € H.T.

Abonnement ancien 5 m³/h u 128.13 € H.T.

Abonnement ancien 10 m³/h u 174.25 € H.T.

Abonnement ancien 20 m³/h u 348.50 € H.T.

Abonnement ancien 30 m³/h u 522.75 € H.T.

Abonnement ancien l/s 5 bars ... l/s 62.73 € H.T.

Abonnement ancien l/s 7 bars ... l/s 95.02 € H.T.

Gravitaire l/s 225.08 € H.T.

Part au m³ 0,089 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture moyenne de 440.17 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha) : ancien abo.

Soit une facture moyenne de 499.46 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha) : nouveau abo.

RESEAU GRANGES-LES-BEAUMONT

Part fixe

Abonnement à la surface ha 100.30 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 9,50 € H.T.

Part au m³ 0,089 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture moyenne de 490.80 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha).

RESEAU SUD-EST VALENTINOIS

Part fixe

Abonnement à la surface ha 108.96 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 9.50 € H.T.

Part au m³ 0,089 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture moyenne de 499.46 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha).

Remarque : aucune évolution tarifaire par rapport à 2024 pour les irrigants professionnels

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

6.2. RELATIONS IRRIGANTS

6.2.1 CONTINUITE DE SERVICE

Dates de mise en service et d'arrêt des réseaux

Mise en service	Ouvrages	Réseau	Mise hors service
18-nov.-24	Canal	Arrêt canal (Chômage)	22-oct.-25
13-mars-25	Canal	Mise en eau partie aval canal / remplissage gravitaire des réseaux	22-oct.-25
nc	SP Granges les Beaumont	Réseau Granges Les Beaumont	21-oct.-25
4-avr.-25	Vanne Canal S2	Mise en eau canal secondaire S2	21-sept.-25
19-mars-25	Vanne Canal S3	Mise en eau canal secondaire S3	22-oct.-25
17-mars-25	SP Lilas	Réseau Lilas (Chateauneuf sur isère)	22-oct.-25
		Réseau Vanelle (via Maillage Mondy)	
17-mars-25	SP Vanelle	Réseau Vanelle	20-oct.-25
1-avr.-25	SP Eymeux BS	Réseau Eymeux BS	22-oct.-25
31-mars-25	SP Eymeux HS	Réseau Jaillans-Hostun	22-oct.-25
1-avr.-25	Surp Jaillans	Réseau Jaillans HS (surpressé)	22-oct.-25
1-avr.-25	SP Baume d'Hostun	Réseau Baume d'Hostun BS	22-oct.-25
23-mars-25	SP Mondy HS	Réseau Mont du Matin	20-oct.-25
27-mars-25	SP Mondy BS	Réseau Ruches-SMS-Vanelle	19-oct.-25
7-avr.-25	SP Buzatte	Réserve et Réseau Buzatte	22-oct.-25
28-mars-25	SP Montelier HS	Réseau AMC HS	22-oct.-25
28-mars-25	SP Montelier BS	Réseau AMC BS	22-oct.-25
24-mars-25	SP Rivières	Réseau Plaine de Valence (Rivières)	22-oct.-25
26-mars-25		Réseau Papelissier (via Maillage Monts du Matin)	20-oct.-25
27-mars-25	SP Papelissier	Réseau Papelissier	19-sept.-25
27-mars-25	Surp Papelissier	Réseau Papelissier HS (surpressé)	20-oct.-25
nc	SP Chaffit	Réseau Portes les Valence	22-oct.-25
nc	SP Chaillard	Réseau Sud Est Valentinois	23-oct.-25
26-mars-25	SP Montvendre	Réseau Sud Est Valentinois (partie Haute)	23-oct.-25
nc	SP Baume Cornillanne	Réseau Crest nord HS	23-oct.-25
30-mars-25	SP Marches	Réseau Monts du Matin (Surpressé)	20-oct.-25
7-juil.-25	SP Rondin	Réseau Rondin	26-août-25

Problème de ressources :

Fin juin 2025, débit de la rivière Bourne proche du débit réservé => alimentation du canal limité à 300 à 400 l/s, difficultés d'alimentation des irrigants situés sur la partie amont du canal (à l'amont de st Nazaire en Royans) : très faible hauteur d'eau dans le canal.

Problèmes de capacité de pompage par rapport à la demande :

Néant

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Problèmes de fonctionnement d'ouvrages :

Coupures d'alimentation électrique (ENEDIS) :

Date	Ouvrage	Durée	Type
02-03 Jan	SP Marches	3h28	non programmée (hors saison)
02-03 Jan	SP Tendillon	3h28	non programmée (hors saison)
04-05 mars	SP Tendillon	32h30	Programmée (hors saison)
05-mars	SP Tendillon	1h09	non programmée (hors saison)
14-mars	SP Souffledet	4h15	Programmée (hors saison)
14-mars	Dégrilleur Souffledet	4h15	Programmée (hors saison)
10-avr	SP Montvendre	0h45	Programmée
09-mai	SP Rivières	4h00	Programmée
13-mai	SP Marches	6h30	Programmée
06-juin	SP Rivières	1h00	programmée
26-juin	SP Marches (surpresseur)	0h38	Non programmée
26-juin	SP Tendillon	0h38	Non programmée
26-juin	SP Meymans	0h38	Non programmée
26-juin	SP Papelissier Haut (surpresseur)	0h38	Non programmée
26-juin	SP Eymeux	0h38	Non programmée
26-juin	Usine L'Ecançière (BT)	0h38	Non programmée
26-juin	SP Papelissier Bas	0h38	Non programmée
30-juin	SP Marches	5h16	Non programmée
30-juin	SP Tendillon	5h16	Non programmée
30-juin	SP Rivières	0h11	Non programmée
30-juin	SP Bel Ebat	0h11	Non programmée
30-juin	SP Meymans	1h38	Non programmée
30-juin	SP Papelissier Haut (surpresseur)	1h38	Non programmée
30-juin	SP Eymeux	1h38	Non programmée
30-juin	Usine L'Ecançière (BT)	1h38	Non programmée
30-juin	SP Papelissier Bas	1h38	Non programmée
18-juil	SP Vanelle	0h31	Non programmée
31-août	SP Jaillans	11h00	Non programmée
04-sept	SP Vernet	17h38	Non programmée
04-sept	SP Monts du Matin	0h30	Non programmée
17-sept	SP Monts du Matin	0h07	Non programmée
17-sept	Vanne de l'Orme	0h07	Non programmée
22-sept	SP Lafarge	13h25	Non programmée
29-nov	SP Martinet	0h08	Non programmée (hors saison)
19-déc	SP Jaillans (Surpresseur)	1h00	programmée (hors saison)
25-déc	SP Vernet	1h31	Non programmée (hors saison)
25-déc	Vanne de l'Orme	1h31	Non programmée (hors saison)
26-déc	SP Combeaux	2h05	Non programmée (hors saison)
30-déc	Usine Ecançière	4h00	Programmée

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Problèmes de fonctionnement réseaux :

- Réseau de Papelissier haut service– problème de fonctionnement en lien avec 2 pompes hors services sur 3 du surpresseur de Papelissier et des fortes demandes ponctuelles en eau
- Réseaux Vanelle – Lilas et en partie les réseaux alimentés par le canal en lien avec la qualité des eaux de l'eau (voir faits marquants 2025)

6.2.2 INFORMATIONS DES IRRIGANTS

Date	Événement - Message	Mode diffusion
05-févr	Réseau SEV et Plaine de Valence : demande de contrôle des Bornes suite à dégradations par vandalisme	Mail
05-mai	Réseaux Portes les Valence - Fontaine - Combeaux : Chasses sédimentaires sur le Rhône => risque hausse turbidité => demande de réduction des consommations	Mail
11-juin	Info Problème de transmission des factures des irrigants PRO de la part du Trésor public	Mail
24-juin	Info débit bas Bourne proche du débit réservé aux irrigants PRO de la partie Isère du canal + ASA d'Auberives	Mail
21-juil	Restriction d'eau (tours d'eau) pour problème de pression pour les irrigants PRO de l'antenne Meymans - réseau Hostun-Jaillans	Mail
30-juil	Restriction d'usage pour problème technique irrigants PRO réseau Papelissier Haut service	Mail
12-août	Pompage "Rondin" alerte sur les volumes prélevés	Mail
18-août	Modifications des restriction d'eau (tours d'eau) à la demande des irrigants PRO de l'antenne Meymans - réseau Hostun-Jaillans	Mail

Information par le site Web du SID des dates de mise en service des réseaux

Information par le site Web du SID et par SMS des dates de mise hors services des réseaux

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

7. LES PROJETS DU TERRITOIRE

L'étude prospective canal de la Bourne (disponible sur demande auprès des services techniques du SID) définit pour le territoire Bourne-Valentinois les orientations d'aménagement et l'adaptation des réseaux d'irrigation à l'horizon 2050 afin de participer à l'adaptation du territoire au changement climatique et à la résilience du monde agricole.

Une partie des recommandations de cette étude a été reprise dans le plan pluriannuel d'investissements du SID à l'échéance 10 ans.

Les principales opérations sont citées ci-après.



7.1. LE BARRAGE D'AUBERIVES EN ROYANS

7.1.1 AVP RENOVATION ET ADAPTATION REGLEMENTAIRE

Objectifs :

- Mise en conformité réglementaire : Amélioration de la régulation du débit réservé
- Mise en conformité réglementaire : Amélioration de la mesure du débit réservé
- Amélioration des outils de gestion des chasses sédimentaires
- Amélioration des outils de gestion des crues

Travaux d'aménagements:

- Créer un **dispositif de batardage** pour isoler totalement une galerie. Le seul batardeau actuel sera remplacé au profit de 3 équipements installés depuis un engin de levage sur la plateforme supérieure RD ou RG et qui viendraient s'insérer dans des rainures fixées sur le parement amont de la galerie. Le dispositif de mise en équipression permettrait d'éviter de faire appel à une équipe de scaphandrier à la pose et à la dépose.
- Créer un **dispositif de protection contre les embâcles**. Ce dispositif formant une cage positionnée à l'amont de chaque pertuis permettant de bloquer les plus gros embâcles.
- **Remplacer les 6 vannes de vidange**. Le principe de vanne wagon avec étanchéité amont et galets de roulement aval est conservé mais leur motorisation hydraulique est remplacée par une motorisation électrique à crémaillère positionné au niveau de la plateforme supérieure en extérieur et ainsi libérer les locaux enterrés qui pourront être condamnés et créer une chambre

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

de maintenance des vannes. L'ensemble du contrôle commande et des alimentations électriques sont conservées.

- **Rénover les galerie RD et RG** comprenant des opérations de chemisage, blindage, injection, drainage pour la galerie RG et le soutènement du talus pour la galerie RD.
- **Rénover la fosse de dissipation** en aval du barrage avec le reprofilage des murets de séparation, le blindage de protection contre l'érosion des fosses, la reprise du coursier aval et l'enrochement du lit de la rivière dans les parties érodées.
- **Rénover le GC de la passe à poissons** et reconstruire l'entrée de la passe et permettre la montaison des poissons.
- **Condamner l'accès aux locaux enterrés en RD et RG.** Leur maintien en air est important pour ne pas impacter la tenue des galeries et permet une circulation d'air dans les galeries mais elles n'auront plus d'utilité. Tous les équipements fonctionnels aujourd'hui seront déposés. Seuls les équipements anciens seront conservés. Les planchers non sécurisés seront déposés.
- **Mettre en sécurité l'exploitation du barrage en déposant la passerelle** située sur la crête et en installant une passerelle d'accès en sortie de galerie RG sans avoir à passer au pied du barrage. Cette opération nécessite la modification du dispositif de suivi topographique existant.
- **Rénover et améliorer les drains du barrage** afin de permettre un meilleur suivi et assurer la sécurité des intervenants.
- **Installer des dispositifs de mesure de débit** au niveau de la passe à poissons, du canal de la Lyonne et du dispositif de restitution du débit réservé.
- **Mettre en place des postes de mesure en continu de la qualité des eaux** destinés à gérer les chasses sédimentaires.

Coût de l'opération:

- **Estimation: 6 805 000€ H.T. (valeur 2023)**

Etat d'avancement:

- En attente de des possibilités d'investissement au-delà de la fin de la concession « Canal de la Bourne »

7.2. CANAL DE LA LYONNE

7.2.1 FRANCHISSABILITE DU SEUIL DE LA PRISE D'EAU

Etude réalisée par le bureau d'études SAGE ENVIRONNEMENT en collaboration avec le SYMBHI sous Maîtrise d'ouvrage SYMBHI.

Objectifs :

Continuité écologique au seuil de la prise d'eau du canal de la Lyonne

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

Travaux d'aménagement:

- Création d'un ouvrage permettant la montaison et la dévalaison

Coût de l'opération:

- **Estimation: 283 739 € H.T.**

Etat d'avancement:

- Dossier géré par le SYMBHI en attente des autorisations environnementales

7.3. LE CANAL DE LA BOURNE

7.3.1 MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Objectifs :

Renforcement de la sécurité des riverains (biens et personnes) du canal de la Bourne Mise en conformité réglementaire (Débit réservé – continuité écologique, continuité sédimentaire, sécurité publique)

Travaux d'aménagements:

- Création de 2 ouvrages délestage sur le canal de la Bourne
- Creation de 3 déversoirs de débordement

Coût de l'opération:

- **Estimation: 2 622 000 € H.T. (Valeur 2021)**

Etat d'avancement:

- En attente des autorisations administratives

7.3.2 CONFORTEMENT DES TUNNELS

Objectifs :

- Renforcement de la stabilité des tunnels (Barmier – Falaises – Les Allemands – Manne)

Travaux d'aménagements:

- Tunnel Barmier : Chemisage intérieur complet à faire
- Autres ouvrages : en cours d'étude

Coût de l'opération:

- **Estimation : Barmier 1 779 000 € H.T. (Valeur 2023)**

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- Autres ouvrages : non évalué

Etat d'avancement :

- Tunnel Barmier : Projet non approuvé – impact sur la débitance du canal
- Autre ouvrage : projet à établir

7.3.3 RENOVATION CANAL ET CANAUX SECONDAIRES

Objectifs :

- Réfection du revêtement d'étanchéité des canaux (revêtement béton)
- Economie d'eau
- Stabilité des ouvrages => sécurité publique

Travaux d'aménagements:

- Réfection du revêtement d'étanchéité du canal et des canaux secondaires

Coût de l'opération:

- **Estimation: 400 000 €/an donc sur 20 ans 8 000 000 €**

Etat d'avancement:

- Validé – programme réalisé chaque année

7.4. RESEAUX SOUS PRESSION

7.4.2 RESEAUX PORTES - FONTAINE

Objectifs :

- Répondre aux demandes d'irrigation pour des non professionnels (communes de Portes lès Valence, Beaumont lès Valence) ainsi que pour des professionnels (terres agricoles du plateau de Clairac,
- Supprimer les prélèvements individuels notamment dans le ruisseau du Guimand (Bassin versant de la Véore en ZRE),
- Sécuriser les approvisionnements en eau vis-à-vis des prélèvements des stations de pompage de Fontaine et de Clairac,
- Optimiser la ressource disponible à la station de pompage de Chaffit,
- Résoudre le problème de vétuste de la station de pompage de Maret.

Travaux d'aménagements:

- Création d'un réservoir d'une capacité de sur le plateau de Clairac
- Création d'une station de reprise de 1 500 m³/h
- Suppression de la station de pompage de Maret
- Restructuration du réseau de distribution sur le plateau de Clairac

Coût des opérations:

- **Projet Portes les Valence : 5 900 000 € H.T.**

Etat d'avancement:

- En attente de financement et d'acquisition foncière

7.4.3 RESEAU SUD EST VALENTINOIS

Objectifs :

- Sécuriser l'approvisionnement du réseau de Beaumont Les Valence vis-à-vis de la disponibilité de la ressource du petit Chirac

Travaux d'aménagements:

- Renforcement du maillage entre le réseau du Sud Est Valentinois et le réseau de Beaumont les Valence

Coût des opérations:

- **Maillage SEV-Beaumont : 300 000 € - 500 000 € H.T.**

Etat d'avancement:

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

- En attente de l'évolution éventuelle de l'autorisation de prélèvement sur le pompage de « Petit Chirac »
- En attente de validation et financement

7.5. TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE NECESSAIRES

7.5.1 SUPPRESSION DES TRANSFORMATEURS AVEC PCB

En application du plan national d'élimination des appareils contenant du PCB/PCT publié le 17/04/2013 :

1. Tous les équipements contenant des niveaux importants de PCB (> 500 ppm) doivent être éliminés avant fin 2010
2. Tous les équipements contenant des niveaux non négligeables de PCB (entre 50 et 500 ppm) doivent être éliminés sur le calendrier suivant :
 - a. Avant fin 2017, si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976,
 - b. Avant fin 2020, si l'appareil a été fabriqué entre 1976 et 1980,
 - c. Avant fin 2023, si l'appareil a été fabriqué à partir de 1981.

A la date du 31/12/2019 : Urgence n°1 (> 500 ppm) :

- Transformateur de la station de pompage de Chabeuil (projet de renouvellement dans le cadre de la restructuration du réseau d'Alixan-Montelier-Chabeuil)
- 2 transformateurs de la station de pompage de Lilas (2 x 2500 Kva) -> en service mais un secours a été mis à disposition

A la date du 31/12/2020 : Urgence n°2 (entre 50 et 500 ppm) :

- 1 transformateur de la station de Meymans (800 Kva)

7.5.2 MISE EN CONFORMITE DES ARMOIRES ELECTRIQUES

Poursuite de la mise en conformité et sécurité des travailleurs des armoires électriques des stations de pompage selon les recommandations des organismes de contrôle (SOCOTEC).

7.5.3 PROTECTION ET SECURISATION DES STATIONS DE POMPAGE

Poursuite de la protection et sécurisation des stations de pompage par :

- La pose de dispositifs anti-intrusion
- La pose de clôtures
- La réalisation de bâtiments de couverture

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

8. DONNEES FINANCIERES

8.1. COMPABILITE ANALYTIQUE

8.1.1 FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement	BOURNE-VALENTINOIS
Energie et autres fluides	1 705 642,04
Entretien stations réseaux	396 633,51
Charges de personnel	625 776,53
Redevances et Taxes (foncier,VNF,SNCF,CFE,etc...)	63 909,76
Redevances Agence de l'eau	10 149,00
Assurances	-
Charges financières (intérêts emprunts)	7 661,10
Transfert investissements (Renouvellement - Rb emprunt)	1 638 676,86
Autres charges	186 709,62
Charges exceptionnelles	5 963,21
Transfert - Vente d'eau interne	
Frais généraux Antenne d'exploitation	74 815,89
Frais généraux siège	1 562 004,53
TOTAL	6 277 942,05
Recettes de fonctionnement	BOURNE-VALENTINOIS
Travaux en Régie	175 322,31
Amortissement subventions	106 603,17
Vente d'eau	4 862 645,96
Redevances agence de l'eau ou autres	234 640,37
Travaux et prestations facturés	61 785,73
Vente d'électricité	779 492,72
Reversement par les Fermiers	-
Energie réservée	274 392,88
Transfert - Vente d'eau interne	124 436,69
Divers	325 584,20
Produits exceptionnels	19 825,64
TOTAL	6 964 729,67
Résultat exercice	686 787,62

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 0,38% et les recettes de fonctionnement en baisse de 3,84% par rapport à l'année précédente. Malgré une recette de vente d'eau en hausse et un produit de vente d'hydroélectricité qui se maintient, les recettes baissent du fait de la baisse du produit de l'énergie réservée, en lien avec la baisse des prix du marché de l'électricité.

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55

8.1.2 INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	BOURNE-VALENTINOIS
Dépenses d'équipement	3 797 407,37
Amortissement des subventions	106 603,17
remboursement du capital de la dette	67 585,17
Quote-part dépenses antenne	-
Quote-part dépenses siège	66 842,57
TOTAL	4 038 438,28

Recettes d'investissement	BOURNE-VALENTINOIS
Participation des irrigants aux investissement sur réseaux	
Amortissements	1 638 676,86
Subventions	2 497 335,56
Autres recettes (indemnisation etc.)	
Quote-part recettes antenne	10 483,18
Quote-part recettes siège	53 676,61
TOTAL	4 200 172,21
Résultat exercice	161 733,94

Les dépenses d'investissement ont sensiblement augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente : 3,8 M€ HT contre 1,8 M€ l'exercice précédent. Parmi les opérations notables, la reprise de l'étanchéité de la réserve de Juanon, pour près de 400.000 €, la réfection du canal de la Bourne pour 1,6 M€, soit 1M € de plus qu'en 2024 et le paiement du solde des études Bourne et barrage.

8.2. IMPAYES

Les impayés au 31 janvier 2026 (hors facturation de la consommation 2025) s'élèvent à 255.763€. Malgré les efforts conjugués du Service de Gestion comptable Nord Drôme dans le recouvrement et du SID pour maintenir un prix de l'eau stable, nous constatons une forte progression des impayés depuis 2022, dans un contexte agricole marqué par plusieurs années de tension sur les revenus et les trésoreries.

Territoire	2022	2023	2024	2025 hors conso	Total général
Bourne Valentinois	12 465	54 775	103 991	84 533	255 763

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège Administratif : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55 - Fax : 04.75.58.87.55



8.3. ENDETTEMENT DU TERRITOIRE

Il reste deux emprunts en cours pour un capital restant dû au 31/12 de 517.290 €, dont l'un prendra fin en 2029 et l'autre en 2036.

9. URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS

Le Syndicat d'Irrigation Drômois souhaite attirer l'attention de tous ses membres sur les difficultés rencontrées dans la gestion du développement des constructions sur les communes. Les réseaux d'irrigation sont essentiellement implantés en terrain privé et ont été créés sans l'inscription des servitudes associées au service de la propriété foncière. Les propriétaires se sont engagés à informer leur successeur de la présence de la servitude lors de toute opération de vente. Malheureusement, cette démarche est rarement effectuée. Certains propriétaires ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître la présence d'une canalisation sous leur terrain. Cette situation a plusieurs conséquences notamment dans les zones urbanisées :

- Risque pour les riverains en cas de rupture de conduite : la pression d'un réseau d'irrigation est comprise **entre 10 et 25 bars !!!!**
- Difficultés d'intervention pour les équipes du SID pouvant entraîner une rupture de la continuité du service pendant plusieurs jours.
- Dégradations potentielles des équipements du SID en cas de terrassement par le propriétaire ou son prestataire

Nous demandons donc aux communes :

- de bien vouloir signaler la présence des canalisations d'irrigation lors de tout document urbanisme (certificat d'urbanisme – déclaration de travaux – permis de construire – permis de lotir – permis d'aménager etc...). Seule la concertation amont avec les porteurs de projet permettra au SID d'étudier des solutions techniques et économiques permettant de rendre les projets compatibles avec la présence des réseaux d'irrigation
- de ne pas classer constructible les parcelles avec une canalisation d'irrigation sans concertation au préalable avec le SID
- de rappeler à tous les porteurs de projet la nécessité de faire les démarches **obligatoires** de DT : déclaration de projet de travaux (à faire par le Maître d'ouvrage) et DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux (à faire par l'entreprise de terrassement) auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) : fichier regroupant les plans des réseaux de tous les gestionnaires y compris le SID. Cette démarche doit être faite également en terrain privé.

Nous souhaitons également attirer l'attention des communes sur les points suivants :

- le SID n'a pas les moyens de régulariser les servitudes liées à ses canalisations
- le SID n'a pas les moyens financiers de prendre seul en charge les déplacements de conduite

Nous comptons sur la vigilance de tous et notamment des communes pour éviter les situations que nous avons connues ces dernières années notamment sur les communes d'Etoile sur Rhône – Upie – Montélimar - Alixan etc...

10. ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

10.1 TRAVAUX SUR LE BARRAGE ET LES USINES DE PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

Opérations achevées au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

Opérations en cours au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

10.2 TRAVAUX SUR LES CANAUX

Opérations achevées au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

Opérations en cours au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

10.3 TRAVAUX SUR LES RESEAUX

Opérations achevées au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

Opérations en cours au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

10.4 TRAVAUX SUR LES STATIONS DE POMPAGE

Opérations achevées au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID

Opérations en cours au 30/11/2025

Disponible sur demande auprès des services techniques du SID
