



TERRITOIRE DE L'HERMITAGE

Réseaux de Larnage et de Serves-Erôme-Gervans

Année 2025

Rapport d'activité

1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE DE L'HERMITAGE	4
1.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE	4
1.2 GESTION DES RESEAUX	4
1.2.1 Réseau de Larnage	4
1.2.2 Réseau de Serves Erôme Gervans	4
1.3 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS	5
1.3.1 Réseau de Larnage	5
1.3.1 Réseau de Serves – Erôme - Gervans	5
2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025	7
2.1 ORIGINE DE L'EAU	7
2.2 VENTE D'EAU.....	7
2.3 RENDEMENTS DES RESEAUX.....	9
2.4 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES	9
3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES.....	10
3.1 SECURITE PUBLIQUE	10
3.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE	10
3.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION.....	10
3.4 CONTROLE APPAREILS DE LEVAGE	10
4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025.....	11
4.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT	11
4.1.1 Objectifs	11
4.1.2 Travaux de renforcement ou de renouvellement	11
4.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE	11
4.3 TRAVAUX FACTURES	12
4.4 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025	12
5- GESTION CLIENTELE.....	13

5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU.....	13
5.1.1 Tarification Agence de l'eau.....	13
5.1.2 Tarification pour les non professionnels.....	13
5.1.3 Tarification pour les professionnels.....	13
5.2 RELATIONS CLIENTS	14
5.2.1 Continuité de service	14
5.2.2 Information des irrigants	15
5.2.3 Divers	16
6- LES PROJETS DU TERRITOIRE.....	17
6.1 RESEAU LARNAGE	17
6.2 RESEAU SERVES EROME GERVANS	17
7- DONNEES FINANCIERES	18
7.1 COMPABILITE ANALYTIQUE	18
7.1.1. Fonctionnement.....	18
7.1.2 Investissement	18
7.2 IMPAYES.....	19
7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE	19
8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS	20
9- ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET de MAINTENANCE	21

1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE DE L'HERMITAGE

1.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE

Communes concernées : Chantemerle Les Blés – Crozes Hermitage – Erôme – Gervans – Larnage – Mercuroi-Veaunes – Serves sur Rhône

1.2 GESTION DES RESEAUX

1.2.1 RESEAU DE LARNAGE

Le réseau du territoire de Larnage était géré par la société VEOLIA : contrat de délégation de service public du 01/01/2016 – date de fin de contrat 31/12/2027.

D'un commun accord entre le délégant (Syndicat d'Irrigation Drômois) et le délégataire (VEOLIA), il a été mis fin à ce contrat le 31/12/2021 : protocole de fin de contrat anticipé du 09/12/2021.

La régie d'exploitation du Syndicat d'Irrigation Drômois a repris à partir de la saison 2022 la gestion de ce réseau.

1.2.2 RESEAU DE SERVES EROME GERVANS

Le réseau du territoire de Serves-Erôme-Gervans est géré par la société SAUR : contrat de délégation de service public du 01/04/2010 – date de fin de contrat 31/03/2022.

D'un commun accord entre le délégant (Syndicat d'irrigation Drômois) et le délégataire (SAUR), il a mis fin à ce contrat le 28/02/2022 : Avenant n°2 du 09/12/2021.

La régie d'exploitation du Syndicat d'Irrigation Drômois a repris à partir de la saison 2022 la gestion de ce réseau.

1.3 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

1.3.1 RESEAU DE LARNAGE

Station de pompage des Iles

Pompage dans la nappe alluviale du Rhône (4 puits)

Equipements :

- 4 pompes verticales à ligne d'arbre de 285 m³/h à 240 m HMT (moteur 315 Kw)

Capacité de pompage 1 140 m³/h à 240 m HMT

Refoulement vers le réservoir de Brouas et le réseau Bas service

Nota : le Puits n°1 n'a pas une capacité de 285 m³/h. Il n'est utilisé qu'en secours

Réservoir de Brouas:

Réservoir de 300 m³

Station de reprise de Brouas:

Aspiration dans le réservoir de Brouas

Refoulement direct sur le réseau de distribution Haut service

- 2 pompes 40 m³/h à 135 m HMT (moteur de 30 Kw)
- 4 pompes 130 m³/h à 135 m HMT (moteur de 90 Kw)

Capacité de pompage de 520 m³/h, à 135 m HMT

Réseau de distribution : 39.6 Km de conduite essentiellement en fonte : Dn 80 à 450 mm


1.3.1 RESEAU DE SERVES – EROME - GERVANS

Station de pompage de Richardin

Prise d'eau dans le canal de dérivation du Rhône

Equipements :

- Filtre Perrier
- 4 pompes horizontales de 100 m³/h à 70 m HMT



Capacité de pompage 400 m³/h à 70 m HMT

Puissance souscrite : 85 Kw

Refoulement- Distribution vers le réservoir principal

Réservoir :

Réservoir de 200 m³

Asservissement du fonctionnement de la station pompage au niveau du réservoir via une ligne pilote enterrée.

Réseau de distribution : 16.44 Km de conduite Dn 60 à 200 mm en fonte essentiellement (94%)

2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025

2.1 ORIGINE DE L'EAU

L'eau distribuée sur le territoire provient :

- De la nappe d'accompagnement du Rhône pour le réseau de Larnage,
- Directement du Rhône pour le réseau de Serves-Erôme-Gervans.

Ressources	Station de pompage	Volume annuel prélevé (m3)	Volume étiage prélevé (m3)	volume annuel autorisés (m3) (*)	Volume étiage autorisés (m3) (*)
Rhône	Richardin	121 965	78 133	261 000	127 810
Nappe du Rhône	Les Iles	619 711	406 812	1 503 000	824 815
Total Rhône		741 676	484 945	1 764 000	952 625
(1) Arrêté de régularisation des prises d'eau dans le Rhône DDT-SEF-2025-01068 du 16/07/2025 géré par la DREAL					
(2) Etiage : mois de juin-juillet-Aout-Septembre pour bassin versant du Rhône					


2.2 VENTE D'EAU

PROFESSIONNELS								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrit s par ha	Conso annuelle par ha
SEG	855	105	80 357	80 357	85	20	8,11	762
Larnage	3 026	429	463 781	463 781	227	98	7,05	1 081
Total	3 881	534	544 138	544 138	312	118		
COLLECTIVITES								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrit s par ha	Conso annuelle par ha
SEG	15	2	26	26	2	2	7,50	13
Larnage	5	2	7 780	7 780	1	1	3,33	5 187
Total	20	4	7 806	7 806	3	3		

NON PROFESSIONNELS								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrit s par ab	Conso annuell e par ab	Facturati on annuelle par ab
SEG	170	2 519	2 519	33	33	5,15	76	76
Larnage	0	0	0	0	0			
Total	170	2 519	2 519	33	33			

TOTAL						
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients
SEG	1 040	107	82 902	82 902	120	55
Larnage	3 031	430	471 561	471 561	228	99
Total	4 071	538	554 463	554 463	348	154

Synthèse par type de consommateurs				
Type	nombre de bornes	nombre de clients	conso (m3)	Facturation (m3)
PRO	312	118	544 138	544 138
COLLECTIVITES	3	3	7 806	7 806
NON PRO	33	33	2 519	2 519
Total	348	154	554 463	554 463

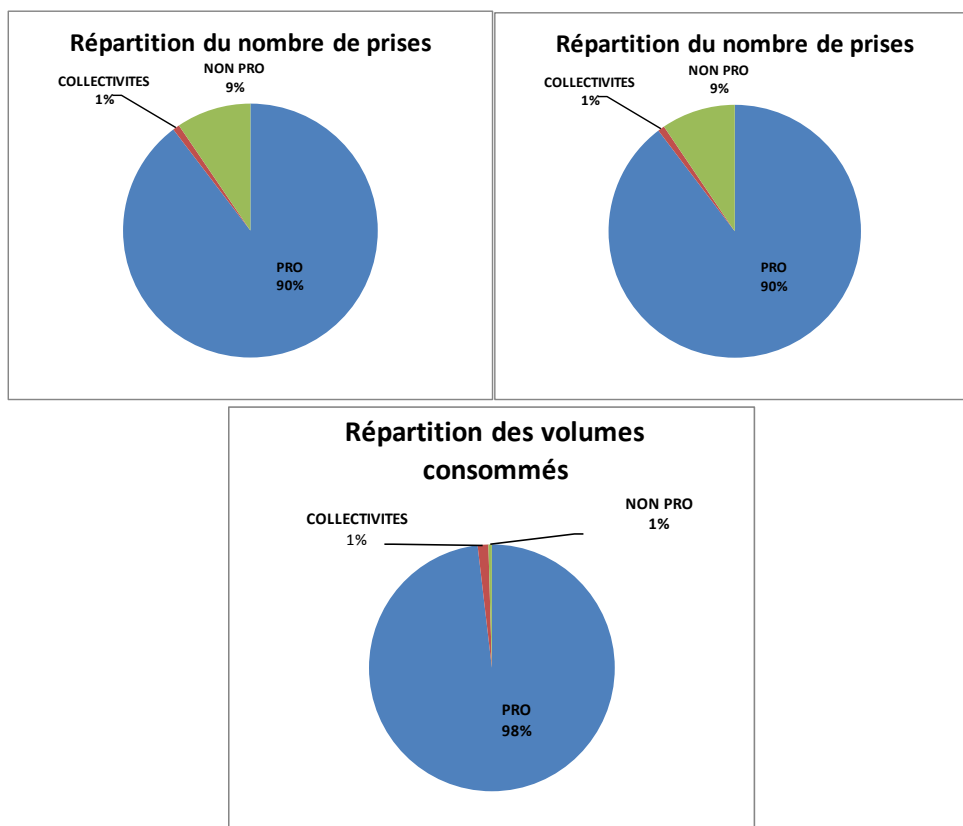

2.3 RENDEMENTS DES RESEAUX

Le rendement correspond au rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers et le volume d'eau prélevé et introduit dans le réseau de distribution.

Réseaux	Rendement
Réseau SEG	67,97%
Réseau Larnage	76,09%

2.4 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Réseau de Larnage

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,765
Kwh/m3 prélevé	2,046
€/m3 consommé	0,138
€/Kwh	0,078

Réseau de serves Erôme Gervans

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	0,492
Kwh/m3 prélevé	0,335
€/m3 consommé	0,063
€/Kwh	0,128

3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

3.1 SECURITE PUBLIQUE

Néant : aucun ouvrage n'est soumis à la réglementation « sécurité publique des ouvrages hydrauliques » sur ce territoire.

3.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE

Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Larnage				
Sites	Observations	Conventions	Visite précédente	Visite suivante
Brouas	Crozes Hermitage	ACRITEC	29 novembre 2023	2026
Les Iles	Gervans	ACRITEC	29 novembre 2023	2026

Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Serves-Erôme				
Sites	Observations	Conventions	Visite précédente	Visite suivante
Richardin	Erome	ACRITEC	29 novembre 2023	2026

3.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION

Date	Appareil	Volume – Pression de service	Type d’inspection	Non-conformité	Organisme inspecteur
Station de pompage des Iles					
11/2020	Charlatte n°2500SH69	2 500 l – 30 b	Requalification décennale	Néant	APAVE
01/2025			Inspection avec ouverture	Néant	SOCOTEC
Surpresseur de Brouas					
03/2019	Charlatte n°5000SH93	5 000 l – 18 b	Requalification décennale	Néant	APAVE
11/2024			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage des Richardins					
	nc				

3.4 CONTROLE APPAREILS DE LEVAGE

Néant

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELLIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025

4.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT

4.1.1 OBJECTIFS

Classés par ordre de priorité

- 1/ Organes hors service à la suite de la saison précédente
- 2/ Organes dont l'état ou le niveau d'usure laisse craindre une rupture à court terme 1,2 ou 3 ans
- 3/ Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation sécurité des travailleurs
- 4/ Amélioration des performances énergétiques
- 5/ Dégradations de caractéristiques techniques
- 6/ Amélioration de la facilité d'exploitation d'un ouvrage
- 7/ Mise en conformité vis-à-vis des exigences techniques de tiers (ENEDIS, agence de l'eau etc...)
- 8/ Amélioration de la fiabilité de fonctionnement de l'ouvrage
- 9/ Lutte contre les risques d'intrusions, de dégradations, sécurité des riverains
- 10/ Amélioration des fonctionnalités de report d'information et de suivi
- 11/Réduction des nuisances à des tiers (bruits etc...)

4.1.2 TRAVAUX DE RENFORCEMENT OU DE RENOUVELLEMENT

Opérations achevées au 30/11/2025

Ouvrages	OBJET	n° PROJET AT	Planificatio
SP des Iles	Groupe G1 : Rénovation pompe	PR 24 09 0007	Fait 2025
SP des Iles	Groupe G2 : Mise en place d'un stab pour remplissage	PR 25 01 0001	fait 2025
SP des Iles	Groupe G2 : Rénovation pompe	PR 24 09 0008	fait 2025
SP des Iles	Renouvellement automatisme et report supervision	PR 24 11 0002	fait 2025
Tous réseaux	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) - prog 2024/2025	PR 24 11 0014	fait 2025

Opérations en cours au 30/11/2025

Ouvrages	OBJET	n° PROJET AT	Planificatio
SP Richardin	Renouvellement automatisme et report supervision	PR 24 11 0001	2025/2026
Tous réseaux	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) - prog 2025/2026	PR 25 10 0026	2025/2026

Les charges correspondantes sont imputées au budget « investissement » du SID.

4.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE

Les principales interventions réalisées en 2025 au titre des travaux d'entretien et de maintenance sont fournies en annexe.

Les charges correspondantes sont imputées au budget « fonctionnement » du SID.

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

4.3 TRAVAUX FACTURES

Désignation	Nb
Fourniture et pose compteur (1 - 3 - 5 m3/h)	0
Réparation borne endommagée par tiers	0
Réparation conduite endommagée par tiers	0
Modification d'un borne existante (modif débit)	0
Création branchement sur réseau gravitaire	0
Création branchement sur réseau pression	0
Création borne ou sortie sur borne existante	4
Déplacement borne	0
Déplacement sortie borne	0
Extension de réseau	0
Déplacement non justifié d'un agent	0
Remise en conformité de borne	0
Remise en conformité d'un branchement ou poste de comptage	0
Renouvellement compteur	0
Repose compteur suite à impayés	0
Participation au déplacement d'une conduite	0

4.4 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025

Néant.

5- GESTION CLIENTELE

5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU

5.1.1 TARIFICATION AGENCE DE L'EAU

Pour la saison 2025, la facturation de la redevance agence de l'eau uniformisée au SID fixée par délibération du 28 janvier 2025 est de 0,009 € H.T. /m³ consommé et 14.45 € H.T. par l/s pour les abonnements gravitaires.

5.1.2 TARIFICATION POUR LES NON PROFESSIONNELS

Le prix de vente pour les particuliers est uniformisé sur l'ensemble du territoire du SID.

Les tarifs du service sont fixés par la délibération du 28 janvier 2025.

- Une prime fixe en fonction du débit souscrit

1 m ³ /h	75,45 € HT	79,60 € TTC
3 m ³ /h	97,97 € HT	103,36 € TTC
5 m ³ /h	129,33 € HT	136,44 € TTC
10 m ³ /h	215,54 € HT	227,39 € TTC
15 m ³ /h	368,00 € HT	388,24 € TTC
20 m ³ /h	525,72 € HT	554,63 € TTC
30 m ³ /h	683,43 € HT	721,02 € TTC

- Un tarif de 0,17 €/m³ HT par m³ consommés

- Un tarif de 0,01 €/m³ HT par m³ consommés pour surcoût énergie

5.1.3 TARIFICATION POUR LES PROFESSIONNELS

Le tarif professionnel n'est accordé qu'aux irrigants pouvant justifier d'un numéro SIRET en lien avec le titulaire du contrat d'abonnement.

Pour la saison 2025, le prix de vente sur le territoire de Drôme Nord a été fixé à (délibération du 28 janvier 2025) :

Réseau de Larnage

Part fixe

Abonnement à la surface ha 116.13 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 12.94 € H.T.

Part au m³ 0,1497 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture moyenne de 712.81 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha).

Réseau de Servas Erôme Gervans

Part fixe

Abonnement à la surface ha 79.18 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 13.20 € H.T.

Part au m³ 0,0824 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture moyenne de 475.78 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha).

Malgré l'inflation et la forte augmentation des prix des fourniture, le comité syndicat du SID a choisi de ne pas faire évoluer le prix du service pour les irrigants professionnels

5.2 RELATIONS CLIENTS

5.2.1 CONTINUITE DE SERVICE

Mise en service et arrêt des réseaux :

Mise en service	Réseau	Arrêt
06-mars	Réseau Serves Erôme Gervans	20-oct
17-mars	Réseau Larnage BS	27-oct
nc	Réseau Larnage HS	nc

Problème de ressources

Néant

Problèmes de capacité de pompage par rapport à la demande

Néant

Problèmes de fonctionnement d'ouvrages

- *Coupures d'alimentation électrique (ENEDIS) :*

Date	Ouvrage	Durée	Type
17-mars	Surpresseur BROUAS	0h05	non programmée

- *Incidents de fonctionnement :*

Néant


5.2.2 INFORMATION DES IRRIGANTS

Date	Evénement	Mode diffusion
13-févr	Réunion annuelle des irrigants du territoire	réunion à Larnage
05-mai	Chasses sédimentaires sur le Rhône => risque hausse turbidité => demande de réduction des consommations	Mail
11-juin	Info Problème de transmission des factures des irrigants PRO de la part du Trésor public	Mail

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr



5.2.3 DIVERS

Néant

6- LES PROJETS DU TERRITOIRE

6.1 RESEAU LARNAGE

Amélioration de la desserte sur le réseau Haut service en augmentant la capacité du réservoir de Brouas et en renforçant le réseau de distribution

Réhabilitation - Reconstruction ou limitation du débit du puit n°4 (remontée de sable)

6.2 RESEAU SERVES EROME GERVANS

Maillage de secours avec le réseau de Larnage

Nota : Ces projets n'ont pas été approuvés au 31/12/2025 par les élus du territoire

7- DONNEES FINANCIERES

7.1 COMPABILITE ANALYTIQUE

7.1.1. FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	HERMITAGE
Travaux en Régie	47 608,77
Amortissement subventions	-
Vente d'eau	237 203,70
Redevances agence de l'eau ou autres	8 398,22
Travaux et prestations facturés	6 716,76
Reversement par les Fermiers	27 500,00
Energie réservée	15 106,75
Divers	17 190,06
Produits exceptionnels	-
TOTAL	359 724,26
Résultat exercice	2 506,68

Le budget est équilibré, mais le léger excédent dégagé, en baisse par rapport à celui de 2024 qui s'élevait à 22.993 €, ne permet pas de couvrir le déficit d'investissement.

7.1.2 INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	HERMITAGE
Dépenses d'équipement	126 107,81
Amortissement des subventions	-
Quote-part dépenses antenne	2 543,27
Quote-part dépenses siège	3 680,03
TOTAL	132 331,11

Recettes d'investissement	HERMITAGE
Participation des irrigants aux investissement sur réseaux	
Amortissements	77 648,28
Subventions	-
Quote-part recettes antenne	1 688,74
Quote-part recettes siège	2 955,18
TOTAL	82 292,19
Résultat exercice	- 50 038,92

Les investissements 2025 sont en augmentation de près de 60% par rapport à 2024. Près de 47.000 € supplémentaires ont été investis en 2025, avec des travaux importants sur la station des Iles.

7.2 IMPAYES

Territoire	2022	2023	2024	2025 hors conso	Total général
Hermitage		36	0	3 140	3 176

Les impayés sont particulièrement faibles sur le territoire.

7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE

Néant

8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS

Pour RAPPEL : Le Syndicat d'Irrigation Drômois souhaite attirer l'attention de tous ces membres sur les difficultés rencontrées dans la gestion du développement des constructions sur les communes. Les réseaux d'irrigation sont essentiellement implantés en terrain privé et ont été créés sans l'inscription des servitudes associées au service de la propriété foncière. Les propriétaires se sont engagés à informer leur successeur de la présence de la servitude lors de toute opération de vente. Malheureusement, cette démarche est rarement effectuée. Certains propriétaires ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître la présence d'une canalisation sous leur terrain. Cette situation a plusieurs conséquences notamment dans les zones urbanisées :

- Risque pour les riverains en cas de rupture de conduite : la pression d'un réseau d'irrigation est comprise entre 10 et 25 bars !!!!
- Difficultés d'intervention pour les équipes du SID pouvant entraîner une rupture de la continuité du service pendant plusieurs jours.
- Dégradations potentielles des équipements du SID en cas de terrassement par le propriétaire ou son prestataire

Nous demandons donc aux communes :

- De bien vouloir signaler la présence des canalisations d'irrigation lors de tout document urbanisme (certificat d'urbanisme – déclaration de travaux – permis de construire – permis de lotir – permis d'aménager etc...). Seule la concertation amont avec les porteurs de projet permettra au SID d'étudier des solutions techniques et économiques permettant de rendre les projets compatibles avec la présence des réseaux d'irrigation
- De ne pas classer constructible les parcelles avec une canalisation d'irrigation sans concertation au préalable avec le SID
- De rappeler à tous les porteurs de projet la nécessité de faire les démarches **obligatoires** de DT : déclaration de projet de travaux (à faire par le Maître d'ouvrage) et DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux (à faire par l'entreprise de terrassement) auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) : fichier regroupant les plans des réseaux de tous les gestionnaires y compris le SID. Cette démarche doit être faite également en terrain privé.

Nous souhaitons également attirer l'attention des communes sur les points suivants :

- Le SID n'a pas les moyens de régulariser les servitudes liées à ses canalisations
- Le SID n'a pas les moyens financiers de prendre seul en charge les déplacements de conduite

Nous comptons sur la vigilance de tous et notamment des communes pour éviter les situations que nous avons connues ces dernières années notamment sur les communes d'Etoile sur Rhône – Upie – Montélimar.

9- ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Interventions achevées au 30/11/2025

Intervention	Equipement - Réseaux	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25050001	RESEAU LARNAGE	Réparation vanne de vidange	SERVICE EXPLOITATION	Réparation vanne de vidange	Clôturé	
INT25050022	RESEAU LARNAGE	RESEAU REPARATION DE FUITE	SERVICE EXPLOITATION	RESEAU REPARATION DE FUITE mois de mai	Clôturé	MERCUROL
INT25070060	RESEAU LARNAGE	création d'une borne	SERVICE EXPLOITATION	création d'une borne	Clôturé	larnage

Intervention	Equipement - Ouvrages	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25030014	REVERVOIR SEG	Netoyage curage	SERVICE EXPLOITATION	Netoyage curage	Clôturé	
INT25060068	REVERVOIR SEG	Changement panneau solaire	SERVICE EXPLOITATION	Changement panneau solaire	Clôturé	
INT25090102	STATION BROUAS	DEPLACEMENT DE LA VOIRIE D'ACCES A LA STATION DE BROUAS RESEAU DE LARNAGE	SERVICE EXPLOITATION	DEPLACEMENT DE LA VOIRIE D'ACCES A LA STATION DE BROUAS RESEAU DE LARNAGE	Clôturé	MESJEAN
INT24100027	STATION BROUAS/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION	Inspection sans ouverture (2 ans)	SERVICE MAINTENANCE	Inspection sans ouverture (2 ans)	Clôturé	
INT25010004	STATION LES ILES/ELECTROPOMPES/G2/MOTEUR	Révision moteur P2 315 kW	SERVICE MAINTENANCE	Révision moteur P2 315 kW	Clôturé	
INT24100043	STATION LES ILES/ELECTROPOMPES/G3/POMPE	Boîte à roulements	SERVICE MAINTENANCE	Après recherche historique Le 21/06/2018 Pompe neuve > Mise en service par PEME Le 03/07/2025 > Contrôle vibration roulements > OK	Clôturé	
INT24110020	STATION LES ILES/FORAGE/Forage N°2	Inspection et réparation forage	SERVICE MAINTENANCE	30/05/2024 : Inspection et réparation forage > Visite caméra > Forage percé suite à fuite sur conduite de refoulement P2. 04/06/2024 : Curage du forage 17/02/2025 : Réfection forage par cimentation	Clôturé	
INT24110022	STATION LES ILES/FORAGE/Forage N°4	Visite d'inspection à la caméra.	SERVICE MAINTENANCE	29/10/2024 Recherche fuite de graviers + état général du forage	Clôturé	
INT24100030	STATION LES ILES/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION	Inspection avec ouverture (4 ans)	SERVICE MAINTENANCE	Inspection avec ouverture (4 ans)	Clôturé	
INT25020001	STATION RICHARDIN	Sondage pour localisation de la conduite d'adduction	SERVICE EXPLOITATION	Entre la prise d'eau et la station de pompage	Clôturé	Conduite d'adduction
INT25010020	STATION RICHARDIN	élagage des haies + arbres	SERVICE EXPLOITATION	élagage des haies + arbres	Clôturé	
INT25030025	STATION RICHARDIN	curage de bassin station erome	SERVICE EXPLOITATION	curage de bassin	Clôturé	
INT25080032	STATION RICHARDIN/DEGRILLEUR	Changement sangle dégrilleur	SERVICE EXPLOITATION	Changement sangle dégrilleur	Clôturé	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Interventions en cours au 30/11/2025

Intervention	Equipement	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25120023	STATION LES ILES/BT	SUITE Foudre - Remplacement de la carte 4-20mA défectueuse	PROJET AUTOMATISME	La carte 4-20mA a une entrée analogique détruite. Foudre par la sonde piezo réservoir Il faut remplacer la carte.	En cours	LES ILES
INT25090078	STATION RICHARDIN/ELECTROPOMPES/G4	Châssis en acier part en mille feuilles	SERVICE MAINTENANCE	Refaire un châssis complet Le 27/10/2025 Dépose moteur + pompe	En cours	
INT25100085	STATION RICHARDIN/ELECTROPOMPES/G4/MOTEUR	Contrôle et entretien moteur 30 kW	SERVICE MAINTENANCE	Contrôle et entretien moteur 30 kW (200 Mohms)	En cours	
INT25090077	STATION RICHARDIN/ELECTROPOMPES/G4/POMPE	Les roulements CA et COA vibration importante	SERVICE MAINTENANCE	Remplacement des roulements	En cours	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr
