



## **TERRITOIRE VAL DE DROME**

**RESEAUX : CREST NORD - CREST SUD - ALLEX MONTISON –  
LORIOU/CLIOUSCLAT - GRÂNE**

**Année 2025**

**Rapport d'activité**

## SOMMAIRE

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1- CONTEXTE GENERAL.....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>2- FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2025.....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>3- PRESENTATION GENERALE DU VAL DE DROME .....</b>              | <b>6</b>  |
| 3.1. PERIMETRE DU TERRITOIRE.....                                  | 6         |
| 3.2. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS.....                    | 6         |
| 3.2.1 Schéma des réseaux.....                                      | 6         |
| 3.2.2 Réseaux de Crest Nord Bas service et d'Allex-Montoison ..... | 7         |
| 3.2.3 Réseaux de Crest nord haut service .....                     | 9         |
| 3.2.4 Réseaux de Crest sud .....                                   | 9         |
| 3.2.5 Réseaux de Loriol - Clionsclat.....                          | 10        |
| <b>4- AUTORISATIONS DE PRELEVEMENTS .....</b>                      | <b>11</b> |
| 4.1. REGLEMENTATION DEBIT RESERVE.....                             | 11        |
| 4.2. REGLEMENTATION VOLUMES PRELEVABLES .....                      | 11        |
| <b>5- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025 .....</b>                       | <b>12</b> |
| 5.1. ORIGINE DE L'EAU .....                                        | 12        |
| 5.2. VENTE D'EAU .....                                             | 13        |
| 5.3. RENDEMENTS DES RESEAUX .....                                  | 15        |
| 5.4. CONSOMMATION ENERGETIQUE.....                                 | 15        |
| 5.4.1 Allex-Montoison Crest Nord Bas Service.....                  | 15        |
| 5.4.2 Crest Nord haut service.....                                 | 15        |
| 5.4.3 Crest Sud : Réseau principal.....                            | 16        |
| 5.4.4 Loriol/Clionsclat .....                                      | 16        |
| 5.4.5 Crest Sud : Réseau Grâne .....                               | 16        |
| <b>6. SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES.....</b>                     | <b>17</b> |
| 6.1 SECURITE PUBLIQUE .....                                        | 17        |
| 6.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE .....                           | 17        |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS PRESSION .....                                       | 18        |
| 6.4 CONTROLE CONFORMITE DISPOSITIFS DE LEVAGE .....                                       | 19        |
| <b>7. TRAVAUX DE L'ANNEE 2025.....</b>                                                    | <b>20</b> |
| 7.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT.....                                     | 20        |
| 7.1.1 Objectifs .....                                                                     | 20        |
| 7.1.2 Travaux réalisés ou en cours .....                                                  | 20        |
| 7.2 PRINCIPAUX TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN .....                                | 21        |
| 7.3 TRAVAUX FACTURES .....                                                                | 22        |
| 7.4 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025 .....                               | 22        |
| <b>8. GESTION CLIENTELE.....</b>                                                          | <b>23</b> |
| 8.1 PRIX DU SERVICE .....                                                                 | 23        |
| 8.1.1 Tarification Agence de l'eau .....                                                  | 23        |
| 8.1.2 Tarification pour les non professionnels .....                                      | 23        |
| 8.1.3 Tarification pour les professionnels .....                                          | 23        |
| 8.2 RELATIONS IRRIGANTS.....                                                              | 25        |
| 8.2.1 Continuité de service .....                                                         | 25        |
| 8.2.2 Informations des irrigants .....                                                    | 27        |
| 8.3 ARRETES RELATIFS A LA GESTION QUANTITATIVE DES EAUX DITS « Arrêtés SECHERESSE » ..... | 27        |
| <b>9. LES PROJETS Du TERRITOIRE .....</b>                                                 | <b>28</b> |
| 9.1 REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES .....                                           | 28        |
| 9.2 RECHERCHE DE SITES POUR STOCKAGE .....                                                | 28        |
| <b>10. DONNEES FINANCIERES .....</b>                                                      | <b>29</b> |
| 10.1 COMPTABILITE ANALYTIQUE .....                                                        | 29        |
| 10.1.1. Fonctionnement.....                                                               | 29        |
| 10.1.2 Investissement .....                                                               | 30        |
| 10.2 IMPAYES.....                                                                         | 30        |
| 10.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE .....                                                      | 30        |
| <b>11. URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS .....</b>                        | <b>31</b> |
| <b>12. ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE .....</b>         | <b>32</b> |



## 1- CONTEXTE GENERAL

Les réseaux d'irrigation du Territoire « Val de Drôme » sont implantés, à l'exception du réseau de Loriol/Clionsclat » dans le bassin versant de la rivière Drôme.

Le bassin versant de la rivière Drôme est classé en zone de Répartition des Eaux (ZRE). Un Organisme Unique de Gestion Collectif des prélèvements à usage agricole (OUGC) a été mis en place et est géré depuis 2021 par la Chambre d'agriculture de la Drôme.

L'autorisation Unique de Prélèvement (AUP) a été délivrée le 07 juillet 2017 pour une durée de 10 ans.

Les prélèvements dans les eaux superficielles sont également assujettis au respect de la réglementation des débits réservés. Ce point concerne les prélèvements au seuil SMARD. (Arrêté préfectoral du 20/06/2019). Le prélèvement superficiel au seuil des Pues a été définitivement fermé.

## 2- FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2025

Conformément aux arrêtés de modulation du débit réservé au seuil SMARD (2019-06-20-003 et du 2021-07-16), l'alimentation du réseau de Crest Nord par la prise d'eau au seuil SMARD a été fermée le 1<sup>er</sup> juin.

Les conditions Hydrologiques de la rivière Drôme 2025 ont conduit, sur le réseau de Crest Sud, à la demande de mise en application du niveau 1 de restriction dès le 31 juillet et du niveau 2 le 06 Aout.

Parallèlement, il a été demandé aux irrigants des réseaux de Crest nord bas service et Allex-Montoison de modérer leur consommation afin de favoriser le transfert d'eau vers la réserve de Crest sud. Cette mesure a été très faiblement suivie et l'impact sur les transferts a été négligeable.

Dès le 13 août, il a été demandé à l'ensemble des irrigants non professionnels de la vallée de la Drôme de cesser toute irrigation à l'exception de l'arrosage des potagers.

### 3- PRESENTATION GENERALE DU VAL DE DROME

#### 3.1. PERIMETRE DU TERRITOIRE

##### Réseau de Crest Nord

Communes de Crest, Alex, Eurre, Vaunaveys la Rochette

##### Réseau de Crest Sud

Communes de Divajeu, Crest, Chabrillan, Grâne

##### Réseau d'Alex Montoisson


Communes d'Alex, Montoisson, Ambonil

##### Réseau de Loriol/Cliousclat

Communes de Loriol et de Cliousclat

#### 3.2. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

##### 3.2.1 SCHEMA DES RESEAUX

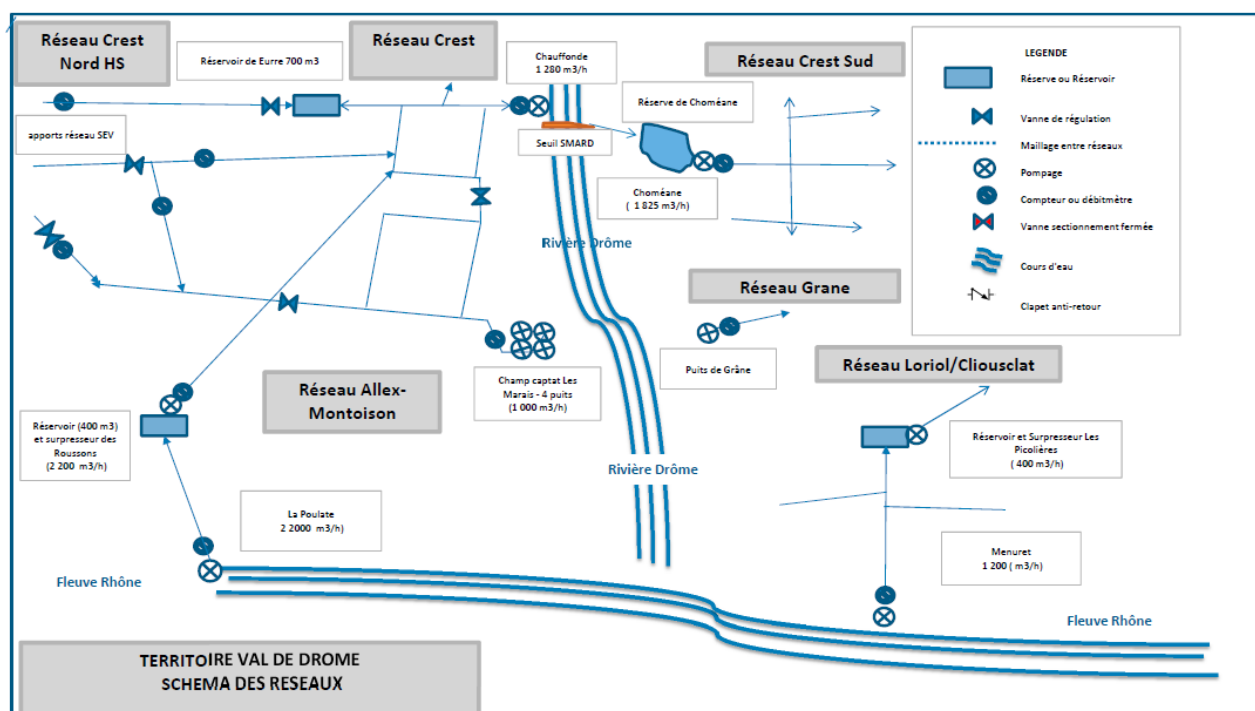

**SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS**

**Siège :** 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

### 3.2.2 RESEAUX DE CREST NORD BAS SERVICE ET D'ALLEX-MONTOISON

#### Station de pompage de Chauffonde:

Prise d'eau dans la rivière Drôme au niveau du seuil SMARD.

Alimentation gravitaire par siphon d'une bêche tampon servant de bêche d'aspiration pour les pompes

4 pompes de 320 m<sup>3</sup>/h à 163 m HMT – moteurs 250 Kw sur démarreurs

1 Transformateurs : 1 250 Kva

2 ballons anti-bélier avec compresseur

Capacité maximale de pompage de 1 280 m<sup>3</sup>/h, à 145 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : de 8 à 850 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)



#### Station de pompage d'Allex ou « des Marais »

4 puits dans la nappe alluviale de la rivière Drôme

4 pompes de 250 m<sup>3</sup>/h à 140 m HMT (1 par puits) refoulant directement sur le réseau

Capacité maximale de pompage de 1 000 m<sup>3</sup>/h, à 140 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : de 5 à 1 300 Kw (Segment C4 : BT > 36 Kw LU)

#### Station de pompage de la Poulatte

Prise d'eau dans le fleuve Rhône par siphon,

3 pompes + 1 pompe en secours à ligne d'arbre verticales de 750 m<sup>3</sup>/h à 125 m HMT refoulant vers le réservoir des Roussons

Capacité maximale de pompage de 2 200 m<sup>3</sup>/h,

Puissance ENEDIS souscrite : de 8 à 1 090 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

#### Station de reprise des Roussons

Réservoir des Roussons de 400 m<sup>3</sup>,

1 pompe Jockey multicellulaire verticalisée de 50 m<sup>3</sup>/h à 140 m HMT

2 pompes multicellulaires verticalisées « petits débits » de 110 m<sup>3</sup>/h à 140 m HMT sur variateurs de vitesse

4 pompes multicellulaires verticalisées « gros débits » de 550 m<sup>3</sup>/h à 140 m HMT dont 2 sur variateurs de vitesse

Cette station de pompage refoule sur le réseau d'Allex-Montoison en alimentant le secteur du plateau de soulier

Capacité maximale de pompage de 2 200 m<sup>3</sup>/h,

Puissance ENEDIS souscrite : de 8 à 1 350 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)



Station de pompage de la Poulatte



Réservoir et station de reprise des Roussons

Ce réseau peut être également alimenté en secours par le réseau du Sud Est Valentinois (2 maillages avec le réseau d'Allex-Montoison – 1 maillage avec le réseau Crest nord Bas service et possibilité d'alimentation via le réservoir d'Eurre)

Maillage Dn 200 mm entre le réseau de Crest Nord Bas service au niveau de la station de pompage de Chauffonde avec la prise d'eau au seuil SMARD donc l'alimentation de la réserve de Choméane du réseau de Crest sud.

Ce maillage permet le transfert d'eau du Rhône (prélevé à la station de pompage de la Poulatte) vers le réseau de Crest Sud.

L'ouverture de ce maillage est pilotée par le niveau haut du réservoir d'Eurre. Par conséquent, ce maillage ne s'ouvre que lorsque les besoins en eau du réseau de Crest Nord Bas service sont entièrement satisfaits.

---

### 3.2.3 RESEAUX DE CREST NORD HAUT SERVICE

Le réseau de Crest nord haut service est alimenté par le réseau du Sud est Valentinois via la réserve et la station de reprise de Juanon ou via le surpresseur de la Baume-Cornillane.

---

### 3.2.4 RESEAUX DE CREST SUD

#### Réseau principal de Crest Sud : station de pompage de Choméane

Prise d'eau dans la rivière Drôme au niveau du seuil SMARD avec une conduite traversant la Drôme dans le seuil

Alimentation gravitaire de la réserve de Choméane : 120 000 m<sup>3</sup>



6 pompes Gourdin FE43 de 280 m<sup>3</sup>/h à 255 m HMT moteur 315 KW avec régulateur Claval  
2 pompes Gourdin FE21 de 145 m<sup>3</sup>/h à 255 m HMT moteur 160 KW avec régulateur Claval  
1 pompe Jockey de 100 m<sup>3</sup>/h à 255 m HMT moteur 110 KW avec régulateur Claval  
1 ballon de surpression de 25 000 l avec compresseur  
Capacité maximale de pompage limitée à 1 680 m<sup>3</sup>/h, à 255 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : de 0 à 1700 Kw (Segment C2 : HTA5 – CU)

#### Réseau de Crest Sud : Forage de Grâne

3 pompes verticales à ligne d'arbre ( 2 x 60 m<sup>3</sup>/h et 1 x 55 m<sup>3</sup>/h à 130 m HMT)  
1 ballon de surpression avec compresseur

Puissance ENEDIS souscrite : de 0 à 96 Kw (Segment C4 : BT > 36 Kw LU)

---

### 3.2.5 RESEAUX DE LORIOI - CLIOUSCLAT

#### Réseau de Lorioi/Cliousclat Bas service : station de pompage de Menuret

Prise d'eau dans le canal du Rhône sur le plan d'eau du Logis neuf  
Un dégrilleur vertical

6 pompes + 1 en secours verticales 200 m<sup>3</sup>/h à 130 m HMT  
Capacité maximale de pompage de 1 200 m<sup>3</sup>/h, à 130 m HMT  
Puissance ENEDIS souscrite : de 5 à 600 Kw (segment C2 : HTA Télélevé HTA5-CU)

Refoulement vers le réservoir de Cliousclat (capacité de 300 m<sup>3</sup>)

#### Réseau de Lorioi/Cliousclat Haut service : Surpresseur de Cliousclat

Aspiration dans le réservoir de Cliousclat  
Refoulement direct sur le réseau de distribution  
6+1 secours pompes verticales 70 m<sup>3</sup>/h à 90 m HMT (moteur de 30 Kw)  
Capacité de pompage de 400 m<sup>3</sup>/h, à 80 m HMT  
Puissance ENEDIS souscrite : de 20 à 251 Kw (segment C2 : HTA Télélevé HTA5-CU)

Remarque : la station de pompage de Cliousclat alimente en électricité la maison du syndicat mise à disposition des agents du SID.

## 4- AUTORISATIONS DE PRELEVEMENTS

### 4.1. REGLEMENTATION DEBIT RESERVE

Tableau 1 : Modulation des débits réservés au seuil SMARD (AP du 2019-06-20-003 et AP du 2021-07-16).

| Seuil SMARD    | Débit minimal à laisser à l'aval du seuil | Prélèvements autorisés  | Volume de prélèvement autorisé<br>(en moyenne glissante sur 8 jours consécutifs) |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01/05 au 01/06 | 3,1 m³/s                                  | Crest nord et Crest sud | 36 000 m³/j                                                                      |
| 01/06 au 15/06 | 3,1 m³/s                                  | Crest sud               | 36 000 m³/j                                                                      |
| 16/06 au 30/06 | 2,2 m³/s                                  | Crest sud               | 36 000 m³/j                                                                      |
| 01/07 au 30/09 | 1,9 m³/s                                  | Crest Sud               | 21 860 m³/j                                                                      |
| 01/10 au 31/10 | 2,2 m³/s                                  | Crest nord et Crest sud | 36 000 m³/j                                                                      |
|                |                                           |                         |                                                                                  |

Il est à noter que cet arrêté de modulation prend fin à l'issue de la saison 2026. Sans nouvel arrêté le débit minimal à laisser à l'aval du seuil SMARD sera de 2.2 m³/s toute l'année à partir de la saison d'irrigation 2027.

### 4.2. REGLEMENTATION VOLUMES PRELEVABLES

| Prélèvement                                                                                                    | Débit autorisé (m³/h) | Volume annuel autorisé (m³) | Volume Etiage <sup>(2)</sup> autorisé (m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Poulatte                                                                                                       | 2200                  | 2 300 000                   |                                            |
| Menuret <sup>(1)</sup>                                                                                         | 900                   | 1 531 000                   | 804 706                                    |
| Marais <sup>(3)</sup>                                                                                          | 1000                  | 730 000                     | 594 000                                    |
| SMARD Crest nord <sup>(3)</sup>                                                                                | 1500                  | 450 000                     | 126 000                                    |
| SMARD Crest sud <sup>(3)</sup>                                                                                 | 2000                  | 1 990 000                   | 1 474 000                                  |
| Grâne <sup>(3)</sup>                                                                                           | 80                    | 85 000                      | 60 000                                     |
| Total                                                                                                          |                       | 7 001 000                   | 2 998 706                                  |
| (1) Arrêté de régularisation des prises d'eau dans le Rhône DDT-SEF-2025-01068 du 16/07/2025 géré par la DREAL |                       |                             |                                            |
| (2) Etiage : mois de juin-juillet-Aout-Septembre pour bassin versant du Rhône                                  |                       |                             |                                            |
| Etiage : mois de juin-juillet-Aout-jusqu'au 15 septembre pour le bassin versant de la rivière Drôme            |                       |                             |                                            |
| (3) Notification OUGC 26                                                                                       |                       |                             |                                            |

## 5- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025


### 5.1. ORIGINE DE L'EAU

L'eau distribuée sur le Val de Drôme provient de :

- la rivière Drôme et de sa nappe d'accompagnement
- de prises d'eau dans le Rhône
- des transferts d'eau entre le territoire du Sud Est Valentinois et les territoires de Crest Nord et d'Allex Montois (Origine de l'eau Rivière Bourne ou/et Isère).

| Réseau / origine de l'eau              | Drôme            | Nappe Drôme    | Sud-Est Valentinois | Réseau Crest Nord | Rhône            | Total     |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Réseau d'Allex/ Crest Nord Bas service | 423 974          | 531 718        | 608                 |                   | 2 217 532        | 3 173 832 |
| Réseau de Crest Nord Haut service      |                  |                | 905 869             |                   |                  | 905 869   |
| Réseau de Crest Sud Grâne              |                  | 85 921         |                     |                   |                  | 85 921    |
| Réseau de Crest Sud                    | 1 140 183        |                |                     | 37 000            |                  | 1 177 183 |
| Réseau de Lorient/Cliousclat           |                  |                |                     |                   | 804 669          | 804 669   |
| <b>Total</b>                           | <b>1 564 157</b> | <b>617 639</b> | <b>906 477</b>      | <b>37 000</b>     | <b>3 022 201</b> |           |

| Origine de l'eau | Drôme            | Nappe Drôme    | Sud-Est Valentinois | Rhône            | Total            |
|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Total</b>     | <b>1 564 157</b> | <b>617 639</b> | <b>906 477</b>      | <b>3 022 201</b> | <b>6 110 474</b> |

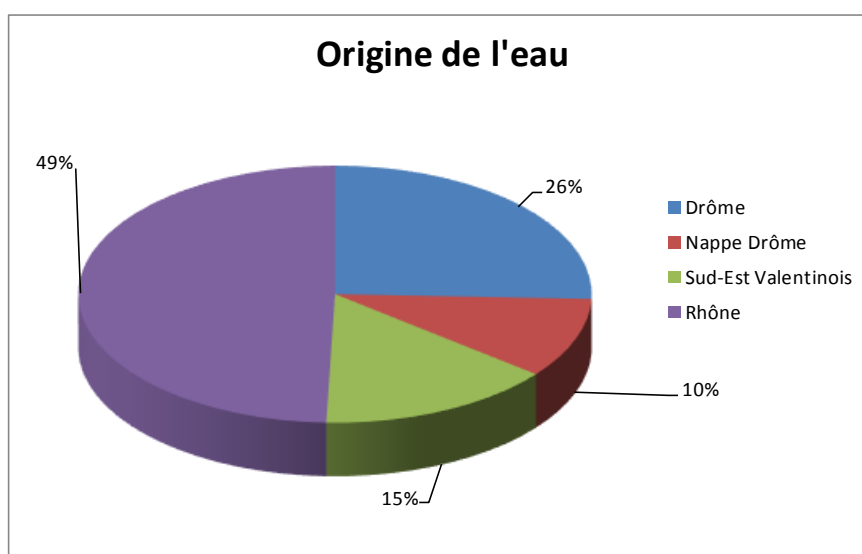

Les obligations des arrêtés relatifs au débit réservé au seuil SMARD (voir chapitre 4.1) ont été respectées.

Volumes journaliers de pointe prélevés :

| Station de pompage          | Date  | Volume de pointe (m3/j) |
|-----------------------------|-------|-------------------------|
| Marais => Alex - Montoisson | 07/08 | 9 715                   |
| Chauffonde => Crest Nord    | 28/05 | 12 267                  |
| Choméane => Crest Sud       | 11/07 | 23 19                   |

## 5.2. VENTE D'EAU




| PROFESSIONNELS PAR RESEAUX |                        |                        |                  |                  |               |                   |                        |                       |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Réseaux                    | Débit souscrits (m3/h) | surface souscrite (ha) | conso (m3)       | Facturation (m3) | nombre prises | nombre de clients | Debit souscrits par ha | Conso annuelle par ha |
| Alex Montoisson            | 4 275                  | 607                    | 1 990 859        | 2 020 087        | 183           | 62                | 7,05                   | 3 282                 |
| Crest Nord B.S.            | 2 820                  | 361                    | 546 655          | 546 655          | 114           | 33                | 7,81                   | 1 515                 |
| Crest Nord H.S.            | 1 542                  | 218                    | 703 368          | 703 368          | 58            | 31                | 7,07                   | 3 226                 |
| Grâne                      | 224                    | 33                     | 83 903           | 83 903           | 13            | 5                 | 6,89                   | 2 582                 |
| Crest Sud                  | 3 314                  | 480                    | 1 099 025        | 1 099 025        | 133           | 46                | 6,90                   | 2 288                 |
| Loriol/cliousclat          | 2 012                  | nc                     | 594 943          | 594 943          | 87            | 39                |                        |                       |
| <b>Total</b>               | <b>14 187</b>          | <b>1 698</b>           | <b>5 018 753</b> | <b>5 047 981</b> | <b>588</b>    | <b>216</b>        |                        |                       |

| COLLECTIVITES     |                        |                        |               |                  |               |                   |                        |                       |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Réseaux           | Débit souscrits (m3/h) | surface souscrite (ha) | conso (m3)    | Facturation (m3) | nombre prises | nombre de clients | Debit souscrits par ha | Conso annuelle par ha |
| Alex Montoisson   | 40                     | 4                      | 3 395         | 3 395            | 4             | 2                 | 11,43                  | 970                   |
| Crest Nord B.S.   | 60                     | 7                      | 27 823        | 27 823           | 7             | 2                 | 8,57                   | 3 975                 |
| Crest Nord H.S.   | néant                  |                        |               |                  |               |                   |                        |                       |
| Grâne             | néant                  |                        |               |                  |               |                   |                        |                       |
| Crest Sud         | 10                     | 1                      | 25            | 25               | 1             | 1                 | 10,00                  | 25                    |
| Loriol/cliousclat | 10                     | nc                     | 0             | 0                | 1             | 1                 |                        |                       |
| <b>Total</b>      | <b>120</b>             | <b>12</b>              | <b>31 243</b> | <b>31 243</b>    | <b>13</b>     | <b>6</b>          |                        |                       |

| NON PROFESSIONNELS PAR RESEAUX |                              |                |                     |                  |                         |                              |                             |                                   |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Réseaux                        | Débit<br>souscrits<br>(m3/h) | conso (m3)     | Facturation<br>(m3) | nombre<br>prises | nombre<br>de<br>clients | Debit<br>souscrits<br>par ab | Conso<br>annuelle<br>par ab | Facturation<br>annuelle par<br>ab |
| Alexx Montoisson               | 254                          | 21 607         | 21 607              | 49               | 51                      | 5,18                         | 441                         | 441                               |
| Crest Nord B.S.                | 363                          | 19 235         | 19 235              | 68               | 73                      | 5,34                         | 283                         | 283                               |
| Crest Nord H.S.                | 75                           | 3 603          | 3 603               | 14               | 13                      | 5,36                         | 257                         | 257                               |
| Grâne                          | néant                        |                |                     |                  |                         |                              |                             |                                   |
| Crest Sud                      | 234                          | 8 367          | 8 367               | 70               | 70                      | 3,34                         | 120                         | 120                               |
| Loriol/cliousclat              | 861                          | 69 966         | 69 966              | 176              | 175                     | 4,89                         | 398                         | 398                               |
| <b>Total</b>                   | <b>1787</b>                  | <b>122 778</b> | <b>122 778</b>      | <b>377</b>       | <b>382</b>              |                              |                             |                                   |

| TOTAL PAR RESEAUX |                              |                              |                  |                     |                  |                      |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Réseaux           | Débit<br>souscrits<br>(m3/h) | surface<br>souscrite<br>(ha) | conso (m3)       | Facturation<br>(m3) | nombre<br>prises | nombre<br>de clients |
| Alexx Montoisson  | 4 569                        | 610                          | 2 015 861        | 2 045 089           | 236              | 115                  |
| Crest Nord B.S.   | 3 243                        | 368                          | 593 713          | 593 713             | 189              | 108                  |
| Crest Nord H.S.   | 1 617                        | 218                          | 706 971          | 706 971             | 72               | 44                   |
| Grâne             | 224                          | 33                           | 83 903           | 83 903              | 13               | 5                    |
| Crest Sud         | 3 558                        | 481                          | 1 107 417        | 1 107 417           | 204              | 117                  |
| Loriol/cliousclat | 2 883                        | nc                           | 664 909          | 664 909             | 264              | 215                  |
| <b>Total</b>      | <b>16 094</b>                | <b>1 710</b>                 | <b>5 172 774</b> | <b>5 202 002</b>    | <b>978</b>       | <b>604</b>           |

| Synthèse par type de consommateurs |                  |                      |                  |                     |
|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Type                               | nombre<br>prises | nombre de<br>clients | conso (m3)       | Facturation<br>(m3) |
| PRO                                | 588              | 216                  | 5 018 753        | 5 047 981           |
| COLLECTIVITES                      | 13               | 6                    | 31 243           | 31 243              |
| NON PRO                            | 377              | 382                  | 122 778          | 122 778             |
| <b>Total</b>                       | <b>978</b>       | <b>604</b>           | <b>5 172 774</b> | <b>5 202 002</b>    |

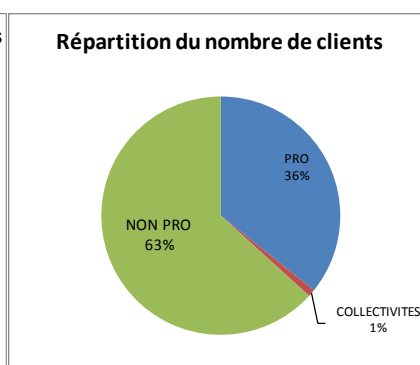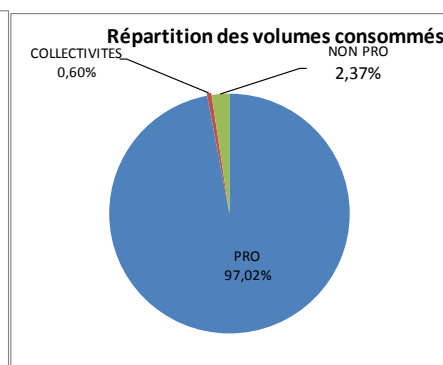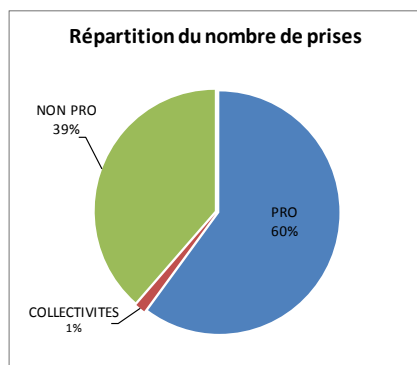

### 5.3. RENDEMENTS DES RESEAUX

Le rendement correspond au rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers et le volume d'eau prélevé et introduit dans le réseau de distribution.

| Rendement de réseaux      | Rendement | Volume consommés | Volumes produits |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Réseau Alex/Crest Nord BS | 83,19%    | 2 609 574        | 3 136 832        |
| Réseau Crest Sud          | 94,07%    | 1 107 417        | 1 177 183        |
| Réseau Grâne              | 97,65%    | 83 903           | 85 921           |
| Réseau Crest Nord HS      | 78,04%    | 706 971          | 905 869          |
| Réseau Loriol/Cliousclat  | 82,63%    | 664 909          | 804 669          |
| Total                     | 84,65%    | 5 172 774        | 6 110 474        |

### 5.4. CONSOMMATION ENERGETIQUE

#### 5.4.1 ALLEX-MONTOISON CREST NORD BAS SERVICE

Stations de pompage de Chauffonde-Marais-Poulatte-Roussons + Import du réseau du Sud Est Valentinois

La consommation totale pour l'année 2025 est de 2 754 413 Kwh. (Ce chiffre inclus un quota part de la consommation du réseau du Sud est Valentinois pour la fourniture d'eau au réseau Haut service).

| Ratios          | Total |
|-----------------|-------|
| Kwh/m3 consommé | 1,041 |
| €/m3 consommé   | 0,071 |
| €/Kwh           | 0,069 |

Nota : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

#### 5.4.2 CREST NORD HAUT SERVICE

Import d'eau du réseau du Sud Est Valentinois

La consommation totale pour l'année 2025 est de 1 130 650 Kwh. (Ce chiffre inclus un quota part de la consommation du réseau du Sud est Valentinois pour la fourniture d'eau au réseau Haut service)

| Ratios          | Total |
|-----------------|-------|
| Kwh/m3 consommé | 1,599 |
| €/m3 consommé   | 0,104 |
| €/Kwh           | 0,065 |

**SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS**

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

Nota : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

#### 5.4.3 CREST SUD : RESEAU PRINCIPAL

Stations de pompage de Choméane + import d'eau du réseau de Crest Nord Bas Service

La consommation totale pour l'année 2025 est de 1 383 322 Kwh. (Ce chiffre inclut une quote-part de la consommation du réseau Allex-Montoison Crest Nord Bas service pour la fourniture d'eau au réseau Haut service)

| Ratios          | Total |
|-----------------|-------|
| Kwh/m3 consommé | 1,249 |
| €/m3 consommé   | 0,086 |
| €/Kwh           | 0,069 |

Nota : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

#### 5.4.4 LORIOL/CLIOUSCLAT

La consommation totale pour l'année 2025 est de 609 492 Kwh.

| Ratios          | Total |
|-----------------|-------|
| Kwh/m3 consommé | 0,917 |
| €/m3 consommé   | 0,066 |
| €/Kwh           | 0,072 |

Nota : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

#### 5.4.5 CREST SUD : RESEAU GRANE

La consommation totale pour l'année 2025 est de 70 094 Kwh.

| Ratios          | Total |
|-----------------|-------|
| Kwh/m3 consommé | 0,835 |
| €/m3 consommé   | 0,074 |
| €/Kwh           | 0,089 |

Nota : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

## 6. SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

### 6.1 SECURITE PUBLIQUE

Néant : aucun ouvrage n'est soumis à la réglementation « sécurité publique des ouvrages hydrauliques » sur ce territoire.

### 6.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE

#### Contrôles périodiques des installations électriques du territoire d'Alex-Montoison

| Sites                              | Commune          | Conventions | Visite précédente | Visite suivante |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <a href="#">Les Marais</a>         | Allex            | CAPARA      | 14 novembre 2023  | 2026            |
| <a href="#">Poulatte</a>           | Etoile sur Rhône | CAPARA      | 27 novembre 2024  | 2027            |
| <a href="#">Réservoir Roussons</a> | Allex            | CAPARA      | 2 décembre 2025   | 2028            |

#### Contrôles périodiques des installations électriques du territoire d'Alex-Montoison

| Sites                              | Commune          | Conventions | Visite précédente | Visite suivante |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <a href="#">Les Marais</a>         | Allex            | CAPARA      | 14 novembre 2023  | 2026            |
| <a href="#">Poulatte</a>           | Etoile sur Rhône | CAPARA      | 27 novembre 2024  | 2027            |
| <a href="#">Réservoir Roussons</a> | Allex            | CAPARA      | 2 décembre 2025   | 2028            |

#### Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Crest Sud

| Sites                    | Commune | Conventions | Visite précédente | Visite suivante |
|--------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|
| <a href="#">Grâne</a>    | Grâne   | CAPARA      | 27 novembre 2025  | 2028            |
| <a href="#">Choméane</a> | Divajeu | CAPARA      | 14 novembre 2023  | 2026            |

#### Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Crest Sud

| Sites                    | Commune | Conventions | Visite précédente | Visite suivante |
|--------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|
| <a href="#">Grâne</a>    | Grâne   | CAPARA      | 27 novembre 2025  | 2028            |
| <a href="#">Choméane</a> | Divajeu | CAPARA      | 14 novembre 2023  | 2026            |

## 6.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS PRESSION

| Date                               | Appareil                | Volume –<br>Pression de<br>service | Type<br>d’inspection         | Non-<br>conformité |         |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| Station de pompage des Marais Alex |                         |                                    |                              |                    |         |
| 01/2020                            | CHARLATTE n°10 000-050  | 10 000 l – 15 b                    | Requalification<br>décennale | Néant              | SOCOTEC |
| 12/2024                            |                         |                                    | Inspection avec<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
| 01/2026                            |                         |                                    | Inspection sans<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
|                                    |                         |                                    |                              |                    |         |
| Station de pompage de Chauffonde   |                         |                                    |                              |                    |         |
| 12/2011                            | CHABANON n°394          | 142 l                              | Contrôle<br>périodique       | Néant              | SOCOTEC |
| 02/2022                            | CHABANON n°396          | 24 000 l – 19 b                    | Requalification<br>décennale | Néant              | ASAP    |
| 01/2026                            |                         |                                    | Inspection avec<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
|                                    |                         |                                    |                              |                    |         |
| Station de pompage de Choméane     |                         |                                    |                              |                    |         |
| 2020                               | IBAIONDO n°5021370001   | 15 000 l - 30 b                    | Mise en service              |                    |         |
| 10/2024                            |                         |                                    | Inspection avec<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
|                                    |                         |                                    |                              |                    |         |
| Station de pompage de la Poulatte  |                         |                                    |                              |                    |         |
| 2020                               | CHARLATTE n°10000SS284  | 10 000 l – 20 b                    | Mise en service              |                    |         |
| 03/2024                            |                         |                                    | Inspection avec<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
| 01/2026                            |                         |                                    | Inspection sans<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
| Station de pompage des Roussons    |                         |                                    |                              |                    |         |
| 2020                               | CHARLATTE n°150000SS164 | 15 000 l – 19 b                    | Mise en service              |                    |         |
| 03/2024                            |                         |                                    | Inspection avec<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
| 01/2026                            |                         |                                    | Inspection sans<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
|                                    |                         |                                    |                              |                    |         |
| Station de pompage de Grâne        |                         |                                    |                              |                    |         |
| 2020                               | IBAIONDO n°5021380001   | 6 000 l - 15 b                     | Mise en service              |                    |         |
| 10/2024                            |                         |                                    | Inspection avec<br>ouverture | Néant              | SOCOTEC |
|                                    |                         |                                    |                              |                    |         |
| Station de pompage de Menuret      |                         |                                    |                              |                    |         |
| 11/2015                            | CHABANON n°214          | 4 000 l – 13.5 b                   | Requalification<br>décennale | Néant              | ASAP    |
| 12/2022                            | CHABANON n°214          | 4 000 l – 13.5 b                   | Contrôle<br>périodique       | Néant              | SOCOTEC |

| Surpresseur de Picolières |                     |                 |                           |       |         |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-------|---------|
| 01/2021                   | STI SICOSUD n°73542 | 10 450 l – 12 b | Requalification décennale | Néant | ASAP    |
| 01/2025                   |                     |                 | Inspection avec ouverture | Néant | SOCOTEC |

#### 6.4 CONTROLE CONFORMITE DISPOSITIFS DE LEVAGE

|              | Observations                        |  |             | ANNEE de contrôle              | ==                    | 2021                   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|
|              | Anomalies constatées : Non conforme |  |             | RAPPORTS suite visite contrôle | ==                    | <a href="#">Nov-21</a> | Dec -22 | nov-23 | nov-24 | nov-25 |
| LIEUX        | POINT DE CONTRÔLE                   |  | Capacité Kg | BILAN observations / Travaux   |                       | ====>                  |         |        |        |        |
|              |                                     |  |             | SUIVI de contrôle (Fact HT)    | <a href="#">Dekra</a> |                        |         |        |        |        |
| Les Roussons | Pont roulant MaB HADEF              |  | 1           | 2 000                          |                       |                        |         | Ok     | Ok     | Ok     |
|              |                                     |  |             |                                |                       |                        |         |        |        |        |
| La Poulatte  | Pont roulant MaB HADEF              |  | 1           | 4 200                          |                       |                        |         | 1      | 1      | 1      |
|              |                                     |  | 1           |                                |                       |                        |         |        |        |        |

## 7. TRAVAUX DE L'ANNEE 2025

### 7.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT

#### 7.1.1 OBJECTIFS

##### **Classés par ordre de priorité**

- 1/ Organes hors service à la suite de la saison précédente
- 2/ Organes dont l'état ou le niveau d'usure laisse craindre une rupture à court terme 1,2 ou 3 ans
- 3/ Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation sécurité des travailleurs
- 4/ Amélioration des performances énergétiques
- 5/ Dégradations de caractéristiques techniques
- 6/ Amélioration de la facilité d'exploitation d'un ouvrage
- 7/ Mise en conformité vis-à-vis des exigences techniques de tiers (ENEDIS, agence de l'eau etc...)
- 8/ Amélioration de la fiabilité de fonctionnement de l'ouvrage
- 9/ Lutte contre les risques d'intrusions, de dégradations, sécurité des riverains
- 10/ Amélioration des fonctionnalités de report d'information et de suivi
- 11/Réduction des nuisances à des tiers (bruits etc...)

#### 7.1.2 TRAVAUX REALISES OU EN COURS

##### **Opérations terminées au 30/11/2025**

| Ouvrages                   | OBJET                                                                   | n° PROJET AT... | Planificatio |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Réseau Allex               | Création conduite d'évacuation des eaux du regard de régulation         | PR 25 02 0003   | fait 2025    |
| Réseau Allex               | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025  | PR 24 11 0011   | fait 2025    |
| Réseau Crest Nord          | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025  | PR 24 11 0011   | fait 2025    |
| Réseau Crest sud           | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025  | PR 24 11 0011   | fait 2025    |
| Réseau Grâne               | Renouvellement conduite PVC 110 mm sur 230 ml                           | PR 25 10 0012   | fait 2025    |
| Réseau Loriol / Cliousclat | Renouvellement 120 ml de conduite (traversée en acier sous l'autoroute) | PR 24 03 0016   | fait 2025    |
| Réseau Loriol / Cliousclat | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025  | PR 24 11 0011   | fait 2025    |
| Réservoir Eurre            | Renouvellement Echelle d'accès                                          | PR 24 03 0017   | fait 2025    |
| SP Chauffonde              | Renouvellement stabilisateur de décharge de sécurité Dn 200 mm          | PR 24 10 0001   | fait 2025    |
| SP Choméane                | Groupe PP2 : Renouvellement moteur                                      | PR 25 06 0002   | fait 2025    |
| SP Grâne                   | G2 : Rénovation partielle pompe                                         | PR 25 01 0013   | fait 2025    |

## Opérations en cours au 30/11/2025

| Ouvrages                   | OBJET                                                                  | n° PROJET AT  | Planificatio |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Réseau Allex               | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026 | PR25100029    | 2025/2026    |
| Réseau Crest Nord          | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026 | PR25100029    | 2025/2026    |
| Réseau Crest Sud           | Etude sites de stockage                                                |               | 2025/2026    |
| Réseau Crest sud           | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026 | PR25100029    | 2025/2026    |
| Réseau Loriol / Cliousclat | Déviation RN7 DIR Dn 200                                               |               | 2025/2026    |
| Réseau Loriol / Cliousclat | Déviation RN7 DIR DN 90 PVC                                            |               | 2025/2026    |
| Réseau Loriol / Cliousclat | Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026 | PR25100029    | 2025/2026    |
| Réseau Loriol / Cliousclat | Renouvellement conduite PVC (1ère tranche)                             | PR 25 05 0004 | 2025/2026    |
| Réserve Choméane           | Installation Photovoltaïque - Etude d'avant-projet                     |               | 2025/2026    |
| Réservoir Eurre            | Réaménagement du chemin d'accès                                        |               | 2025/2026    |
| Réservoir Eurre            | Renouvellement Crépines                                                |               | 2025/2026    |
| SP Choméane                | Groupe PP1 : Rénovation ou renouvellement pompe + moteur               |               | 2025/2026    |
| SP Choméane                | Pompe G3 : Rénovation ou renouvellement pompe + moteur                 | PR25100005    | 2025/2026    |
| SP Choméane                | Pompe G4 : Rénovation ou renouvellement pompe                          | PR25100006    | 2025/2026    |

Les charges correspondantes sont imputées au budget « investissement » du SID.

## 7.2 PRINCIPAUX TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Les principales interventions réalisées en 2025 au titre des travaux d'entretien et de maintenance sont fournies en annexe Les charges correspondantes sont imputées au budget « fonctionnement » du SID.

### 7.3 TRAVAUX FACTURES

| Désignation                                                | Nb |
|------------------------------------------------------------|----|
| Fourniture et pose compteur (1 - 3 - 5 m3/h)               | 1  |
| Réparation borne endommagée par tiers                      | 0  |
| Réparation conduite endommagée par tiers                   | 1  |
| Modification d'un borne existante (modif débit)            | 4  |
| Création branchement sur réseau gravitaire                 | 0  |
| Création branchement sur réseau pression                   | 1  |
| Création borne ou sortie sur borne existante               | 2  |
| Déplacement borne                                          | 0  |
| Déplacement sortie borne                                   | 0  |
| Extension de réseau                                        | 0  |
| Déplacement non justifié d'un agent                        | 0  |
| Remise en conformité de borne                              | 0  |
| Remise en conformité d'un branchement ou poste de comptage | 0  |
| Renouvellement compteur                                    | 0  |
| Repose compteur suite à impayés                            | 0  |
| Vérification compteur (jaugage)                            | 0  |
| Participation au déplacement d'une conduite                | 0  |

### 7.4 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025

Néant

## 8. GESTION CLIENTELE

### 8.1 PRIX DU SERVICE

#### 8.1.1 TARIFICATION AGENCE DE L'EAU

Pour la saison 2025, la facturation de la redevance agence de l'eau uniformisée au SID fixée par délibération du 28 janvier 2025 est de 0,009 € H.T. /m<sup>3</sup> consommé et 14.45 € H.T. par l/s pour les abonnements gravitaires.

#### 8.1.2 TARIFICATION POUR LES NON PROFESSIONNELS

Le prix de vente pour les particuliers est uniformisé sur l'ensemble du territoire du SID.

Les tarifs du service sont fixés par la délibération du 28 janvier 2025.

- Une prime fixe en fonction du débit souscrit

|                            |                   |              |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 m <sup>3</sup> /h .....  | 75,45 € HT .....  | 79,60 € TTC  |
| 3 m <sup>3</sup> /h .....  | 97,97 € HT .....  | 103,36 € TTC |
| 5 m <sup>3</sup> /h .....  | 129,33 € HT ..... | 136,44 € TTC |
| 10 m <sup>3</sup> /h ..... | 215,54 € HT ..... | 227,39 € TTC |
| 15 m <sup>3</sup> /h ..... | 368,00 € HT ..... | 388,24 € TTC |
| 20 m <sup>3</sup> /h ..... | 525,72 € HT ..... | 554,63 € TTC |
| 30 m <sup>3</sup> /h ..... | 683,43 € HT ..... | 721,02 € TTC |

- Un tarif de 0,17 €/m<sup>3</sup> HT par m<sup>3</sup> consommés

- Un tarif de 0,01 €/m<sup>3</sup> HT par m<sup>3</sup> consommés pour surcoût énergie

#### 8.1.3 TARIFICATION POUR LES PROFESSIONNELS

Le tarif professionnel n'est accordé qu'aux abonnés pouvant justifier d'un numéro SIRET en lien avec le titulaire du contrat d'abonnement.

Pour la saison 2025, le prix de vente a été fixé à (délibération du 28 janvier 2025) :

- **Réseaux de Crest Nord Bas et Haut service**

**Part fixe**

Abonnement à la surface.....ha .....157.19 € H.T.

Abonnement au débit.....m<sup>3</sup>/h .....15.79 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** .....0,0937 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de 605.82 € H.T./ha pour une prise - 7 m<sup>3</sup>/h - 1 ha - 3000 m<sup>3</sup>/ha

**Réseau Allex-Montoison**

**Part fixe**

Abonnement à la surface.....ha .....157.19 € H.T.

Abonnement au débit.....m<sup>3</sup>/h .....15.79 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** .....0,0845 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de 578.22 € H.T./ha pour une prise - 7 m<sup>3</sup>/h - 1 ha - 3000 m<sup>3</sup>/ha

**Réseau Crest Sud**

**Part fixe**

Abonnement à la surface.....ha .....152.88 € H.T.

Abonnement au débit.....m<sup>3</sup>/h .....14.86 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** .....0,0937 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de : 595.00 € H.T./ha pour une prise - 7 m<sup>3</sup>/h - 1 ha - 3000 m<sup>3</sup>/ha

**Réseau de Grâne**

**Part fixe**

Abonnement à la surface ..... ha ..... 105.58 € H.T.

Abonnement au débit ..... m<sup>3</sup>/h ..... 8,20 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** .....0,084 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de : 471.98 € H.T./ha pour une prise - 7 m<sup>3</sup>/h - 1 ha - 3000 m<sup>3</sup>/ha

- **Réseau Loriol/Cliousclat**

**Part fixe**

Abonnement l/s ..... l/s ..... 55.49 € H.T.

Abonnement 5 m<sup>3</sup>/h ..... u ..... 77.08 € H.T.

Abonnement 10 m<sup>3</sup>/h ..... u ..... 154.16 € H.T.

Abonnement 20 m<sup>3</sup>/h ..... u ..... 308.32 € H.T.

Abonnement 30 m<sup>3</sup>/h ..... u ..... 462.48 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** ..... 0,115 € H.T.

**Part au m<sup>3</sup>** (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de : 509.91 € H.T./ha pour une prise - 7 m<sup>3</sup>/h - 1 ha - 3000 m<sup>3</sup>/ha

Remarque : aucune évolution tarifaire par rapport à 2024 pour les irrigants professionnels

## 8.2 RELATIONS IRRIGANTS

### 8.2.1 CONTINUITE DE SERVICE

**Mise et arrêt du service :**

| Mise en service | Station de pompage                                      | Réseau                                                                  | Arrêt  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13-mars         | Station de pompage de Chauffonde                        | Réseau Crest nord bas service et Alex-Montoison HS/BS                   | 25-oct |
| 21-mars         | Station de pompage des Marais                           | Réseau d'Alex-Montoison BS                                              | 25-oct |
| nc              | Station de reprise de la Baume Cornillanne et de Juanon | Réseau de Crest nord Haut service                                       | 23-oct |
| 20-mars         | Station de pompage de Menuret                           | Réseau Loriol/Cliousclat bas service                                    | 28-oct |
| 25-mars         | Station de reprise de Picolières                        | Réseau Loriol/Cliousclat Haut service                                   | 23-oct |
| 03-avr          | Stations de pompage de la Poulatte et des Roussons      | Alimentation de la rive Droite de la Val de la Drôme par l'eau du Rhône | 10-oct |
| 21-mars         | Station de pompage de Choméane                          | Réseau Crest Sud                                                        | 23-oct |
|                 |                                                         |                                                                         |        |

**Problème de ressources :** oui pour l'alimentation du réseau de Crest Sud => mise en place de restriction

**Problèmes de capacité de pompage par rapport à la demande :** Néant

### Problèmes de fonctionnement d'ouvrages :

- *Coupures d'alimentation électrique (ENEDIS)*

| Date    | Ouvrage           | Durée | Type                     |
|---------|-------------------|-------|--------------------------|
| 28-janv | SP Picolières     | 8h00  | Programmée (hors saison) |
| 29-mars | SP Roussons       | 5h36  | non programmée           |
| 05-mai  | SP Roussons       | 4h30  | Programmée               |
| 30-juin | SP Poulatte       | 7h00  | Programmée               |
| 04-août | SP Marais (Allex) | 3h30  | Programmée               |
| 06-oct  | SP Roussons       | 1h00  | Programmée               |
| 26-nov  | SP Roussons       | 1h30  | Programmée               |
|         |                   |       |                          |

- *Incident de fonctionnement des ouvrages : Néant*

### Problèmes de fonctionnement réseaux :

*Réseau Crest nord Haut service : Néant*

*Réseau Crest nord Bas service : Néant*

*Réseau Crest Sud : Néant*

*Réseau Loriol/Clionsclat : Néant*

*Réseau Allex-Montoison : Néant*

*Réseau Grane : Néant*

## 8.2.2 INFORMATIONS DES IRRIGANTS

| Date     | Événement                                                                                                                                                       | Mode diffusion       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13-mars  | Réunion annuelle des irrigants du territoire                                                                                                                    | Réunion à Chabrillan |
| 5-mai    | Réseau Lorient - Clionsclat : Chasses sédimentaires sur le Rhône du 23/05 au 06/06<br>=> risque hausse turbidité => demande de réduction des consommations      | Mail                 |
| 5-mai    | Réseau Crest Sud : Transmission des restrictions en fonction de la disponibilité de la ressource                                                                | Mail                 |
| 11-juin  | Info Problème de transmission des factures des irrigants PRO de la part du Trésor public                                                                        | Mail                 |
| 23-juin  | Info coupure d'alimentation électrique de la station de pompage de la Poulatte le 30 juin - demande de réduction des consommations de 7 h à 17 h                | Mail                 |
| 31-juil. | Réseaux Crest Nord bas service - Allex/Montoison - Irrigants PRO demande de limitation des débits                                                               | Mail + SMS           |
| 31-juil. | Réseau Crest sud : restriction de consommation niveau 1                                                                                                         | Mail + SMS           |
| 6-août   | Réseau Crest sud : restriction de consommation niveau 2                                                                                                         | Mail + SMS           |
| 13-août  | Réseaux Crest Nord bas service - Allex/Montoison - Irrigants PRO demande de limitation des débits                                                               | Mail + SMS           |
| 13-août  | Réseaux Crest Nord bas service - Allex/Montoison - Irrigants NON PRO et ADMINISTRATION demande d'arrêt de l'irrigation à l'exception de l'arrosage des potagers | Mail + SMS           |
| 13-août  | Réseau Grâne : info sécheresse - situation d'alerte                                                                                                             | Mail                 |
|          |                                                                                                                                                                 |                      |

## 8.3 ARRETES RELATIFS A LA GESTION QUANTITATIVE DES EAUX DITS « ARRETES SECHERESSE »

| zone hydrographique de gestion | ressource                           | 24/06/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 23/07/2025 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Bassin de la Drôme             | eaux superficielles et souterraines | -          |            | vigilance  |            |

## 9. LES PROJETS DU TERRITOIRE

### 9.1 REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES

Le SID participe à l'étude de réutilisation des eaux usées traitées des stations d'épuration de Crest et d'Allex pilotée par l'association BIOVALLEE et réalisée par le bureau d'étude ECOFILAE.

### 9.2 RECHERCHE DE SITES POUR STOCKAGE

Le SID participe à l'étude de recherche de sites pour la réalisation d'un stockage inter saisonnier piloté par la CCVD (Communauté de Communes du Val de Drôme).

Plus d'informations sur ce projet dans le rapport d'activité général du SID.

## 10. DONNEES FINANCIERES

### 10.1 COMPTABILITE ANALYTIQUE

#### 10.1.1. FONCTIONNEMENT

| Dépenses de fonctionnement                              | VAL DE DROME        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Energie et autres fluides                               | 339 069,16          |
| Entretien stations réseaux                              | 71 100,19           |
| Charges de personnel                                    | 115 572,98          |
| Redevances et Taxes (foncier,VNF,SNCF,CFE,etc...)       | 5 139,64            |
| Redevances Agence de l'eau                              | -                   |
| Assurances                                              | -                   |
| Charges financières (intérêts emprunts)                 | 19 951,72           |
| Transfert investissements (Renouvellement - Rb emprunt) | 179 910,11          |
| Autres charges                                          | 15 842,14           |
| Charges exceptionnelles                                 | 505,80              |
| Transfert - Vente d'eau interne                         | 124 436,69          |
| Frais généraux Antenne d'exploitation                   | 16 249,92           |
| Frais généraux siège                                    | 339 972,15          |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>1 227 750,51</b> |

| Recettes de fonctionnement           | VAL DE DROME        |
|--------------------------------------|---------------------|
| Travaux en Régie                     | 46 497,63           |
| Amortissement subventions            | 4 443,14            |
| Vente d'eau                          | 1 085 227,91        |
| Redevances agence de l'eau ou autres | 54 249,08           |
| Travaux et prestations facturés      | 11 106,56           |
| Vente d'électricité                  | -                   |
| Reversement par les Fermiers         | -                   |
| Energie réservée                     | 59 721,94           |
| Transfert - Vente d'eau interne      |                     |
| Divers                               | 67 957,97           |
| Produits exceptionnels               | 2 483,34            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1 331 687,57</b> |
| <b>Résultat exercice</b>             | <b>103 937,06</b>   |

Les dépenses sont en hausse de près de 9% par rapport à l'exercice 2024 (+100.000 €) avec davantage de dépenses de fournitures pour l'entretien des réseaux et de dépenses d'électricité du fait de la hausse de la consommation d'eau.

Les recettes stagnent, malgré de meilleures recettes de vente d'eau, du fait de la baisse du produit de l'énergie réservée liée à la baisse des prix du marché de l'électricité.

### 10.1.2 INVESTISSEMENT

| Dépenses d'investissement                                   | VAL DE DROME      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dépenses d'équipement                                       | 234 953,58        |
| Amortissement des subventions                               | 4 443,14          |
| remboursement du capital de la dette                        | 103 184,91        |
| Quote-part dépenses antenne                                 | -                 |
| Quote-part dépenses siège                                   | 14 548,36         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>357 129,99</b> |
| Recettes d'investissement                                   | VAL DE DROME      |
| Participation des irrigants aux investissements sur réseaux |                   |
| Amortissements                                              | 179 910,11        |
| Subventions                                                 | 191 277,58        |
| Autres recettes (indemnisation etc.)                        |                   |
| Quote-part recettes antenne                                 | 2 276,94          |
| Quote-part recettes siège                                   | 11 682,78         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>385 147,40</b> |
| <b>Résultat exercice</b>                                    | <b>28 017,41</b>  |

Les dépenses d'équipement sont en baisse, il est vrai que l'an passé de gros travaux (> 140.000 €) avaient été faits à la station de Chauffondes, mais il n'y a pas eu de chantier similaire en 2025.

### 10.2 IMPAYES

| Territoire   | 2022 | 2023   | 2024  | 2025 hors conso | Total général |
|--------------|------|--------|-------|-----------------|---------------|
| Val de Drôme |      | 17 339 | 3 189 | 8 722           | 29 250        |

Les impayés au 31 janvier 2026 (hors facturation de la consommation 2025) élevés en 2023, baissent en 2024 et remontent en 2025, alors que sur d'autres territoires, cette progression est quasi exponentielle.

### 10.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE

Un emprunt de 2 M€ a été contracté en 2015 pour financer la réalisation des travaux d'alimentation du territoire par l'eau du Rhône.

Le capital restant dû au 31/12/2025 est de 1.128.403,04€.

## 11. URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS

Le Syndicat d'Irrigation Drômois souhaite attirer l'attention de tous ses membres sur les difficultés rencontrées dans la gestion du développement des constructions sur les communes. Les réseaux d'irrigation sont essentiellement implantés en terrain privé et ont été créés sans l'inscription des servitudes associées au service de la propriété foncière. Les propriétaires se sont engagés à informer leur successeur de la présence de la servitude lors de toute opération de vente. Malheureusement, cette démarche est rarement effectuée. Certains propriétaires ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître la présence d'une canalisation sous leur terrain. Cette situation a plusieurs conséquences notamment dans les zones urbanisées :

- Risque pour les riverains en cas de rupture de conduite : la pression d'un réseau d'irrigation est comprise entre 10 et 25 bars !!!!
- Difficultés d'intervention pour les équipes du SID pouvant entraîner une rupture de la continuité du service pendant plusieurs jours.
- Dégradations potentielles des équipements du SID en cas de terrassement par le propriétaire ou son prestataire.

Nous demandons donc aux communes :

- de bien vouloir signaler la présence des canalisations d'irrigation lors de tout document urbanisme (certificat d'urbanisme – déclaration de travaux – permis de construire – permis de lotir – permis d'aménager etc...). Seule la concertation amont avec les porteurs de projet permettra au SID d'étudier des solutions techniques et économiques permettant de rendre les projets compatibles avec la présence des réseaux d'irrigation
- de ne pas classer constructibles les parcelles avec une canalisation d'irrigation sans concertation au préalable avec le SID
- de rappeler à tous les porteurs de projet la nécessité de faire les démarches **obligatoires** de DT : déclaration de projet de travaux (à faire par le Maître d'ouvrage) et DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux (à faire par l'entreprise de terrassement) auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) : fichier regroupant les plans des réseaux de tous les gestionnaires y compris le SID. Cette démarche doit être faite également en terrain privé.

Nous souhaitons également attirer l'attention des communes sur les points suivants :

- le SID n'a pas les moyens de régulariser les servitudes liées à ses canalisations,
- le SID n'a pas les moyens financiers de prendre seul en charge les déplacements de conduites.

Nous comptons sur la vigilance de tous et notamment des communes pour éviter les situations que nous avons connues ces dernières années notamment sur les communes d'Etoile sur Rhône – Upie – Montélimar.

## 12. ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

### Opérations terminées au 30/11/2025

| Intervention | Equipement - Réseaux     | Objet                                            | Service gestionnaire | Description                         | Etat des travaux | Lieu d'intervention                       |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| INT25040017  | RESEAU ALLEX-MONTOISON   | Fuite sur MANCHON EXPRESS DN 700                 | SERVICE EXPLOITATION | ATU 2025040900397                   | Clôturé          | ETOILE SUR RHONE: Les petits Robins       |
| INT25070055  | RESEAU ALLEX-MONTOISON   | Reprise BAC borne N°256                          | SERVICE MAINTENANCE  | ATU 2025070994482                   | Clôturé          | ALLEX: Soulier                            |
| INT25070054  | RESEAU ALLEX-MONTOISON   | Fuite sur PVC 75                                 | SERVICE MAINTENANCE  | ATU 2025071001040                   | Clôturé          | ALLEX: Chemin du Romarin                  |
| INT25080016  | RESEAU ALLEX-MONTOISON   | Fuite sur PVC 50 avec renouvellement d'une vanne | SERVICE MAINTENANCE  | ATU 20250730001124                  | Clôturé          | ALLEX; Route des Moutiers                 |
| INT25080031  | RESEAU ALLEX-MONTOISON   | Fuite sur ventouse (n°104)                       | SERVICE EXPLOITATION | Fuite sur ventouse (n°104)          | Clôturé          |                                           |
| INT25080023  | RESEAU ALLEX-MONTOISON   | Fuite Tuyau PVC 75 (Borne 132)                   | SERVICE MAINTENANCE  | ATU 2025081100039                   | Clôturé          | AMBONIL : Chemin des grandes Terres       |
|              |                          |                                                  |                      |                                     |                  |                                           |
| INT24110069  | RESEAU CREST NORD        | Reprise vidange                                  | SERVICE MAINTENANCE  | DICT 2024110600651                  | Clôturé          | VAUNAVEYS LA ROCHETTE: Chemin de Pichatte |
|              |                          |                                                  |                      |                                     |                  |                                           |
| INT25060067  | RESEAU GRANE             | Fuite                                            | SERVICE EXPLOITATION | Remplacement joint en pied de borne | Clôturé          | Borne B5                                  |
| INT25080012  | RESEAU GRANE             | Reprise vidange                                  | SERVICE MAINTENANCE  | Reprise vidange                     | Clôturé          |                                           |
|              |                          |                                                  |                      |                                     |                  |                                           |
| INT25030002  | RESEAU LORIOL-CLIOUSCLAT | Fuite sur PVC Dn 110                             | SERVICE EXPLOITATION | Réparation fuite sur PVC Dn 110 mm  | Clôturé          |                                           |
| INT25040009  | RESEAU LORIOL-CLIOUSCLAT | Fuite sur PVC Dn 110                             | SERVICE MAINTENANCE  | ATU 2025032800742                   | Clôturé          | LORIOL: Chemin des Sarrevin               |

**SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS**

**Siège :** 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

| Intervention | Equipement - Ouvrages                                   | Objet                                                                     | Service gestionnaire   | Description                                                                                                                                                                                                            | Etat des travaux | Lieu d'intervention |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| INT25070039  | RESERVOIR EURRE (Chauffonde)                            | Sonde de niveau en défaut.                                                | SERVICE MAINTENANCE    | Sonde de niveau en défaut.                                                                                                                                                                                             | Clôturé          |                     |
| INT25070033  | SEUIL SMARD                                             | Curage seuil - Passe à Poissons et prise d'eau                            | CELLULE GRANDS PROJETS | Curage seuil - Passe à Poissons et prise d'eau                                                                                                                                                                         | Clôturé          |                     |
| INT25080002  | SEUIL SMARD                                             | Nettoyage grilles seuil SMARD                                             | CELLULE GRANDS PROJETS | Nettoyage grilles seuil SMARD                                                                                                                                                                                          | Clôturé          |                     |
| INT25080030  | SEUIL SMARD                                             | Ouverture fermeture réglage de la vanne du seuil SMARD sur la saison 2025 | SERVICE EXPLOITATION   | Ouverture fermeture réglage de la vanne du seuil SMARD sur la saison 2025                                                                                                                                              | Clôturé          |                     |
| INT25030042  | STATION ALLEX - MARAIS/BT                               | Remplacement de la pile au DGBT - Allex/Montoison                         | PROJET ELECTRICITE     | Remplacement de la pile au DGBT - Allex/Montoison                                                                                                                                                                      | Clôturé          |                     |
| INT25070062  | STATION ALLEX - MARAIS/ELECTROPOMPES/G4/POMPE           | Dépose de la pompe pour dépannage à la station les Passés P2              | SERVICE MAINTENANCE    | Dépose / repose de la pompe avec les rallonges de tubes de refoulements.<br>16/06/2024 > Dépose de la pompe pour dépannage puits N° 2 Les passés<br>28/08/2025 > Repose de la pompe (Crépine aspiration à 10 mètres)   | Clôturé          |                     |
| INT25110061  | STATION ALLEX - MARAIS/MARAI - EXTERIEURS               | Elagage sous la ligne HTA alimentant la STEP d'Allex                      | SERVICE EXPLOITATION   | Elagage à la demande de la commune de de VEOLIA                                                                                                                                                                        | Clôturé          |                     |
| INT24040009  | STATION ALLEX-MARAISHYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION      | Inspection sans ouverture ( 2 ans )                                       | SERVICE MAINTENANCE    | Inspection sans ouverture ( 2 ans )                                                                                                                                                                                    | Clôturé          |                     |
| INT25020010  | STATION CHAUFFONDE/CHAUFFONDE - EXTERIEURS              | Remise en état des caillbotis autour des pompes / risque de chute.        | SERVICE MAINTENANCE    | Remise en état des caillbotis autour des pompes / risque de chute.                                                                                                                                                     | Clôturé          |                     |
| INT25050017  | STATION CHAUFFONDE/ELECTROPOMPES/G1/MOTEUR              | Moteur 250 kW en défaut > Tête de chignon coupée                          | SERVICE MAINTENANCE    | Moteur 250 kW en défaut > Tête de chignon coupée                                                                                                                                                                       | Clôturé          |                     |
| INT24090154  | STATION CHOMEANE/POMPAGE/BT                             | Travaux de conformité électrique                                          | SERVICE MAINTENANCE    | I.M * TGBT TR1 – DISJONCTEUR « COFFRET SERVITUDE » : Circuit non mis hors tension par la manoeuvre du sectionneur général (disjoncteur). Apposer une étiquette de couleur rappelant cette particularité                | Clôturé          |                     |
| INT23110001  | STATION CHOMEANE/POMPAGE/ELECTROPOMPES/G6/MOTEUR        | Contrôle et révision moteur (315 kW)                                      | SERVICE MAINTENANCE    | Contrôle et révision moteur (315 kW) > Voir Cde 23100001 (BMI)                                                                                                                                                         | Clôturé          |                     |
| INT25010016  | STATION CHOMEANE/POMPAGE/HYDRAULIQUE                    | entretien regulation amont aval                                           | SERVICE EXPLOITATION   | entretien regulation amont aval                                                                                                                                                                                        | Clôturé          |                     |
| INT24100035  | STATION CHOMEANE/POMPAGE/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION | Inspection avec ouverture ( 4 ans )                                       | SERVICE MAINTENANCE    | Inspection avec ouverture ( 4 ans )                                                                                                                                                                                    | Clôturé          |                     |
| INT25080014  | STATION GRANE/BT                                        | Remplacement du disjoncteur moteur P3                                     | PROJET ELECTRICITE     | Remplacement du disjoncteur moteur P3                                                                                                                                                                                  | Clôturé          |                     |
| INT25060086  | STATION GRANE/ELECTROPOMPES/G2/POMPE                    | Boite à roulement très bruyante ; à 56 gE                                 | SERVICE MAINTENANCE    | Remplacement des roulements                                                                                                                                                                                            | Clôturé          |                     |
| INT24100029  | STATION GRANE/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION            | Inspection avec ouverture ( 4 ans )                                       | SERVICE MAINTENANCE    | Inspection avec ouverture ( 4 ans )                                                                                                                                                                                    | Clôturé          |                     |
| INT24090028  | STATION LA POULATTE/BT                                  | Contrôle électrique automne 2024                                          | PROJET ELECTRICITE     | Contrôle électrique automne 2024                                                                                                                                                                                       | Clôturé          |                     |
| INT24120058  | STATION LA POULATTE/Palan                               | VGP levage ( 1 an )                                                       | SERVICE MAINTENANCE    | VGP levage ( 1 an )                                                                                                                                                                                                    | Clôturé          |                     |
| INT24120050  | STATION LES ROUSSONS/Pont roulant                       | VGP levage ( 1 an )                                                       | SERVICE MAINTENANCE    | VGP levage ( 1 an )                                                                                                                                                                                                    | Clôturé          |                     |
| INT24090050  | STATION MENEURET/HTA                                    | Maintenance préventive HTA C3 - Automne 2024 - Menuret                    | PROJET ELECTRICITE     | Maintenance préventive HTA C3 - Automne 2024 - Menuret                                                                                                                                                                 | Clôturé          |                     |
| INT24090123  | STATION PICOLIÈRES/BT                                   | Travaux de conformité électrique                                          | SERVICE EXPLOITATION   | B.M * TGBT – PROTECTION DU SECONDAIRE DU TRANSFORMATEUR TR2 : Calibre du dispositif de protection trop élevé (3 disjoncteurs en parallèle de 10 A). Placer en amont de ces 3 disjoncteurs un disjoncteur calibré à 1 A | Clôturé          |                     |
| INT24100033  | STATION PICOLIÈRES/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION       | Inspection avec ouverture ( 4 ans )                                       | SERVICE MAINTENANCE    | Inspection avec ouverture ( 4 ans )                                                                                                                                                                                    | Clôturé          |                     |

## SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

**Siège** : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

## Opération en cours au 30/11/2025

| Intervention | Equipement                                          | Objet                                            | Service gestionnaire | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etat des travaux | Lieu d'intervention |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| INT24090134  | MAISON PICOLIERES                                   | Travaux de conformité électrique                 | SERVICE EXPLOITATION | <p>P.E * Les luminaires du garage ne sont pas mis à la terre. A raccorder.</p> <p>B.M * Dans le garage, remplacer le prolongateur défectueux</p> <p>B.M * Dans le garage extérieur, déposer le bloc de prise de courant (ancienne version).</p> <p>P.M * Dans le bureau, remplacer la prise de courant du haut car la prise de terre est cassée.</p> <p>P.E * Dans le bureau, raccorder les luminaires à la terre.</p> <p>P.M * Dans le local chauffe-eau, absence de liaison à la terre de la tuyauterie galva.</p> | En cours         |                     |
| INT25090071  | STATION GRANE/BT                                    | Contrôle électrique automne 2025                 | PROJET ELECTRICITE   | Contrôle électrique automne 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En cours         |                     |
| INT25090067  | STATION LES ROUSSENS/BT                             | Contrôle électrique automne 2025                 | PROJET ELECTRICITE   | Contrôle électrique automne 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En cours         |                     |
| INT25110025  | STATION LES ROUSSENS/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION | Inspection sans ouverture ( 2 ans )              | SERVICE MAINTENANCE  | Inspection sans ouverture ( 2 ans )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En cours         |                     |
| INT25090068  | STATION MENURET/BT                                  | Contrôle électrique automne 2025                 | PROJET ELECTRICITE   | Contrôle électrique automne 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En cours         |                     |
| INT25110028  | STATION MENURET/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION      | Requalification / Epreuve hydraulique ( 10 ans ) | SERVICE MAINTENANCE  | Requalification / Epreuve hydraulique ( 10 ans )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En cours         |                     |

### SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

**Siège** : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)
