



TERRITOIRE DE LA VALDAINE

Réseaux de RHÔNE MONTELMAR (Nord et Sud) et MARSANNE

Année 2025

Rapport d'activité

1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE DE RHONE MONTELMAR	4
1.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE	4
1.2 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS	4
1.2.1 Réseau Montélimar-Sud.....	4
1.2.2 Réseau Montélimar-Nord	5
1.2.3 Réseau Marsanne.....	6
2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025	7
2.1 ORIGINE DE L'EAU	7
2.2 VENTE D'EAU.....	7
2.3 RENDEMENT DES RESEAUX	9
2.4 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES	9
2.4.1 Réseau Rhône Montélimar Sud.....	9
2.4.2 Réseau Rhône Montélimar Nord.....	10
2.4.1 Réseau Marsanne.....	10
3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES.....	11
3.1 SECURITE PUBLIQUE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES	11
3.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE	11
3.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION.....	11
3.4 CONTROLE CONFORMITE DISPOSITIFS DE LEVAGE	12
4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025.....	13
4.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT	13
4.1.1 Objectifs	13
4.1.2 Travaux réalisés ou en cours	13
4.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN.....	14
4.3 TRAVAUX FACTURES	14
4.4 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2024	15
5- GESTION CLIENTELE.....	16

5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU.....	16
5.1.1 Tarification Agence de l'eau	16
5.1.2 Tarification pour les non professionnels	16
5.1.3 Tarification pour les professionnels	16
5.2 RELATIONS IRRIGANTS.....	18
5.2.1 Continuité de service	18
5.2.2 Informations des irrigants	19
5.2.3 Arrêtés « secheresse »	19
6- LES PROJETS DU TERRITOIRE.....	20
6.1 MAILLAGE ENTRE LE RESEAU RHONE-MONTELMAR NORD et MARSANNE	20
6.2 INVENTAIRE DES CONDUITES A RISQUE	20
7- DONNEES FINANCIERES	21
7.1 COMPTABILITE ANALYTIQUE	21
7.1.1 Fonctionnement	21
7.1.2 Investissement	22
7.2 IMPAYES.....	22
7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE	22
8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS	23
9- ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	24

1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE DE RHONE MONTELIMAR

1.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE

Communes concernées : Allan, La Bâtie-Rolland, La Bégude-de-Mazenc, Châteauneuf-du-Rhône, Espeluche, La Laupie, Malataverne, Montélimar, Montboucher-sur-Jabron, Portes-en-Valdaine, Saint-Marcel-lès-Sauzet, La Touche, Puygiron, Rochefort-en-Valdaine, Savasse, Sauzet, Bonlieu-sur-Roubion, Charols, Cléon d'Andran, Condillac, La Coucourde, les Tourettes, Manas, Marsanne, Pont-de-Barret, Puy-Saint-Martin, Roynac, Saint-Gervais-sur-Roubion, Salette.

1.2 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

Le Territoire est desservi par 3 réseaux :

- Réseau Montélimar-Sud alimenté par la station de pompage de Dachet
- Réseau Montélimar-Nord alimenté par la station de pompage des Roches
- Réseau de Marsanne alimenté par la station de pompage de la Coucourde

1.2.1 RESEAU MONTELIMAR-SUD

Station de pompage de Dachet

Prise d'eau par siphon dans le canal du Rhône sur le plan d'eau de l'aménagement hydroélectrique de Montélimar.

Un dégrilleur vertical

Pompage :

8 pompes à ligne d'arbre 600 m³/h à 230 m HMT

2 pompes à ligne d'arbre 320 m³/h à 230 m HMT

Capacité de pompage de 4 500 m³/h à 230 m HMT (pouvant être ponctuellement portée à 4 800 m³/h)

Puissance ENEDIS souscrite : de 20 à 4 800 Kw (segment C2 : HTA Télélevé)

Surpresseur de Pancrasse

6 pompes horizontales 620 m³/h à 135 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : de 10 à 1 700 Kw (segment C2 : HTA Télélevé)

Réseaux

Linéaire de conduites (réseaux Montélimar Nord et Montélimar Sud) : 747 Km

1.2.2 RESEAU MONTELIMAR-NORD

Station de pompage des Roches

Prise d'eau dans le canal du Rhône sur le plan d'eau de l'aménagement hydroélectrique du logie neuf. La station de pompage des Roches alimente le réservoir de Savasse (réseau fonctionnant en refoulement-distribution)

6 pompes de 900 m³/h à 150 m HMT

Fonctionnement de 4 pompes en parallèles : Capacité de pompage de 3 600 m³/h à 150 m HMT (pouvant être ponctuellement portée à 4 500 m³/h)

Puissance ENEDIS souscrite : de 0 à 2 100 Kw (segment C2 : HTA Télérelevé)

Réservoir de Savasse

Surpresseur de la Laupie

2 pompes de 180 m³/h à 50 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : de 6 à 90 Kw (Segment C4 : B.T. > 36 Kw)

Surpresseur de Collet

2 pompes de 100 m³/h à 50 m HMT

1 pompe de 20 m³/h à 55 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : de 6 à 48 Kw (Segment C4 B.T. > 36 Kw)

Réseaux

Linéaire de conduites (réseaux Montélimar Nord et Montélimar Sud) : 747 Km

Station de pompage de la Coucourde

Prise d'eau dans le canal du Rhône sur le plan d'eau de l'aménagement du logis neuf.

Un dégrilleur vertical

Pompage :

5 pompes à ligne d'arbre 1 700 m³/h à 330 m HMT (dont 1 en secours)

Capacité de pompage de 6 800 m³/h, HMT 330 m

Puissance ENEDIS souscrite : de 0 à 8 000 Kw (Segment C2 HTA Télérelevé HTA5 – CU)

Auxiliaires :

Puissance ENEDIS souscrite : de 50 kw (Segment C3 HTA non Télérelevé HTA5 – CU)

Réservoir :

Réservoir : brise charge de 700 m³

Réseaux

Adduction : (entre la station de pompage et le réservoir) :

Linéaire de conduite : 3.5 Km Dn 900 mm en acier

Distribution :

Linéaire de conduites : 136 Km essentiellement en fonte ductile

2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025

2.1 ORIGINE DE L'EAU

L'eau distribuée sur le territoire de la Valdaine provient uniquement du fleuve Rhône.

Réseaux	Ouvrage	Localisation	Ressource	Volume annuel prélevé (m3)	Volume annuel autorisé ⁽¹⁾	Volume étiage prélevé (m3)	Volume étiage autorisé ^(1 - 2)
Marsanne	La Coucourde	LA COUCOURDE	Rhône	6 588 539	11 051 000	3 267 000	5 959 622
Montélimar Nord	Les Roches	SAVASSE	Rhône	3 137 467	4 903 000	1 980 588	2 707 685
Montélimar sud	Dachet	CHATEAUNEUF DU RHONE	Rhône	4 970 000	8 400 000	3 267 000	5 079 750
Total VALDAINE				14 696 006	24 354 000	8 514 588	13 747 057

(1) Arrêté de régularisation des prises d'eau dans le Rhône DDT-SEF-2025-01068 du 16/07/2025 géré par la DREAL

(2) Etiage : mois de juin-juillet-Aout-Septembre pour bassin versant du Rhône

2.2 VENTE D'EAU

PROFESSIONNELS PAR RESEAUX								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre prises	nombre de clients	Debit souscrits par ha	Conso annuelle par ha
Marsanne	9 645	1 551	4 671 635	4 671 635	327	112	6,22	3 013
Nord	6 260	873	1 684 200	1 684 200	262	77	7,17	1 929
Sud	9 890	1 445	3 399 789	3 399 789	382	143	6,85	2 354
Total	25 795	3 868	9 755 624	9 755 624	971	332		


COLLECTIVITES PAR RESEAUX								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre prises	nombre de clients	Debit souscrits par ha	Conso annuelle par ha
Marsanne	345	39	125 702	125 702	23	10	8,96	3 265
Nord	30	5	14 444	14 444	3	2	6,67	3 210
Sud	905	127	135 312	135 312	43	13	7,13	1 065
Total	1 280	170	275 458	275 458	69	25		

NON PROFESSIONNELS PAR RESEAUX								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre prises	nombre de clients	Debit souscrits par ab	Conso annuelle par ab	Facturati on annuelle par ab
Marsanne	821	91 598	91 598	221	217	3,71	414	414
Nord	1370	76 183	76 183	226	219	6,06	337	337
Sud	1335	51 764	51 764	214	214	6,24	242	242
Total	3 526	219 545	219 545	661	650			


TOTAL PAR RESEAUX							
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre prises	nombre de clients	
Marsanne	10 811	1 589	4 888 935	4 888 935	571	339	
Nord	7 660	878	1 774 827	1 774 827	491	298	
Sud	12 130	1 572	3 586 865	3 586 865	639	370	
Total	30 601	4 038	10 250 627	10 250 627	1701	1007	


Synthèse par type de consommateurs				
Type	nombre prises	nombre de clients	conso (m3)	Facturation (m3)
PRO	971	332	9 755 624	9 755 624
COLLECTIVITE	69	25	275 458	275 458
NON PRO	661	650	219 545	661
Total	1701	1007	10 250 627	10 031 743

Répartition des volumes par réseaux

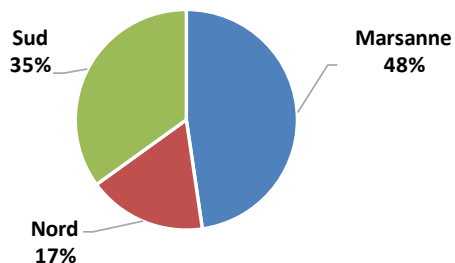

Répartition des irrigants par type



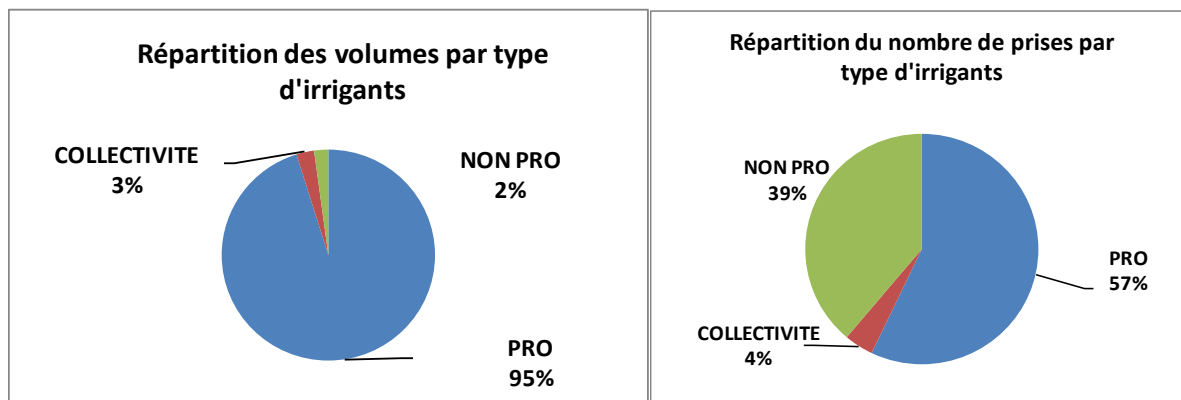

2.3 RENDEMENT DES RESEAUX

Le rendement correspond au rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers et le volume d'eau prélevé et introduit dans le réseau de distribution.

Réseaux	Rendement
Marsanne	74,20%
Montélimar Nord	56,57%
Montélimar sud	72,17%

2.4 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

2.4.1 RESEAU RHONE MONTELMAR SUD

La consommation totale pour l'année 2025 est de 4 764 678 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,328
Kwh/m3 prélevé	0,959
€/m3 consommé	0,084
€/kwh	0,063

Remarques : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

2.4.2 RESEAU RHONE MONTELIMAR NORD

La consommation totale pour l'année 2025 est de 1 813 369 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,022
Kwh/m3 prélevé	0,578
€/m3 consommé	0,070
€/Kwh	0,068

Remarques : ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

2.4.1 RESEAU MARSANNE

La consommation totale pour l'année 2025 est de 5 924 047 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	1,212
Kwh/m3 prélevé	0,899
€/m3 consommé	0,075
€/Kwh	0,062

Remarques : ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

3.1 SECURITE PUBLIQUE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Néant : aucun ouvrage n'est soumis à la réglementation « sécurité publique des ouvrages hydrauliques » sur ce territoire.

3.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE

Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Marsanne				
Sites	Observations	Conventions	Visite précédente	Visite suivante
La Coucourde	La Coucourde	CAPARA	14 novembre 2023	2026
Vanne de Condillac	Condillac	CAPARA	22 février 2023	2026

Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Montélimar				
Sites	Observations	Conventions	Visite précédente	Visite suivante
Collet	Savasse	CAPARA	27 novembre 2024	2027
Dachet	Châteauneuf du Rhône	CAPARA	27 novembre 2024	2027
Les Roches	Savasse	CAPARA	2 décembre 2025	2028
Pancrace	Montboucher sur jabron	CAPARA	2 décembre 2025	2028
La Laupie	La Laupie	CAPARA	14 novembre 2023	2026

3.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION

Date	Appareil	Volume – Pression de service	Type d’inspection	Non- conformité	Organisme inspecteur
Station de pompage de Dachet					
11/2022	CHARLATTE n° 20000038	20 000 l – 30 b	Contrôle périodique	Néant	nc
01/2019			Requalification décennale	Néant	ASAP
11/2024			Inspection sans ouverture	Néant	SOCOTEC
Station de pompage de la Coucourde					
2014	CHARLATTE n°20000105	20 000 l – 40 b	Requalification décennale	néant	ASAP
2020			Contrôle périodique	néant	nc

03/2024			Requalification décennale	néant	ASA/SOCOTEC
2014	CHARLATTE n°20000106	20 000 l – 40 b	Requalification décennale	néant	ASAP
2020			Contrôle Périodique	néant	nc
03/2024			Requalification décennale	néant	ASAP/SOCOTEC
Station de pompage des Roches					
2016	MITEC	10 000 l – 15 b	Epreuve d’origine		
11/2022			Contrôle périodique	Pb réglementaire	
01/2026			Ajout soupape de sécurité		
Surpresseur de Pancrasse					
04/1993	CHARLATTE n°10000.156	10 000 l – 25 b	Epreuve initiale	Néant	DRIRE
			Non réalisée		

3.4 CONTROLE CONFORMITE DISPOSITIFS DE LEVAGE

Néant

4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025

4.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT

4.1.1 OBJECTIFS

Classés par ordre de priorité

- 1/ Organes hors service à la suite de la saison précédente
- 2/ Organes dont l'état ou le niveau d'usure laisse craindre une rupture à court terme 1,2 ou 3 ans
- 3/ Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation sécurité des travailleurs
- 4/ Amélioration des performances énergétiques
- 5/ Dégradations de caractéristiques techniques
- 6/ Amélioration de la facilité d'exploitation d'un ouvrage
- 7/ Mise en conformité vis-à-vis des exigences techniques de tiers (ENEDIS, agence de l'eau etc...)
- 8/ Amélioration de la fiabilité de fonctionnement de l'ouvrage
- 9/ Lutte contre les risques d'intrusions, de dégradations, sécurité des riverains
- 10/ Amélioration des fonctionnalités de report d'information et de suivi
- 11/ Réduction des nuisances à des tiers (bruits etc...)

4.1.2 TRAVAUX REALISES OU EN COURS

Ouvrages	OBJET	n° PROJET AT	Planificatio
Réseau Marsanne	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025		fait 2025
Réseau Montélimar Nord	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025		fait 2025
Réseau Montélimar Sud	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2024-2025		fait 2025
SP Dacht	Groupe G3 : Renouvellement moteur (560 kw) + câbles	PR 24 02 0002	fait 2025
SP Dacht	Rénovation ballon anti-bélier	PR 24 09 0002	fait 2025
SP La Coucourde	Groupe G1-G2-G3 : Rénovation(2) - Renouvellement (1) clapet anti-retour + renouvellement 3 vannes	PR 25 01 0012	fait 2025
Surp Pancrace	Renouvellement débitmètre	PR 24 11 0004	fait 2025

Opération en cours de réalisation au 30/11/2025		
Ouvrages	OBJET	n° PROJET AT
Réseau Marsanne	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026	PR25100030
Réseau Montélimar Nord	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026	PR25100030
Réseau Montélimar Sud	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) Prog 2025-2026	PR25100030
SP Les Roches	G6 : Renouvellement du clapet	PR25100009
SP Dacht	Groupe G1 : Renouvellement moteur (315 Kw)	
SP Dacht	Groupe G3 : Renouvellement vanne d'isolement - clapet anti-retour	
SP Dacht	Groupe G4 : Renouvellement ou rénovation pompe G4	
SP Dacht	Groupe G4 : Renouvellement vanne d'isolement - clapet anti-retour	
SP Dacht	Groupe G5 : Rénovation moteur rebobinage	PR 25 08 0007
SP Dacht	Groupe G7: Renouvellement moteur (560 Kw)	
SP Dacht	HTA : mise en sécurité des transformateurs DGPT2	
SP La Coucourde	Groupe G5 : Rebobinage ou renouvellement moteur	PR 25 07 0007
Surp Pancrace	G2 : Renouvellement ou rebobinage moteur (200 Kw)	PR 24 07 0004
Surp Pancrace	G4 : Renouvellement pompe+ stab de protection	PR 23 10 0008

Les charges correspondantes sont imputées au budget « investissement » du SID.

4.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Les principales interventions réalisées en 2025 au titre des travaux d'entretien et de maintenance sont fournies en annexe. Les charges correspondantes sont imputées au budget « fonctionnement » du SID.

4.3 TRAVAUX FACTURES

Désignation	Nb
Fourniture et pose compteur (1 - 3 - 5 m3/h)	1
Réparation borne endommagée par tiers	0
Réparation conduite endommagée par tiers	0
Modification d'un borne existante (modif débit)	1
Création branchement sur réseau gravitaire	0
Création branchement sur réseau pression	0
Création borne ou sortie sur borne existante	5
Déplacement borne	0
Déplacement sortie borne	0
Extension de réseau	0
Déplacement non justifié d'un agent	0
Remise en conformité de borne	0
Remise en conformité d'un branchement ou poste de comptage	1
Renouvellement compteur	0
Repose compteur suite à impayés	2
Participation au déplacement d'une conduite	0

4.4 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2024

Néant

5- GESTION CLIENTELE

5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU

5.1.1 TARIFICATION AGENCE DE L'EAU

Pour la saison 2025, la facturation de la redevance agence de l'eau uniformisée au SID fixée par délibération du 28 janvier 2025 est de 0,009 € H.T. /m3 consommé et 14.45 € H.T. par l/s pour les abonnements gravitaires.

5.1.2 TARIFICATION POUR LES NON PROFESSIONNELS

Le prix de vente pour les particuliers est uniformisé sur l'ensemble du territoire du SID.

Les tarifs du service sont fixés par la délibération du 28 janvier 2025.

- Une prime fixe en fonction du débit souscrit

1 m3/h	75,45 € HT	79,60 € TTC
3 m3/h	97,97 € HT	103,36 € TTC
5 m3/h	129,33 € HT	136,44 € TTC
10 m3/h	215,54 € HT	227,39 € TTC
15 m3/h	368,00 € HT	388,24 € TTC
20 m3/h	525,72 € HT	554,63 € TTC
30 m3/h	683,43 € HT	721,02 € TTC

- Un tarif de 0,17 €/m³ HT par m³ consommés
- Un tarif de 0,01 €/m³ HT par m³ consommés pour surcoût énergie

5.1.3 TARIFICATION POUR LES PROFESSIONNELS

Le tarif professionnel n'est accordé qu'aux abonnés pouvant justifier d'un numéro SIRET en lien avec le titulaire du contrat d'abonnement.

Pour la saison 2025, le prix de vente sur le territoire de la Valdaine a été fixé à (délibération du 28 janvier 2025) :

RESEAU MONTELIMAR SUD

Part fixe

Abonnement à la surface ha 116.13€ H.T.

Abonnement au débit m³/h 16.31 € H.T.

Part au m³ 0,093 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de 566.30 € H.T./ha pour 1 borne pour 1 ha et 7 m³/h - 3000 m³/ha

RESEAU MONTELIMAR NORD

Part fixe

Abonnement à la surface ha 116.13 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 10,56 € H.T.

Part au m³ 0,093 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de 526.05 € H.T./ha pour 1 borne pour 1 ha et 7 m³/h - 3000 m³/ha

RESEAU MARSANNE

Part fixe

Abonnement à la surface ha 179.48 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 14,78 € H.T.

Part au m³ 0,104 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture de 651.94 € H.T./ha pour 1 borne pour 1 ha et 7 m³/h - 3000 m³/ha

5.2 RELATIONS IRRIGANTS

5.2.1 CONTINUITE DE SERVICE

Mise en service et arrêt des réseaux

Mise en service	Ouvrages	Réseau	Arrêt
31-mars	SP La Coucourde	Marsanne	27-oct
26-mars	SP Les Roches	Montélimar nord	27-oct
25-mars	SP Dacht	Montélimar sud	27-oct

Problème de ressources : Néant

Problèmes de capacité de pompage par rapport à la demande : Néant

Problèmes de fonctionnement d'ouvrages :

- *Coupures d'alimentation électrique (ENEDIS)* :

Date	Ouvrage	Durée	Type
03-oct	SP La Laupie	0h11	non programmée

- *Incident de fonctionnement* : Néant

Problèmes de fonctionnement des réseaux :

- *Réseau Montélimar Sud* : néant
- *Réseau Montélimar Nord* : néant
- *Réseau Marsanne* : néant

5.2.2 INFORMATIONS DES IRRIGANTS

Date	Événement	Mode diffusion
18-févr.	Réunion annuelle des irrigants du territoire	Réunion à Marsanne
05-mai	Chasses sédimentaires sur le Rhône => risque hausse turbidité => demande de réduction des consommations	Mail
11-juin	Info Problème de transmission des factures des irrigants PRO de la part du Trésor public	Mail

5.2.3 ARRETES « SECHERESSE »

Néant

6- LES PROJETS DU TERRITOIRE

6.1 MAILLAGE ENTRE LE RESEAU RHONE-MONTELMAR NORD ET MARSANNE

Etude des possibilités de maillages entre les réseaux Rhône Montélimar Nord et Marsanne afin de disposer d'un secours partiel entre les 2 réseaux.

Ce projet n'a pas reçu à ce jour l'aval des délégués du territoire.

6.2 INVENTAIRE DES CONDUITES A RISQUE

Un inventaire des conduites présentant des risques pour la sécurité de tiers à la suite de l'absence de prise en compte de leur existence lors des opérations d'urbanisme ou d'aménagement (conduites implantées sous ou à proximité d'habitations ou de bâtiments de tiers) a été réalisé.

Le programme et le financement du déplacement de ces conduites n'est pas été mis en place à ce jour.

7- DONNEES FINANCIERES

7.1 COMPTABILITE ANALYTIQUE

7.1.1 FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement	MARSANNE- VALDAINE
Energie et autres fluides	800 659,52
Entretien stations réseaux	206 362,30
Charges de personnel	206 533,07
Redevances et Taxes (foncier,VNF,SNCF,CFE,etc...)	21 561,75
Transfert investissements (Renouvellement - Rb emprunt)	581 021,25
Autres charges	20 895,62
Charges exceptionnelles	982,76
Frais généraux Antenne d'exploitation	54 015,18
Frais généraux siège	646 420,27
TOTAL	2 538 451,72

Recettes de fonctionnement	MARSANNE- VALDAINE
Travaux en Régie	12 833,48
Amortissement subventions	180 693,00
Vente d'eau	2 160 167,41
Redevances agence de l'eau ou autres	93 483,22
Travaux et prestations facturés	7 213,78
Energie réservée	113 554,81
Divers	134 847,77
Produits exceptionnels	12 856,07
TOTAL	2 715 649,54
Résultat exercice	177 197,82

Le résultat est bénéficiaire, même s'il se dégrade par rapport à 2024 (707.790€), du fait de la baisse du produit de l'énergie réservée.

7.1.2 INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	MARSANNE- VALDAINE
Dépenses d'équipement	139 105,56
Amortissement des subventions	180 693,00
Quote-part dépenses siège	27 662,14
TOTAL	347 460,70

Recettes d'investissement	MARSANNE- VALDAINE
Amortissements	581 021,25
Subventions	5 642,50
Quote-part recettes antenne	728,65
Quote-part recettes siège	22 213,54
TOTAL	609 605,94
Résultat exercice	262 145,23

7.2 IMPAYES

Territoire	2022	2023	2024	2025 hors conso	Total général
Marsanne Montelimar	26 869	26 285	30 536	44 341	128 030

Nous constatons une progression des impayés depuis 2023, dans un contexte agricole marqué par plusieurs années de tension sur les revenus et les trésoreries.

7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE

Néant

8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS

Le Syndicat d'Irrigation Drômois souhaite attirer l'attention de tous ses membres sur les difficultés rencontrées dans la gestion du développement des constructions sur les communes. Les réseaux d'irrigation sont essentiellement implantés en terrain privé et ont été créés sans l'inscription des servitudes associées au service de la propriété foncière. Les propriétaires se sont engagés à informer leur successeur de la présence de la servitude lors de toute opération de vente. Malheureusement, cette démarche est rarement effectuée. Certains propriétaires ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître la présence d'une canalisation sous leur terrain. Cette situation a plusieurs conséquences notamment dans les zones urbanisées:

- Risque pour les riverains en cas de rupture de conduite : la pression d'un réseau d'irrigation est comprise entre 10 et 25 bars !!!!
- Difficultés d'intervention pour les équipes du SID pouvant entraîner une rupture de la continuité du service pendant plusieurs jours.
- Dégradations potentielles des équipements du SID en cas de terrassement par le propriétaire ou son prestataire

Nous demandons donc aux communes :

- de bien vouloir signaler la présence des canalisations d'irrigation lors de tout document urbanisme (certificat d'urbanisme – déclaration de travaux – permis de construire – permis de lotir – permis d'aménager etc...). Seule la concertation amont avec les porteurs de projet permettra au SID d'étudier des solutions techniques et économiques permettant de rendre les projets compatibles avec la présence des réseaux d'irrigation
- de ne pas classer constructible les parcelles avec une canalisation d'irrigation sans concertation au préalable avec le SID
- de rappeler à tous les porteurs de projet la nécessité de faire les démarches **obligatoires** de DT : déclaration de projet de travaux (à faire par le Maître d'ouvrage) et DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux (à faire par l'entreprise de terrassement) auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) : fichier regroupant les plans des réseaux de tous les gestionnaires y compris le SID. Cette démarche doit être faite également en terrain privé.

Nous souhaitons également attirer l'attention des communes sur les points suivants :

- le SID n'a pas les moyens de régulariser les servitudes liées à ses canalisations
- le SID n'a pas les moyens financiers de prendre seul en charge les déplacements de conduite

Nous comptons sur la vigilance de tous et notamment des communes pour éviter les situations que nous avons connues ces dernières années.

9- ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Intervention	Équipement - Réseaux	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25010006	RESEAU MARSANNE	Réparation de fuite	SERVICE EXPLOITATION	réparation de fuite	Clôturé	CLEON D'ANDRAN : impasse Miomeye
INT25060013	RESEAU MARSANNE	réparation de fuite pour le moi de mai secteur Marsanne	SERVICE EXPLOITATION	réparation de fuite pour le moi de mai secteur Marsanne	Clôturé	BONLIEU SUR ROUBION: route de Marsanne
INT25060063	RESEAU MARSANNE	Réparation de fuite	SERVICE EXPLOITATION	Réparation de fuite	Clôturé	MARSANNE: chemin de bonlieu
INT25060032	RESEAU MARSANNE	Maintenance sur stabilisateur de pression	SERVICE EXPLOITATION	Maintenance sur stabilisateur de pression	Clôturé	
INT25100038	RESEAU MARSANNE	problème de comptage	SERVICE EXPLOITATION	problème de comptage	Clôturé	borne BEAUMOND
INT25100037	RESEAU MARSANNE	Pièce entretien de réseau	SERVICE EXPLOITATION	Pièce entretien de réseau	Clôturé	
INT25110034	RESEAU MARSANNE	Réparation fuite Dn 200 mm	SERVICE EXPLOITATION	Réparation fuite Dn 200 mm	Clôturé	
INT25080034	RESEAU MARSANNE	réparation de fuite	SERVICE EXPLOITATION	réparation de fuite	Clôturé	CLEON D'ANDRAN: Champrond
INT25100054	RESEAU MARSANNE	CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE VANNE+ STABILISATEUR	SERVICE EXPLOITATION	CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE VANNE+ STABILISATEUR	Clôturé	
INT25100040	RESEAU MARSANNE	entretien stabilisateur aval réseau Marsanne	SERVICE EXPLOITATION	entretien stabilisateur aval réseau Marsanne	Clôturé	
INT25040019	RESEAU MONTÉLIMAR NORD	Fuite conduite Dn 100 mm Fonte grise	SERVICE EXPLOITATION	Fuite conduite Dn 100 mm Fonte grise	Clôturé	
INT25060014	RESEAU MONTÉLIMAR NORD	Réparations de fuites	SERVICE EXPLOITATION	Réparations de fuites: LA LAUPIE chemin de Peyrieux SAUZET route de Condillac MONTELMAR la combe Bernardine	Clôturé	LA LAUPIE - SAUZET - MONTELMAR
INT25060065	RESEAU MONTÉLIMAR NORD	sondage canalisation	SERVICE EXPLOITATION	sondage canalisation	Clôturé	SAVASSE: chemin des Gilles
INT25090021	RESEAU MONTÉLIMAR NORD	REPARATION DE FUITE	SERVICE EXPLOITATION	REPARATION DE FUITE	Clôturé	L'HOPITAL
INT25070008	RESEAU MONTÉLIMAR NORD	REPARATION DE FUITE	SERVICE EXPLOITATION	REPARATION DE FUITE	Clôturé	MONTBOUCHER: chemin de Pancrace
INT25050013	RESEAU MONTÉLIMAR NORD	RESEAU REPARATION DE FUITE MOIS DE MARS	SERVICE EXPLOITATION	RESEAU REPARATION DE FUITE MOIS DE MARS: SAVASSE : Chemin du bois de Laud, MONTELMAR : Chemin des Oliviers SAVASSE : Chemin de bousserole SAVASSE : Chemin de martel SAVASSE : Chemin de la Gardette	Clôturé	Divers
INT25020030	RESEAU MONTÉLIMAR SUD	Renouvellement d'un tampon de regard	SERVICE EXPLOITATION	Renouvellement d'un tampon de regard	Clôturé	ROCHEFORT EN VALDAINE : Ch des Faures
INT25060017	RESEAU MONTÉLIMAR SUD	réparation de fuite pour le moi de mai secteur Montelimar Sud	SERVICE EXPLOITATION	réparation de fuite pour le moi de mai secteur Montelimar Sud MONBOUCHER chemin de Pancrace LA BEGUDE route de la grande Blache MONTELMAR chemin de Redondon CHATEAUNEUF DU RHONE chemin du Deves	Clôturé	Divers
INT25060064	RESEAU MONTÉLIMAR SUD	REPARATION DE FUITE	SERVICE EXPLOITATION	REPARATION DE FUITES : ESPELUCHE : chemin de l'alo CHATEAUNEUF DU RHONE : chemin du pelican	Clôturé	ESPELUCHE - CHATEAUNEUF DU RHONE
INT25090090	RESEAU MONTÉLIMAR SUD	REPARATION DE FUITE	SERVICE EXPLOITATION	REPARATION DE FUITES	Clôturé	ALLAN : Quartier Ferreints + ROCHEFORT EN VALDAINE : Chmin de Rocoule
INT25050014	RESEAU MONTÉLIMAR SUD	réparation de fuites Montelimar Sud mois de Mars	SERVICE EXPLOITATION	Réparation de fuites Montelimar Sud mois de Mars RIOCHEFORT EN VALDAINE : Chemin Gournier, MONTBOUCHER SUR JABRON : Chemin les Vergers, MONTBOUCHER SUR JABRON: Chemin ldes Echaumes, SAVASSE : Chemin les Fées	Clôturé	Rochefford en Valdaine chemin Gournier, Monboucher chemin les Vergers, Monboucher chemin ldes Echaumes, Savasse chemin les Fées

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Intervention	Equipement - Ouvrages	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT24090043	STATION COLLET/POSTE LIVRAISON C4-C5	Contrôle électrique automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique automne 2024	Clôturé	
INT24120037	STATION DACHET	Nettoyage par hydrocurage de la bâche d'aspiration	SERVICE EXPLOITATION	Nettoyage par hydrocurage de la bâche d'aspiration et de la conduite d'adduction	Clôturé	
INT24090044	STATION DACHET/BT	Contrôle électrique automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique automne 2024	Clôturé	
INT25080010	STATION DACHET/BT	Remise en état moteur ventilateur	SERVICE EXPLOITATION	Remise en état moteur ventilateur	Clôturé	
INT25090004	STATION DACHET/BT/VARIATEUR	ST DACHET PANNE VARIATEUR	SERVICE EXPLOITATION	ST DACHET PANNE VARIATEUR	Clôturé	station
INT25070051	STATION DACHET/DACHET - EXTERIEURS	Entretien espaces verts	SERVICE EXPLOITATION	Entretien espaces verts	Clôturé	
INT24100053	STATION DACHET/ELECTROPOMPES	Mise en place de graisseurs déportés.	SERVICE MAINTENANCE	Mise en place de graisseurs déportés.	Clôturé	
INT23120032	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G10/MOTEUR	Reprendre les cables moteur	SERVICE MAINTENANCE	Reprendre les cables moteur	Clôturé	
INT25020034	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G10/POMPE	Fuite sur presse étoupe	SERVICE MAINTENANCE	Remplacement de la chemise d'arbre	Clôturé	
INT25030011	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G10/POMPE	Roulement pour groupe electropompe	SERVICE EXPLOITATION	Changement roulement et réglage jeu	Clôturé	DACHET
INT25060047	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G4/POMPE	Suite à bruit + chute intensité > Tube de ligne d'arbre HS	SERVICE MAINTENANCE	Suite à bruit + chute intensité > Tube de ligne d'arbre HS	Clôturé	
INT25020032	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G8/POMPE	Fuite sur presse étoupe	SERVICE MAINTENANCE	Remplacement de la chemise d'arbre	Clôturé	
INT23120031	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G9/MOTEUR	Reprendre les cables moteur	SERVICE MAINTENANCE	Reprendre les cables moteur	Clôturé	
INT25110011	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/P1/MOTEUR	Suite à problème de fouloir sur la pompe > le moteur à pris l'eau	SERVICE MAINTENANCE	Contrôle et remise en état	Clôturé	
INT25070020	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/P1/POMPE	2 Tiges de fouloir cassées	SERVICE MAINTENANCE	Remise en état des tiges de fouloir + remise en état fouloir + remise en état de la boîte à roulements 21/08/2025 > Suite à vibration trop importante + bague bronze CA de la pompe est détérioré 21/08/205 > Grutage pour rapatriement de la pompe pour expertise par (PEME)	Clôturé	
INT25090082	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/P2/MOTEUR	Reprendre les câbles moteur	SERVICE MAINTENANCE	Reprendre les câbles moteur	Clôturé	
INT25020019	STATION DACHET/HTA	Inter-sectionneur QM1, défectueux	PROJET ELECTRICITE	Inter-sectionneur QM1 Dachet, défectueux	Clôturé	
INT25050032	STATION DACHET/HYDRAULIQUE	Fuite sur conduite Anti-belier	SERVICE EXPLOITATION	Fuite sur conduite Anti-belier	Clôturé	
INT24100028	STATION DACHET/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION	Inspection sans ouverture (2 ans)	SERVICE MAINTENANCE	Inspection sans ouverture (2 ans)	Clôturé	
INT24050033	STATION LES ROCHES	Petits travaux de génie civil	SERVICE EXPLOITATION	Petits travaux de génie civil	Clôturé	
INT24120017	STATION LES ROCHES	curage de la prise d'eau + évacuation des boues après séchage.	SERVICE EXPLOITATION	curage de la prise d'eau + évacuation des boues après séchage.	Clôturé	
INT25020042	STATION LES ROCHES	SP Les Roches : Curage - nettoyage	SERVICE EXPLOITATION	Curage - nettoyage	Clôturé	
INT25090011	STATION LES ROCHES	Dépose repose extracteur d'air avec la nacelle+ remblaiement avec minipelle	SERVICE EXPLOITATION	Dépose repose extracteur d'air avec la nacelle+ remblaiement avec minipelle	Clôturé	les roches
INT25090006	STATION LES ROCHES/BT	Réparation démarreurs	SERVICE EXPLOITATION	Réparation démarreurs G6 et G3	Clôturé	
INT25050015	STATION LES ROCHES/HYDRAULIQUE	ST LES ROCHES REMPLACEMENT REGULATEUR DE PRESSION DEGRILLEUR	SERVICE EXPLOITATION	ST LES ROCHES REMPLACEMENT REGULATEUR DE PRESSION DEGRILLEUR	Clôturé	station des roches
INT25070050	STATION LES ROCHES/LES ROCHES - EXTERIEURS	Entretien espaces verts + réservoir Savasse + Surpresseur Collet	SERVICE EXPLOITATION	Entretien espaces verts + réservoir Savasse + Surpresseur Collet	Clôturé	
INT25090084	STATION PANCRASSE/BT	Pose TIC	SERVICE MAINTENANCE	Pose TIC	Clôturé	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Intervention	Equipement - Dépôt	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT24090048	LOCAUX ANTENNE PLAINE DE LA VALDAINE/POSTE LIVRAISON C4-C5	Contrôle électrique automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique automne 2024	Clôturé	

INTERVENTIONS EN COURS au 30/11/2025						
Intervention	Equipement	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25120015	LOCAUX ANTENNE PLAINE DE LA VALDAINE	CONTROLES DES EXTINCTEURS BUREAUX ATELIER MONTELIER ETV STATION PLAINE DE VALENCE	PROJET ELECTROMECHANIQUE	CONTROLES DES EXTINCTEURS BUREAUX ATELIER MONTELIER ETV STATION PLAINE DE VALENCE	En cours	
INT25090073	LOCAUX ANTENNE PLAINE DE LA VALDAINE/POSTE LIVRAISON C4-C5	Contôle électrique automne 2025	PROJET ELECTRICITE	Contôle électrique automne 2025	En cours	
INT24120010	STATION DACHET/BT	Travaux de conformité, selon contrôle automne 2024	SERVICE EXPLOITATION	Travaux de conformité, selon contrôle automne 2024	En cours	
INT25080021	STATION DACHET/ELECTROPOMPES/G3/MOTEUR	Moteur G3 560 kW à chauffé COA	SERVICE MAINTENANCE	Moteur G3 560 kW à chauffé COA 01/10/2025 > Démontage du moteur par BMI pour expertise par ABB	En cours	
INT25100021	STATION LA COUCOURDE/ELECTROPOMPES/G3/POMPE	Chemise d'arbre usée par les tresses	SERVICE MAINTENANCE	Chemise d'arbre usée par les tresses	En cours	
INT24090130	STATION PANCRASSE/BT	Travaux de conformité électrique	SERVICE EXPLOITATION	I.F * LOCAL ELECTRIQUE – CELLULES HT : ne rien entreposer sur les cellules HT. B.F * LOCAL ELECTRIQUE – UNE PRISE DE COURANT COTE PORTE LOCAL POMPE : Prise de courant mal fixée. Fixation à reprendre convenablement. P.M * LOCAL ELECTRIQUE : Fonctionnement défectueux du bloc autonome d'éclairage de sécurité. A remplacer. P.M * LOCAL POMPES : Défaut de fonctionnement du bloc autonome d'éclairage de sécurité. A remplacer.	En cours	
INT25090065	STATION PANCRASSE/BT	Contôle électrique automne 2025	PROJET ELECTRICITE	Contôle électrique automne 2025	En cours	
INT25060083	STATION PANCRASSE/ELECTROPOMPES/G2/MOTEUR	Moteur 320 kW en court circuit	SERVICE MAINTENANCE	Moteur 320 kW en court circuit >Le 06/06/2025 Mis en dépannage un moteur de secours avec une hauteur d'axe différente > Eau dans moteur (Principalement dans la flasque CA) (BMI)	En cours	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr
